

SECRETARY-GENERAL'S PEACEBUILDING FUND
PBF PROJECT PROGRESS REPORT TEMPLATE



PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: Guatemala
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL Final
DATE OF REPORT: 30 Septiembre 2018

Project Title: Empoderamiento Institucional y ciudadano para la lucha contra la impunidad: una oportunidad para la Paz y el Estado de derecho en Guatemala.	
Project Number from MPTF-O Gateway: 102015	
PBF project modality: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	If funding is disbursed into a national or regional trust fund: <input checked="" type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund Name of Recipient Fund:
List all direct project recipient organizations (starting with Convening Agency), followed type of organization (UN, CSO etc): PNUD, ONU Mujeres, UNODC (agencia asesora CICIG) List additional implementing partners, Governmental and non-Governmental: Socio implementador Ministerio Público y Aliados en la implementación Organizaciones de Sociedad Civil.	
Project commencement date ¹ : 31 Agosto 2016 Project duration in months ² : 31 de agosto 2016 al 28 de febrero 2018, con extensión a junio 2018	
Does the project fall under one of the specific PBF priority windows below: <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project	
Total PBF approved project budget* (by recipient organization): PNUD : \$ 980,887.47 ONU Mujeres : \$ 146,917.12 UNODC : \$ 203,918.64 : \$ Total: 1,331,723.22 <i>*The overall approved budget and the release of the second and any subsequent tranche are conditional and subject to PBSO's approval and subject to availability of funds in the PBF account</i>	
How many tranches have been received so far:	
Report preparation: Project report prepared by: María Guadalupe Orella, Coordinadora de Proyecto Project report approved by: Ana María Díaz, Directora de País PNUD Did PBF Secretariat clear the report: Elizabeth Turner, Secretariado PBF Any comments from PBF Secretariat on the report: Has the project undertaken any evaluation exercises? Please specify and attach:	

¹ Note: commencement date will be the date of first funds transfer.

² Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.



NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general / common language.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*

PART 1: RESULTS PROGRESS

1.1 Overall project progress to date

Briefly explain the **status of the project** in terms of its implementation cycle, including whether all preliminary/preparatory activities have been completed (1500 character limit):

El proyecto concluyo su ciclo de implementación el 30 de junio de 2018, debido a la extensión sin costo autorizada por 4 meses.

Given the recent/current political/peacebuilding/ transition situation/ needs in the country, has the project been/ does it continue to be **relevant** and well placed to address potential conflict factors/ sources of tensions/ risks to country's sustaining peace progress? Please illustrate. If project is still ongoing, are any adjustments required? (1500 character limit)

El proyecto ha sido altamente relevante, ya que contribuyó a posicionar al Ministerio Público en un contexto político determinante para el sistema de justicia.

El aporte del proyecto permitio que el MP, en coordinacion con la CICIG, continuara presentando casos de alto impacto.

La incorporación de la perspectiva de genero en el análisis, la investigación y la persecución penal de los delitos priorizados en el proyecto continuó siendo altamente relevante y urgente debido a los niveles alarmantes de violencia contra las mujeres em el contexto actual.

En adiccion, el apoyo del proyecto al fortalecimiento de la sociedad civil para la auditoria social de la justicia ha sido totalmente acertada, dado el contexto en el cual la sociedad guatemalteca esta cada vez mas consciente de la importancia de la lucha contra la impunidad y la corrupcion y la necesidad de su participacion en ello.

Como resultado, se logró un incremento en el grado de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia a partir de su actuación objetiva e imparcial en casos de alto impacto y el quiebre de la impunidad relativa a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres.

El aporte iniciado mediante este proyecto continua, ya que se enlazaron los procesos apoyados por este proyecto con el Proyecto Consolidación y Descentralización de la Persecución Penal Estratégica en el Ministerio Público, proyecto que está dando continuidad a la institucionalización de los resultados alcanzados.

In a few sentences, summarize **what is unique/ innovative/ interesting** about what this project is trying/ has tried to achieve or its approach (rather than listing activity progress) (1500 character limit).

- La evaluación del acompañamiento al Plan Estratégico 2015-2019 del MP fue un aporte unico, que resaltó tanto los logros como los retos institucionales de manera estrategica de cara a la transicion de autoridades en 2018.

- La formalización, a través de un compromiso regional, de la adopción y adaptación del "Modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género Femicidio/Feminicidio", fue totalmente innovador y marca un punto de no reversión para la justicia de género, posicionando el liderazgo pionero del Ministerio Público de Guatemala en la conducción del Grupo de Género de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos, AIAMP.
- La instalación de una Fiscalía dentro de la Contraloría General de Cuentas, fue un avance innovador para fortalecer la investigación de casos de corrupción en coordinación con esta entidad clave.
- La armonización de la cooperación de diversos donantes en apoyo de la Oficina de Protección de Sujetos Procesales, fue un proceso interesante y exitoso que permitió agilizar su reestructuración y renovación.
- La recreación tridimensional de escenas del crimen en peritajes de arquitectura forense a través de nuevas tecnologías como medio probatorio fue un avance innovadora en apoyo de casos de alto impacto contra la vida de las mujeres .
- Creación de unidad de investigación de casos anteriores a la creación de la Fiscalía de Femicidio para eliminar la impunidad.

Considering the project's implementation cycle, please **rate this project's overall progress towards results to date:**

on track with significant peacebuilding results

In a few sentences summarize **major project peacebuilding progress/results** (with evidence), which PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

Entre los principales resultados que aportan a la consolidación de la paz, se encuentra:

1. El impulso y fortalecimiento de la cooperación sur-sur a nivel iberoamericano mediante el "Modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género Femicidio/Feminicidio" los cual armoniza los estándares regionales y potencia las buenas prácticas para la investigación y persecución penal estratégica de casos de justicia de género.
2. El fortalecimiento de la sociedad civil a través del mecanismo de asistencia legal anticorrupción ALAC que ha contribuido a mejorar el papel activo de la sociedad civil en la identificación de casos de corrupción, observación y seguimiento del actuar del sistema de justicia.
3. La instalación innovadora de la Fiscalía Especial del Ministerio Público en la Contraloría General de Cuentas para agilizar la investigación de casos de corrupción, lo cual fue institucionalizada a partir de la suscripción de un Acuerdo y la aplicación de la Guía de Atención Integral sobre casos de Corrupción.

In a few sentences, explain how the project has made **real human impact**, that is, how did it affect the lives of any people in the country – where possible, use direct quotes that PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

-La reestructuración de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas incluyó la perspectiva de igualdad de género en el reclutamiento del nuevo personal, logrando que el 50% fueran mujeres, incluso personas con discapacidad. Este ha propiciado un cambio al incorporar un enfoque inclusivo en la forma que se trabajan las escenas de crimen y las investigaciones.

- La reestructuración en su infraestructura y protocolos de atención de la Oficina de Protección de Sujetos Procesales, incluyó un área especial para la atención a niños y niñas familiares de testigos; lo cual tiene un impacto humano real en estos niños, ya que mejora notablemente la atención y protección y reciben.

If the project progress assessment is **on-track**, please explain what the key **challenges** (if any) have been and which measures were taken to address them (1500 character limit).

If the assessment is **off-track**, please list main reasons/ **challenges** and explain what impact this has had/will have on project duration or strategy and what **measures** have been taken/ will be taken to address the challenges/ rectify project progress (1500 character limit):

Please attach as a separate document(s) any materials highlighting or providing more evidence for project progress (for example: publications, photos, videos, monitoring reports, evaluation reports etc.). List below what has been attached to the report, including purpose and audience.

Guía de atención integral sobre casos de corrupción ALAC

Convenio suscrito entre Contraloría General de Cuentas y el Minsiterio Público

Manual y agenda sobre periodismo de investigación

Módulo formativo sobre justicia penal, derechos de las mujeres y litigación

Nota de visita del Comité Ejecutivo PBF a la Oficina de Protección a Sujetos Procesales y fotografías

1.2 Result progress by project outcome

The space in the template allows for up to four project outcomes. If your project has more approved outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: Mejorada la investigación y análisis de los casos de alto impacto mediante el fortalecimiento de las principales Fiscalías y Direcciones del Ministerio Público que coordinan con la CICIG, incorporando la perspectiva de género.

Rate the current status of the outcome progress: on track with significant peacebuilding results

Progress summary: Describe main progress under this Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration), including major output progress (not all individual activities). If the project is starting to make/ has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context. Where possible, provide specific examples of change the project has supported/ contributed to as well as, where available and relevant, quotes from partners or beneficiaries about the project and their experience. (3000 character limit)?

El proyecto consolidó las capacidades técnicas de las Fiscalías FECCI, Contra la Corrupción y Contra el Delito de Femicidio por medio del uso de modelos innovadores en la Dirección de Análisis Criminal, fortalecimiento de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, incorporando estrategias de seguridad y protección en la Oficina de Protección a Testigos y la aplicación del "Modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (Femicidio/Feminicidio)". La institucionalización se dio por medio de: a) Ampliación de cobertura fiscalías en el interior del país para el análisis criminal por 8 analistas digitadores, y 3 enlaces analistas, quienes, en su mayoría, han

sido absorbidos como personal de la Institución; b) La instalación de módulos del sistema informático para la automatización y gestión de casos para la planificación, control y evaluación de los casos en investigación, y un sistema de análisis de audios que contribuye al análisis estratégico a gran escala; c) La disminución de la mora en las solicitudes de dictamen pericial balístico solicitado por Ministerio Público al laboratorio de balística de INACIF con 4 digitadores; d) Adecuaciones físicas al espacio y equipamiento a la Oficina de Protección de Sujetos Procesales.

Se logró la exitosa puesta en marcha de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio mediante diversas acciones, incluyendo: la primera formación sobre investigación y persecución penal estratégica con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres al 100% del personal fiscal y administrativo; la elaboración de la ruta para el litigio estratégico desde una perspectiva jurídico penal aplicando estándares internacionales; la propuesta para la sala situacional de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio y dotación de equipo tecnológico de punta para su instalación; la estrategia de articulación institucional e intersectorial para la gestión y generación de conocimiento especializado sobre acceso de las mujeres a la justicia, relativa a los delitos de femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres; la utilización de los medios informativos y tecnológicos para fortalecer el recabo de medios probatoris; la línea basal y documento analítico sobre factores detonantes de los delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer; y el Módulo formativo sobre justicia penal, derechos de las mujeres y litigio estratégico. Se formó a 100 fiscales en el análisis de factores conexión de delitos, género, justicia penal y derechos humanos de las mujeres. Culminó exitosamente el monitoreo psicosocial a personal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio y se adoptó el compromiso regional de aplicar el "Modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (Femicidio/Feminicidio) a través del Grupo Especializado en Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

Outcome 2: Fortalecidas las capacidades de auditoria social de sociedad civil en casos de alto impacto y el rol de las mujeres en la construcción de la paz.

Rate the current status of the outcome progress: on track with significant peacebuilding results

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)

El fortalecimiento del mecanismo de asistencia legal anticorrupción ALAC permitió el seguimiento y asesoría en casos de alto impacto fomentando la transparencia por medio del acceso de información pública. Como resultado se dió acompañamiento a 478 denuncias de Sociedad Civil y se suscribió un Acuerdo entre el Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas, y la Guía de Atención integral sobre casos de corrupción, apoyo que se institucionalizó al abrir una agencia especial del Ministerio Público en la sede de la Contraloría General de Cuentas. Se suscribió un Acuerdo de Cooperación con el Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer CICAM, para fortalecer los mecanismos de participación de las mujeres en la auditoria social del sistema de justicia y se instaron dos mecanismos de interlocución directa entre las mujeres, sus organizaciones y redes mixtas para la defensa de sus derechos, la Fiscalía de Femicidio y la Fiscal General. En el marco del referido convenio se elaboraron acuerdos con dos organizaciones de mujeres que efectúan actividades de incidencia realizando un diagnóstico para elaborar propuestas de procedimientos administrativo-financieros y de estrategia de observancia de las organizaciones. Una de las organizaciones de mujeres participó, en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, en el desarrollo de la estrategia de observancia e influencia con

instituciones del sector justicia sobre el fenómeno de la violencia contra la mujer y femicidio, ejecutándose en coordinación con la Fiscalía Distrital del Ministerio Público en Santa Rosa, el Tercer Viceministerio de Prevención, el Centro de Salud de Cuilapa, y otras instituciones del sector justicia, con el objeto de promover el análisis de información para el mejoramiento de los servicios de atención a las víctimas en base a la demanda y el monitoreo del cumplimiento de los mandatos de cada entidad. Para fortalecer el traslado de información a la opinión pública se elaboró un manual y agenda sobre periodismo de investigación, el cual resulta una herramienta innovadora al trasladar capacidades a los medios de comunicación respecto del manejo y la terminología investigativa en materia de casos de alto impacto para su fácil comprensión por el público en general.

Outcome 3:

Rate the current status of the outcome progress: Please select one

Progress summary: *(see guiding questions under Outcome 1)*

Outcome 4:

Rate the current status of the outcome progress: Please select one

Progress summary: *(see guiding questions under Outcome 1)*

1.3 Cross-cutting issues

<p><u>National ownership:</u> How has the national government demonstrated ownership/ commitment to the project results and activities? Give specific examples. (1500 character limit)</p>	<p>El compromiso del Ministerio Público con el fortalecimiento institucional de los procesos se materializó con la absorción del personal contratado por el proyecto como analistas y digitadores, esto tiene un impacto directo en el fortalecimiento de la DICRI, DAC y FECCI. Este personal ha sido capacitado y ha desarrollado con eficiencia y calidad su trabajo. Asimismo, se ha demostrado la institucionalización y/o apropiación del proyecto por el Ministerio Público al haber impulsado la adopción del compromiso regional de aplicar el "Modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (Femicidio/Feminicidio)" en la region iberoamericana a través del Grupo Especializado en Temas de Género de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos AIAMP. La restructuración del Ministerio Público está legalmente sostenida a través de la reforma de la Ley Orgánica que crea la Fiscalía contra el Delito de Femicidio y permitió, por primera vez en la institución, un esfuerzo para incorporar 50% de mujeres en el reclutamiento de nuevo personal, en concordancia con la Política de Igualdad del MP. El Ministerio</p>
---	---

	Público movilizó recursos internos para complementar la compra de equipo y software ya que con el proyecto se adquirieron 6 licencias para un software especializado y la institución adquirió otras 25; asimismo, con el proyecto se adquirió equipo de investigación y la institución movilizó recursos para adquirir más.
Monitoring: Is the project M&E plan on track? What monitoring methods and sources of evidence are being/ have been used? Please attach any monitoring-related reports for the reporting period. (1500 character limit)?	El monitoreo y evaluación del proyecto se ha llevado a cabo mediante la realización de reuniones e informes periódicos para conocer avances, dificultades y toma de acciones para garantizar la buena marcha del proyecto, informes para el PBF. Las fuentes son: informes de consultores, presentaciones de avances, e información del Sistema Informático de Control de Investigación del Ministerio Público (SICOMP)
Evaluation: Provide an update on the preparations for the external evaluation for the project, especially if within last 6 months of implementation or final report. Confirm available budget for evaluation. (1500 character limit)	N/A
Catalytic effects (financial): Did the project lead to any specific non-PBF funding commitments? If yes, from whom and how much? If not, have any specific attempts been made to attract additional financial contributions to the project and beyond? (1500 character limit)	<p>- El Ministerio Público movilizó recursos internos para complementar la compra de equipo y software ya que con el proyecto se adquirieron 6 licencias para un software especializado y la institución adquirió otras 25 y el proyecto adquirió equipo de investigación.</p> <p>-Los éxitos generados por el Grupo Especializado en Temas de Género de la Asociación Ibero América de Ministerios Públicos, AIAMP apoyados por PBF generaron una ampliación de la participación, de 8 a 14 países y el interés e inversión de fondos del Programa EUROSOCIAL, que se sumó al apoyo del PBF para cubrir parte de los costos del 2o. Taller Regional.</p>
Catalytic effects (non-financial): Did the project create favourable conditions for additional peacebuilding activities by Government/ other donors? If yes, please specify. (1500 character limit)	<ul style="list-style-type: none"> • El proyecto creó condiciones favorables para el traslado de buenas prácticas y capacidades de la CICIG al MP, que, al ser institucionalizados, influyeron en el proceso de descentralización y fortalecimiento en distintas regiones del país. • La Oficina de Protección a Sujetos Procesales migró a un modelo orgánico, funcional operativo y dinámico que potencia la coordinación interinstitucional, la agilidad en la confección, supervisión y control de esquemas de seguridad y protección, haciendo más eficientes el uso de los recursos, reformando el área y los puestos de trabajo e incorporando personal con perfil de expertos en seguridad. • El Departamento de Análisis Estratégico del Fenómeno Criminal de la Dirección de Análisis Criminal fortaleció sus capacidades de análisis y generación de información, pasando del análisis de casos de alto impacto al de

	<p>fenómenos y delitos comunes en los que se involucra a mujeres, niñas niños y adolescentes. Este cambio ha impactado en el desarrollo de productos de análisis vinculando zonas en las que ocurren femicidios, hechos relacionados a pandillas, casos de Alerta Alba-Keneth para la búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos incide en que los productos generados incluyan enfoque de género para la investigación y persecución penal estratégica.</p> <p>Los avances del Ministerio Público para el abordaje del femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres propiciaron interés y compromisos Iberoamericanos.</p>
<p>Exit strategy/ sustainability: What steps have been taken to prepare for end of project and help ensure sustainability of the project results beyond PBF support for this project? (1500 character limit)</p>	<p>Este proyecto es un puente con el PBF Consolidación y Descentralización de la Persecución Penal Estrategica del Ministerio Público, por lo que no se ha preparado una salida, se están fortaleciendo las capacidades a través de procesos en formación, y herramientas (protocolos, Guías etc.) para que estos se socialicen e incorporen a la institución en forma permanente. Sin embargo, al consolidar compromisos regionales, sustenta los avances generados en el país para la justicia de género.</p>
<p>Risk taking: Describe how the project has responded to risks that threatened the achievement of results. Identify any new risks that have emerged since the last report. (1500 character limit)</p>	<p>Este proyecto permitió cubrir el período entre la primera y segunda fase del PBF, mitigando el riesgo de regresión de los avances promovidos hasta entonces con el apoyo del Fondo. La adopción de compromisos regionales reforzaron y minimizaron los riesgos particulares de regresión relativos a la justicia de género. Esta estrategia probó ser muy exitosa para el escalamiento de los esfuerzos para quebrar el continuo de la impunidad relativa a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres a partir del conflicto.</p>
<p>Gender equality: In the reporting period, which activities have taken place with a specific focus on addressing issues of gender equality or women's empowerment? (1500 character limit)</p>	<p>En relación a la contratación de personal se ha analizado las ventajas de tener equipos con equilibrio de género en el área de investigación criminal. En la Dirección de Análisis Criminal se está incorporando la persepctiva de género y derechos de las mujeres en el desarrollo de documentos de análisis.</p> <p>La creación y puesta en marcha de la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio consolida los esfuerzos para avanzar la justicia de género y quebrar la impunidad, abordando el continuo de la violencia contra las mujeres, una de las mas terribles secuelas del conflicto armando interno.</p> <p>La adopción del compromiso para la aplicación del "Modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (Femicidio/Feminicidio)" en la región iberoamericana impulsado por el Ministerio Público permitió sostener los</p>

	<p>avances en materia de justicia de género y escalarlos durante la nueva gestión fiscal. Marcó un punto de no retorno en la investigación y persecución penal del delito de femicidio y los crímenes contra la vida de las mujeres. Por primera vez una fiscalía completa ha sido formada en derechos humanos de las mujeres y la integración de la perspectiva de género en los procesos fiscales.</p>
<p>Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? <i>(1500 character limit)</i></p>	

1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT: *Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Outcome 1 Outcome 1 Mejorada la investigación y análisis de los casos de alto impacto mediante el fortalecimiento de las principales fiscalías y Direcciones del Ministerio Público que coordinan con la Comisión Internacional contra la	Indicator 1.1 % de efectividad en el Ministerio Público	45%	55%	55%	Porcentaje acumulativo dado por SICOMP. La formula surge del estudio de efectividad realizado por CICIG y SICOMP.	
	Indicator 1.2 # de órdenes de aprehensión realizadas desagregada por sexo (FECI)	784	940	1073 (hombres 17 mujeres)	Acumulativo, en el periodo del proyecto se realizaron 289 capturas de las cuales 232 son hombres y 57 son mujeres. La línea de base se suma a los 289. No se cuenta de la línea base desagregada por sexo.	
	Indicator 1.3 # de personas ligadas a proceso respecto a casos de alto impacto, desagregadas por sexo	40	48	286 (196 hombres y 50 mujeres)	Acumulativo en la vida del proyecto: 246 (196 hombres y 50 mujeres). No se cuenta con el dato de la línea base desagregada por sexo.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Impunidad en Guatemala -CICIG incorporando la perspectiva de género						
Output 1.1 Apoyado el proceso de traslado de capacidades de la CICIG a la FECCI y el fortalecimiento de capacidades de protección a los sujetos procesales en calidad de testigos	Indicator 1.1.1 # de allanamientos dirigidos por FECCI	784	930	1101	Acumulativo. En la vida del proyecto se reportan 317 allanamientos, mas 784 de la linea base.	
	Indicator 1.1.2 de diagnosticos de la Oficina de Protección del MP con perspectiva de género y pertinencia cultural # de manuales, protocolos y herramientas institucionales en materia de protección revisados	0	1	1		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
	actualizados					
Output 1.2 Ampliada la cobertura y las capacidades de análisis y generación de información de la DAC a través de contratación de enlaces y digitadores, así como el desarrollo de software, compra de equipo, elaboración de protocolos y módulos de formación especializada	Indicator 1.2.1 # de informes generados por el departamento de Análisis Financiero	287	359	816	Acumulativo. 529 informes generados en la vida del proyecto, mas la linea base.	
	Indicator 1.2.2 # de solicitudes de laboratorio de balística remitidas de MP a inacif en mora	2,730	0	2730	Los 2,730 casos en mora fueron resueltos.	Al iniciar el proyecto tambien inició el modulo del Sistema Informatico del Control de Investigacion del Ministerio Publico el cual envia las solicitudes de analisis de las Fiscalias, este está funcionndo al 100% por esto el numero de elevó al 25,648.
	# de solicitudes de análisis criminal realizadas por las fiscalías a DAC vía SICOMP % de análisis criminal realizados por la DAC a raíz de solicitudes de fiscalías	22 82%	167 95%	25,648 98.75%	El 98.75% es acumulativo y se obtuvo al realizar el corte del proyecto.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
en análisis.						
Output 1.3 Reestructurada la DICRI en base al diagnóstico complementado con manuales y protocolos, instrucciones, módulos formativos y adquisición de equipo especializado para investigación	<p>Indicador 1.3.1 # de diagnósticos de la DICRI acorde a reforma Ley Orgánica MP con perspectiva de género y pertinencia cultural</p> <p>Indicador 1.3.2</p>	0	1	1		
Output 1.4 Creada la Fiscalía contra el delito de Femicidio a	<p>Indicador 1.4.1 # de marcos normativos y operativos para la creación de la Fiscalía contra el delito de Femicidio.</p>	0	3	1	El proyecto apoyó los esfuerzos de la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio concentrados en la investigación de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, por lo que los 2 protocolos pendientes se trabajan en el PBF Consolidación y descentralización de la persecución penal estratégica MP	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
través de elaboración de reglamentos, protocolos, manual	Indicador 1.4.2. # de fiscales y auxiliares fiscales de la Fiscalía que han completado los procesos de monitoreo psicosocial	0	40	54		
Outcome 2 Fortalecidas las capacidades de auditoría social de sociedad civil en casos de alto impacto y el rol de las mujeres en la construcción de la paz.	Indicador 2.1					
	Indicador 2.2					
	Indicador 2.3					
Output 2.1 Socializado y	Indicador 2.1.1 # de denuncias por	350	500	478	Se presentaron 128 denuncias en la vida del proyecto (23 por mujeres, 81	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
fomentado el mecanismo de observancia y denuncia de la sociedad civil en casos de alto impacto.	casos de corrupción a través del mecanismo ALAC				hombres, 17 por organizaciones de la sociedad civil y 7 denuncias anonimas). Acumulativo.	
	Indicador 2.1.2 # de organizaciones y/o redes de mujeres que participan en mecanismos de incidencia, observancia y dialogo político para la transformación del sistema de justicia	0	8	1		4 son de mujeres especializadas y 4 mixtos de defensoras de derechos humanos de las mujeres
	# de mecanismos de coordinación y articulación entre el MP y otros actores relevant	0	2	1		
Output 2.2 Elaborado e	Indicador 2.2.1 # de personal operativo y	0	30 personas 3 medios	60 personas		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
implementado el manual y la agenda sobre periodismo de investigación para promover una cultura de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad	ejecutivo de medios de comunicación formado en el manejo de la información en casos de alto impacto.					
	Indicator 2.2.2 # de medios de comunicación que validan y usan el Manual en periodismo de investigación.	0	3	5		
Output 2.3	Indicator 2.3.1					
	Indicator 2.3.2					
Outcome 3	Indicator 3.1					
	Indicator 3.2					
	Indicator 3.3					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Output 3.1	Indicator 3.1.1					
	Indicator 3.1.2					
Output 3.2	Indicator 3.2.1					
	Indicator 3.2.2					
Output 3.3	Indicator 3.3.1					
	Indicator 3.3.2					
Outcome 4	Indicator 4.1					
	Indicator 4.2					
	Indicator 4.3					
Output 4.1	Indicator 4.1.1					
	Indicator 4.1.2					
Output 4.2	Indicator 4.2.1					
	Indicator 4.2.2					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Output 4.3	Indicator 4.3.1					
	Indicator 4.3.2					

PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS

2.1 Comments on the overall state of financial expenditures

Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization: *on track*

How many project budget tranches have been received to date and what is the overall level of expenditure against the total budget and against the tranche(s) received so far (500 characters limit): *N/A*

When do you expect to seek the next tranche, if any tranches are outstanding: *N/A*

If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit): *N/A*

Please state what \$ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment and how much has been actually allocated to date:

Please fill out and attach Annex A on project financial progress **with detail on expenditures/ commitments to date using the original project budget table in Excel**, even though the \$ amounts are indicative only.

Annex D - PBF project budget

Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.

Table 1 - PBF project budget by Outcome, output and activity

Outcome/ Output number	Outcome/ output/ activity formulation:	Budget by recipient organization in USD - Please add a new column for each recipient organization	Percent of budget for each output reserved for direct action on gender equality (if any):	Level of expenditure/ commitments in USD (to provide at time of project progress reporting):	Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, for example if high TA or travel costs)
OUTCOME 1: Mejorada la investigación y análisis de los casos de alto impacto mediante el fortalecimiento de las principales Fiscalías y Direcciones del Ministerio Público que coordinan con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- incorporando la perspectiva de género					
Output 1.1	Apoyado el proceso de traslado de capacidades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- a través de Asistencia Técnica y elaboración de Instrumentos, protocolos, instrucciones, manuales Y procesos formativos especiales para la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la Oficina de Protección.				
Activity 1.1.1:	Desarrollado, implementado e institucionalizado en UNICAP los Módulos formativos (de formador de formadores) sobre investigación penal (casos de alto impacto)	PNUD			\$ -
	Certificado el personal de la FECl como formador de formadores sobre investigación casos de alto impacto	PNUD	\$ 10,000.00		
	Desarrollados y aplicados los protocolos de persecución penal estratégica de casos de alto impacto.	PNUD	\$ 20,000.00		\$ 16,131.31
	Capacitado el personal de FECl en protocolos y manual de casos de alto impacto	PNUD	\$ 89,975.46	15%	\$ 76,592.89
Activity 1.1.2	Fortalecidos los procesos y técnicas de protección y resguardo de sujetos procesales en calidad de testigos.	UNODC	\$ 58,789.50		\$ 58,789.50
	Elaborado el diagnóstico y la definición de las necesidades de la Oficina de Protección en relación con los procesos de protección y resguardo de sujetos procesales en calidad de testigos.	UNODC	\$ 30,960.50	10%	\$ 39,250.00
	Revisados y actualizados los manuales y protocolos de procesamiento sobre protección.	UNODC	\$ 28,789.50	10%	\$ 20,500.00
	Desarrollados los procesos formativos especializados en la protección y resguardo de testigos	UNODC	\$ 17,289.51	10%	\$ 17,289.51
Output 1.2:	Ampliada la cobertura y las capacidades de análisis y generación de información de la Dirección de análisis Criminal A TRAVÉS de contratación de enlaces y digitadores, así como el desarrollo de Software, compra de equipo, elaboración de protocolos y módulos de formación especializada en análisis.				
Activity 1.2.1	Fortalecidos los procesos de funcionamiento del Departamento de Análisis Financiero de la DAC	PNUD	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
Activity 1.2.2	Elaborado el diagnostico del Departamento de Análisis estratégico del Fenomeno criminal	PNUD	\$ -		

Activity 1.2.3	Desarrollados los proccos formativoa especializados en analisis criminal	PNUD	\$ 20,000.00	10%	\$ 24,485.69	
Activity 1.2.4	Ampliada la cobertra a través del personal de enlace del departamento de análisis financiero.	PNUD	\$ 60,000.00	50%	\$ 86,000.00	
Activity 1.2.5	Apoyo a digitadores para el Depto Financiero y Análisis estratégico	PNUD	\$ 30,000.00	50%	\$ 40,000.00	Con la figura de digitadores se dio apoyo a FECL
Activity 1.2.6	Adquirido equipo y software para investigación y análisis estrategico y financiero	PNUD	\$ 23,672.77		\$ 109,883.01	En DAC se utilizaron mas recursos que fueron reubicados de Coordinación y Gestión para fortalecimiento de DAC
Activity 1.2.7	Desarrollados los sistemas de análisis audiovisuales y gestión de casos	PNUD	\$ 10,000.00		\$ 20,000.00	
Output 1.3:	Reestructura de la dirección de investigaciones criminalísticas en base al diagnóstico, complementando CON manuales, protocolos, instrucciones, módulos formativos y adquisición de equipo especializado para escena e investigación					
Activity 1.3.1	Reestructurada la DICRI conforme a las necesidades de persecución penal estratégica	PNUD	\$ 10,000.00	20%	\$ 10,000.00	
Activity 1.3.2	Elaborado el diagnóstico.	PNUD	\$ -			
Activity 1.3.3	Elaboradas las herramientas, protocolos y manuales orientados a la persecución penal estratégica con enfoque de género	PNUD	\$ 19,457.61		\$ 38,656.58	
Activity 1.3.4	Elaborados los temas de los procesos formativos en investigación criminal, módulos de formadores	PNUD	\$ 20,564.41	10%	\$ 18,000.00	
Activity 1.3.5	Compras de equipo especializados para escena e investigación	PNUD	\$ 33,841.00		\$ 34,800.00	
Output 1.4:	Creada la Fiscalía contra el Delito de Femicidio a través DE la elaboración de reglamentos, protocolo, manuales, módulos formativos					
Activity 1.4.1	Elaborado el reglamento de la fiscalía que incluya compenencias, procedimientos y coordinación desde una perspectiva de género para la persecución penal estratégica para el delito de femicidio y conexos	ONUMUJERES	\$ 128,472.12	100%	\$ 128,472.12	
Activity 1.4.2	Elaborado, validado y socializado el reglamento (protocolos, manuales y herramientas) de la fiscalía contra el delito de femicidio.	ONUMUJERES		100%		
Activity 1.4.3	elaborados los temas del proceso formativo.	ONUMUJERES		100%		
Activity 1.4.4	brindado el apoyo psicosocial para fiscales, agentes fiscales	ONUMUJERES		100%		
TOTAL \$ FOR OUTCOME 1:			\$ 631,812.38		\$ 758,850.61	
OUTCOME 2:	Fortalecidas las capacidades de auditoría social de sociedad civil en casos de alto impacto y el rol de las mujeres en la construcción de la paz					
Output 2.1:	Socializado y fomentado el mecanismo de observancia y denuncia de la sociedad civil en casos de alto impactoo					
Activity 2.1.1	Fortalecido el mecanismos ALAC	PNUD	\$ 40,000.00	30%	\$ 40,854.04	

Activity 2.1.2	Gestión y Coordinación del proyecto.	PNUD	\$ 573,376.21		\$ 445,483.94	
Output 2.2:	Creada la mesa de diálogo y coordinación entre el MP, OJ y actores relevantes de la sociedad civil para potencializar el rol y la participación igualitaria de las mujeres en los procesos de auditoria social					
Activity 2.2.1:	Acompañamiento y mentoría especializada al liderazgo de las mujeres y su interlocución con actores claves y tomadores de decisión del sistema de justicia	ONUMUJE RES	\$ 16,159.00	100%	\$ 16,159.00	
Activity 2.2.2:	Fortalecidos los mecanismos de observancia e incidencia de las mujeres en la transformación del sistema de justicia en concordancia con los Acuerdos de Paz y la Agenda Global de MPS	ONUMUJE RES	\$ 2,286.00	100%	\$ 2,286.00	
Output 2.3:	Elaborado e implementado el manual y la agenda sobre periodismos de investigación, para promover una cultura de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad					
Activity 2.3.1	Fortalecidos periodistas en el periodismo de investigación	UNODC	\$ 15,500.00		\$ 15,500.00	
Activity 2.3.2	Manual para llevar agenda de investigación	UNODC	\$ 11,339.00		\$ 11,339.00	
Activity 2.3.3	Realizados los procesos de sensibilización y formación	UNODC	\$ 39,352.79		\$ 39,352.79	
Activity 2.3.4	Visitas programadas	UNODC	\$ 1,897.84		\$ 1,897.84	
TOTAL \$ FOR OUTCOME 2:			\$ 699,910.84		\$ 572,872.61	
TOTAL FOR OUTCOMES			\$ 1,331,723.22		\$ 1,331,723.22	
Project personnel costs if not						
Project operational costs if not						
Project M&E budget						
SUB TOTAL			0.00		0.00	
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET:			1,331,723.22		1,331,723.22	
Indirect support costs (7%):						
TOTAL PROJECT BUDGET:			1,331,723.22		1,331,723.22	

Visita de Campo/Proyecto
Comité Ejecutivo PBF Guatemala

Fecha: 10 de agosto 2018

Proyecto(s): 1. PBF/IRF - Empoderamiento Institucional y ciudadano para la lucha contra la impunidad: una oportunidad para la paz y el Estado de Derecho en Guatemala (“MP Puente”)
2. PBF/IRF - Consolidación y descentralización de la persecución penal estratégica en el Ministerio Público (“MP Fase II”)

Implementado por: El apoyo específico a la Oficina de Protección es implementado por UNODC en el marco de los proyectos arriba mencionados, en los cuales también participan PNUD y ONU Mujeres (MP Puente) y PNUD, ONU Mujeres, UNICEF y UNFPA (MP II).

Lugar(es)

visitados: Oficina de Protección a Sujetos Procesales del Ministerio Público (OPSP), Edificio Gerona

Resumen de la visita:

El objetivo de la visita fue dar una oportunidad al Comité Ejecutivo del PBF de conocer los avances logrados hasta la fecha con el apoyo del PBF mediante dos proyectos (“MP Puente” y “MP Fase II”), implementado por UNODC.

Se inicio la visita con una reunión con la Fiscal General y Jefe del MP, Sra. Maria Consuelo Porras, y con personal de su despacho, así como de la OPSP. El actual encargado de la Sub-Dirección de la OPSP, el Sr. Adelmo Bámaca, informó sobre el proceso de fortalecimiento de la OPSP, el cual inició a partir de la elaboración de un Diagnóstico y una propuesta de fortalecimiento del modelo orgánico de la OPSP, en la cual se recomendó el desarrollo de normativa interna y la reforma de manuales de procesos y procedimientos y de funciones para el área operativa de la Oficina.

A partir del mismo, se ha elaborado un borrador del Reglamento de Operación de la OPSP, así como borradores de **Manuales de Normas y Procedimientos y de Organización y Funciones** de la OPSP. Se ha dotado de medios para el **acondicionamiento** de la Oficina de Protección, así como **equipo tecnológico** para los nuevos puestos de trabajo. Se ha diseñado los **contenidos del curso de entrenamiento** del personal que integra la Sección Operativa y el Grupo Policial de Apoyo de PNC, en técnicas de seguridad y protección de testigos en ambientes de alto riesgo.




Se informó que las acciones en curso actualmente son: 1) Preparación del **curso de entrenamiento en seguridad y protección de testigos en ambientes de alto riesgo** en coordinación con la Dirección General de la Policía Nacional Civil 2) **Protocolos de actuación** para PNC y OP para el fortalecimiento de la Sección Operativa y el Grupo de Apoyo Policial; y 3) Diseño de **procedimientos de control interno** para la Oficina de Protección que permitirán el perfilamiento de la sección que tendrá a su cargo las acciones de supervisión y control del personal de la Oficina de Protección.

Finalmente, se informó que se entregó al despacho del anterior Fiscal General, en abril 2018, copias de varios productos apoyados por UNODC con fondos del PBF, para aprobación, y se pidió que se agilizará la misma. La Fiscal General informó que estos documentos se encuentren con la Secretaria de Política Criminal para su análisis y se estará dando seguimiento para su revisión y aprobación.

Fotos:

10.08.18 Sra. Maria Consuelo Porras, Fiscal General y jefe del MP, enseña al Comité Ejecutivo PBF las instalaciones remodeladas de la OPSP, incluyendo áreas lúdicas para niños que acompañan a sus padres testigos.



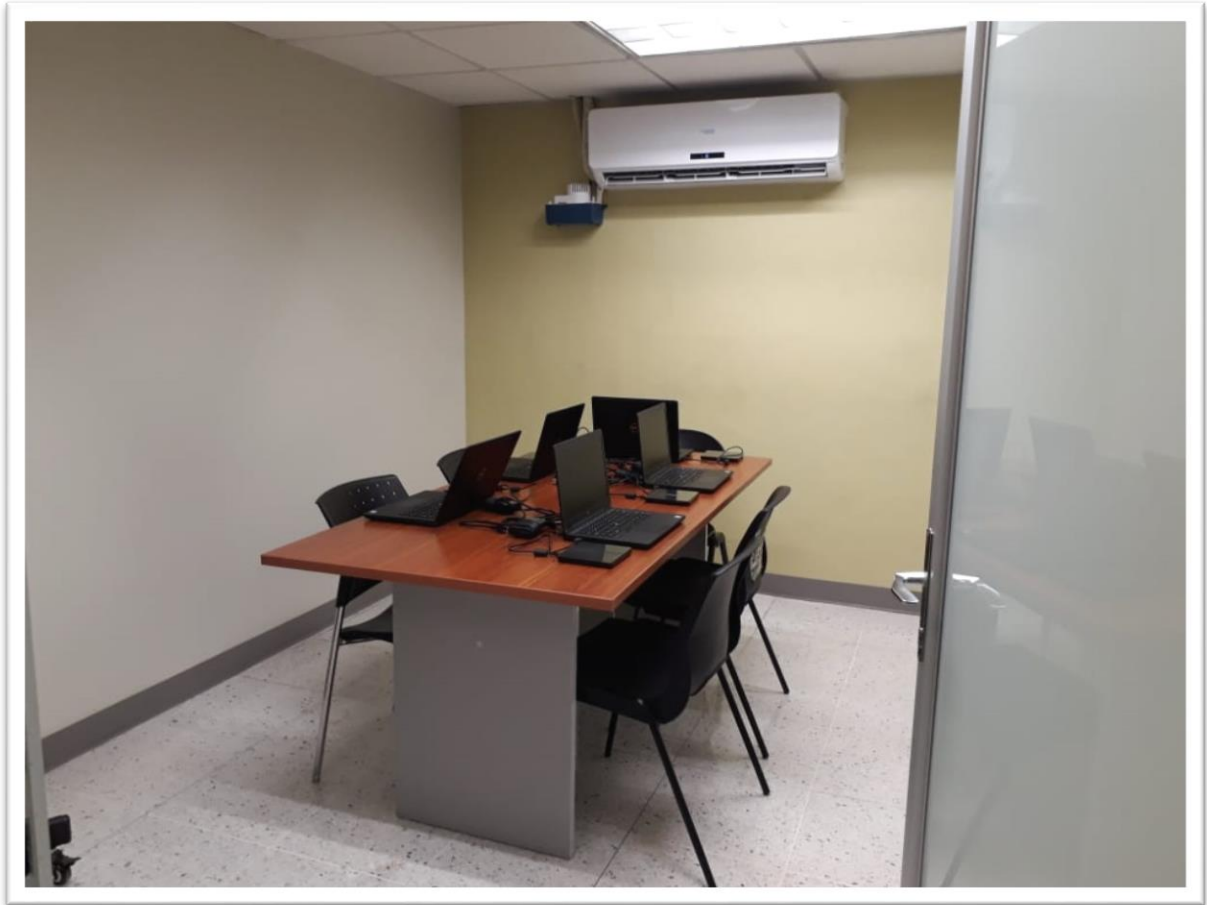

10.08.18 Ejemplo de sala remodelada e equipo instalado



10.08.18 Miembros del Comité Ejecutivo y personal técnico de los proyectos PBF y del MP en las instalaciones renovadas del OPSP.

Anexo 1: Agenda

Agenda

Hora	Tema	Responsable	Lugar
8.00-8:10am	Bienvenida	Dra. María Consuelo Porras, Fiscal General y jefe del Ministerio Público	Salón del Consejo, 8º Nivel, Edificio Gerona
8.10-8.20 am	Apoyo del PBF a la OPSP Objetivos de la visita Presentación de participantes	Sra. Rebeca Arias, Coordinadora Residente del SNU y Co-Presidente del Comité Ejecutivo PBF	Salón del Consejo, 8º Nivel, Edificio Gerona
8.20-9.00am	Presentación sobre el proceso de fortalecimiento de la OPSP apoyado por PBF mediante UNODC	Sr. Adelmo Marín Bámaca Jerónimo, Encargado de la Subdirección de la OPSP; Sr. Enrique Marín, director UNODC	Salón del Consejo, 8º Nivel, Edificio Gerona
9.00-9.20am	Visita a las instalaciones de la OPSP	Sr. Juan Pablo Ríos, Consultor Técnico UNODC. Sr. Adelmo Marín Bámaca Jerónimo, Encargado de la Subdirección de la OPSP	Instalaciones del OPSP, Sótano 1 Edificio Gerona
9.20-9.30am	Conclusiones y cierre	Sr. Enrique Marín, UNODC	Instalaciones del OPSP, Sótano 1 Edificio Gerona



Anexo 2: Participantes

Nombre	Position	Agencia
Rebeca Arias	Coordinadora Residente y Representante Residente del PNUD	SNU
Michelle Prieto	Sub-secretaria de Cooperación Internacional	SEGEPLAN
Melissa Gonzalez	Directora de Enlace-Territorio de la Cooperación Internacional	SEGEPLAN
Maria Consuelo Porras	Fiscal General y Jefe del MP	MP
Herberth Morales	Jefe de Cooperación Internacional	MP
Claudia Arrecis	Secretaria Privada	MP
Ángel Pineda	Secretario de Cooperación Internacional	MP
Ana Ruiz	OPSP	MP
Adelmo Bámaca	Encargado de la Sub-Dirección de la OPSP	MP
Jose Lopez	OPSP	
Enrique Marin	Jefe de la Oficina de País	UNODC
Luisa Fernandez	Asociada de Proyecto	UNODC
Juan Pablo Ríos	Asesor OPSP	UNODC
Maria Renee Arevalo	Auxiliar de Proyecto	UNODC
Maria Orella	Coordinadora de Proyectos PBF MP	PNUD
Claudia de Saravia	Oficial de Programas	PNUD
Alejandra Rivas	Auxiliar de Proyecto	PNUD
Roberto Orozco	Asistente Administrativo Financiero	PNUD
Pilar Padilla	Coordinadora de Proyectos Mujeres y Acceso a la Justicia	ONU Mujeres
Alejandro Martinez	Asesor Regional	OIM
Karin Wagner	Asesora Legal	OACNUDH
Fernando Morales	Asesor	Ministerio de Gobernación
Lucy Turner	Coordinadora Secretariado PBF	OCR/PBF
Carlos Paredes	Oficial de Monitoreo & Evaluación	OCR/PBF





Al servicio
de las personas
y las naciones

Con el apoyo de



Naciones Unidas
Comisión de la Piz
