



FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ  
INFORME NARRATIVO ANUAL / FINAL  
PERIODO DEL INFORME:

| Identificación del Proyecto  |                                 | Cobertura   |  |
|--|---------------------------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Título del Proyecto: MPTF – VENTANA DE ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES</li> <li>Código del Proyecto: 97044</li> <li>MPTF Office ID:<sup>1</sup></li> </ul> |                                 | <p><i>Departamentos: NARIÑO</i></p> <p><i>Municipios: LEIVA</i></p> <p><i>Beneficiarios totales alcanzados: 6413</i></p> <p><i>Mujeres: <u>2269</u>      Hombres: <u>2305</u></i></p> <p><i>Niñas: <u>879</u>      Niños: <u>960</u></i></p>                                    |  |
| Organizaciones participantes   |                                 | Socios implementadores  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PERIGEO</li> </ul>  |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (Descontamina Colombia), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal (AICMA-OEA).</li> </ul> |  |
| Costos del Proyecto en USD   |                                 | Duración del Proyecto (en meses)  |  |
| Contribución del Fondo USD: (Por Agencia u Organización si es más de una)  | USD\$400.000                    | Duración Total:   | 12 Meses   |
|  |                                 | Fecha de Inicio:  | Marzo 2018   |
|  |                                 | Fecha inicial de cierre <sup>2</sup> (día, mes, año)  | 25/01/2018   |
| Contrapartida del Gobierno (Si aplica)   | <b>Monto:</b><br><b>Fuente:</b> | Fecha final de cierre: <sup>3</sup> (día, mes, año)   | 27/02/2019   |
|  |                                 | ¿Ha cerrado la Agencia (s) operacionalmente el Proyecto en su (s) sistema?  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Otras Contrapartidas (Si aplica)   | <b>Monto:</b><br><b>Fuente:</b> | Fecha esperada de cierre financiero <sup>4</sup> :  |  |

<sup>1</sup> El código del proyecto se encuentra referido como ID del Proyecto en la página web del Fondo <http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00>

<sup>2</sup> Se refiere a la primera fecha de inicio aprobada por el Comité de Dirección del Fondo.

<sup>3</sup> Indicar la última fecha de cierre aprobada por el Comité Directivo en caso de que se haya aprobado una extensión en tiempo. La fecha final es la misma que la de cierre operacional la cual será cuando todas las actividades para las cuales la Organización participante es responsable ante un proyecto aprobado por el MPTF han sido completadas. En relación al MOU, las agencias notificarán al MPTF cuando el proyecto haya completado sus actividades operacionales. Por favor ver la guía de cierre de operaciones del MPTF en [MPTF Office Closure Guidelines](#).

<sup>4</sup> El cierre financiero requiere el reembolso de los balances no gastados y el envío del certificado final del estado financiero e informe disponible en [Certified Final Financial Statement and Report](#).



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Apalancamiento<br>(Si aplica)   | <b>Monto: USD\$249.950</b><br><b>Fuente: UNMAS</b> |   |  |
| <b>TOTAL:</b>   | USD\$249.950                                       |   |  |
| <b>Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término:</b>   |  | <b>Informe presentado por:</b>  |  |
| ¿El proyecto fue sujeto de evaluación externa o revisión interna?<br><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No<br>Evaluación Terminada:<br><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No    Fecha: 21/02/2018<br>Informe de Evaluación – Adjunto<br><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No    Fecha: 21/02/2018 |  | <input type="checkbox"/> Nombre: Andrés Goyeneche Vanegas<br><input type="checkbox"/> Cargo: Subdirector de Proyectos<br><input type="checkbox"/> Organización participante (o líder): PERIGEO<br><input type="checkbox"/> Correo electrónico: andres.goyeneche@perigeo.org |  |

### ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS

ERR: Estrategia de Respuesta Rápida.  
 ENT: Estudio No Técnico.  
 ERM: Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal.  
 MAP: Minas antipersonal.  
 AEI: Artefactos Explosivos Improvisados.  
 MUSE: Municiones Sin Explosionar.  
 PNUID: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  
 CEM: Componente Externo de Monitoreo.  
 AICMA: Acción Integral Contra las Minas Antipersonal.  
 JAC: Junta de Acción Comunal.  
 AP: Área Peligrosa.  
 APC: Área Peligrosa Confirmada.  
 OEA: Organización de Estados Americanos.  
 MPTF: Fondo multidonante de las Naciones Unidas para el postconflicto.  
 EXDE: Equipo de Explosivos y Demoliciones.  
 CRI: Centro de Rehabilitación Inclusiva de las Fuerzas Armadas.  
 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.  
 VISP: Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas.  
 OIM: Organización Internacional para las Migraciones.





## FORMATO PARA EL INFORME ANUAL / FINAL

### RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto propuesto está en línea con la Estrategia de Respuesta Rápida (ERR) para la estabilización del posconflicto del Gobierno colombiano y contribuye directamente al efecto #3 del Fondo que tiene como objetivo, “Mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y reactivas”, a través del fortalecimiento de las actividades de Desminado Humanitario y el apoyo al desarrollo socioeconómico.

En el marco de este proyecto se logró el entrenamiento, evaluación y acreditación de un equipo de despeje manual, desplegando esta capacidad en un área peligrosa identificada durante la realización de ENT, la cual tiene un área de 2843 metros cuadrados de los cuales a la fecha de 31 de enero se han despejado 778 metros cuadrados que equivale a un 27% del total de esta área peligrosa; de igual forma se logró finalizar la investigación de dos sectores libres de sospecha de minas antipersonal (Santa Lucía y Las Delicias), los cuales se encuentran disponibles para su entrega a la comunidad; adicionalmente se avanzó en la investigación de tres sectores (Nariño, El Palmar y Especial de Leiva) en este último se identificó el área peligrosa anteriormente enunciada.

Por otra parte, se han realizado 84 talleres de ERM en los 8 sectores que integran el municipio de Leiva, en donde se han beneficiado un total de 1678 personas.

#### I. CONTEXTO Y OBJETIVO

El objetivo propuesto para este proyecto es el fortalecimiento de las actividades de desminado humanitario en el municipio de Leiva – Nariño. Este municipio ha sido priorizado por la Dirección Descontamina Colombia como zona de alta afectación por minas antipersonal. Este municipio ha sido asignado a Perigeo para que realice actividades relacionadas con el Desminado Humanitario. Por su parte, Perigeo ha firmado una orden de tareas en donde se tiene en cuenta las prioridades de la autoridad local; para hacer frente a la contaminación por MAP/AEI/MUSE Perigeo intervendrá las áreas peligrosas o peligrosas confirmadas de mayor impacto, en el marco de la estrategia de respuesta rápida.

El plan de trabajo previsto en el proyecto se desarrolló conforme a lo establecido y acordado en el Acuerdo de Parte Responsable entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Perigeo en donde se obtuvieron los siguientes resultados:

- Entrenamiento, evaluación operacional y certificación de un equipo de despeje manual.
- Despliegue de las actividades de Estudio No Técnico (ENT) con dos equipos.
- Despeje de un área peligrosa identificada durante los ENT.
- Desarrollo de las actividades de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM).

Estas actividades se desarrollaron satisfactoriamente en coordinación con la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (Descontamina Colombia), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Componente Externo de Monitoreo (CEM) del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal (AICMA) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los resultados obtenidos de las actividades desarrolladas por parte de PERIGEIO en las áreas intervenidas permitieron incrementar la confianza y seguridad de las comunidades en su territorio.



## II. RESULTADOS DEL PROYECTO

### i) Informe narrativo de los resultados:

El desarrollo de las actividades programadas en el proyecto inició el 02 de abril, este retraso se debe a que el primer desembolso del Fondo Multidonante se realizó el 28 de marzo. Perigeo NGO ha realizado actividades de enlace comunitario con Presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC), líderes comunitarios y autoridades municipal.

Durante los días 11 y 12 de abril, el personal de Perigeo NGO, que integra los equipos de Estudio No Técnico (ENT), Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM) y los responsables de las operaciones adelantaron formación de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal en el marco de las operaciones de desminado humanitario, este taller fue brindado por la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal – Descontamina Colombia con el apoyo de UNICEF.

Este mismo mes se realizó las enmiendas a los PO (procedimientos operacionales), ordenados por la autoridad nacional de desminado “Descontamina Colombia”, los cuales fueron aprobados tras la revisión realizada por el Componte Externo de Monitoreo de la Organización de Estados Americanos y con los que se pudo iniciar el reentrenamiento de los equipos de ENT. Es de anotar que para esta fecha se contaba con la información necesaria y el plan de operaciones aprobado por la Dirección Descontamina Colombia para iniciar posteriormente con nuestras labores de reentrenamiento. De igual forma se inició el proceso de adquisición del material y seguros para el inicio de actividades de desminado humanitario

En el mes de mayo se inicia la investigación en terreno del corregimiento de Santa Lucia correspondiente al sector No. 6 del municipio de Leiva-Nariño; en donde se investigaron un total de cinco (05) veredas sin encontrar sospechas de contaminación con minas antipersonal y un evento IMSMA el cual arrojó como resultado la cancelación del mismo, finalizando la investigación en este sector el día 01 de junio de 2018 (Ver anexo 1).

El día 21 de junio de 2018 se inició la investigación en terreno del sector No. 4 el cual corresponde al corregimiento Especial de Leiva; iniciando por la vereda La Garganta en donde el día 25 de junio de 2018 se identificó un área peligrosa con el nombre de la Cabaña de 2.843 m<sup>2</sup> siendo esta la primera área peligrosa identificada por los equipos de ENT, de igual forma se continuó con la investigación de las veredas Buenavista, Los Planes, Las Huertas, Cañaveral, Armepalo, Huecolindo y La Esperanza en donde se han investigado cuatro (04) eventos IMSMA de los veintidós (22) registrados en el expediente municipal, cancelando tres (03) de estos y desvirtuando uno (01) en este sector (Ver anexo2).

El día 23 de junio del presente año se inició la investigación en terreno del sector No. 1 el cual corresponde al corregimiento de Nariño, iniciando por las veredas de El Porvenir, Nariño y El Ofrio en donde se suspendió la investigación de este sector, ya que las condiciones de seguridad y la presencia de grupos armados no han permitido continuar con la investigación en dicho sector. Los equipos de ENT se encuentran a la espera de que las condiciones de seguridad cambien para continuar con la investigación de las veredas El Porvenir y Nariño (Ver anexo 3).

El día 01 de octubre del presente año se inició la investigación en terreno del sector No. 2 el cual corresponde al corregimiento de Las Delicias, en donde se investigaron un total de siete (07) veredas (cedral bajo, cedral alto, el bosque, campo bello, el sauce, el suspiro y el caserío las delicias) sin encontrar sospechas de contaminación con minas antipersonal, finalizando la investigación en este sector el día 08 de noviembre de 2018 (Ver Anexo 4).

Una vez identificada el Área Peligrosa de la Cabaña de 2.843 m<sup>2</sup> en el sector No. 4 del Corregimiento Especial Leiva, vereda La Garganta, el día 20 de agosto se inició el proceso de capacitación del equipo de despeje con técnica manual, una vez surtido el proceso de evaluación y acreditación operacional del equipo de despeje manual se inicia operaciones de despeje el día 22 de octubre, en donde hasta el 31 de enero del año 2019, se han barrido un total de 778 m<sup>2</sup> despejados en la fase de Estudio Técnico.

El entrenamiento y capacitación del personal que integra el equipo de despeje manual se retrasó, debido a que no se habían identificado Áreas Peligrosas – AP en ENT, esto evitó incurrir en gastos de salarios u honorarios innecesarios al proyecto de personal que integra el equipo de despeje.




El día 09 de noviembre de 2018 se inició con la investigación en terreno en la tarea de estudios no técnicos en el corregimiento de El Palmar con dos equipos, realizando visitas casa a casa y actividades de enlace comunitario en el centro poblado del corregimiento, finalizando la investigación el día 29 de noviembre de 2018.

El día 04 de diciembre se inicia con la investigación en terreno de la vereda la planada y a la fecha de este reporte se continua con las visitas casa a casa. De igual forma los días 07 y 10 de diciembre de 2018 se realizaron reuniones de enlace comunitario con los habitantes de las veredas El Chupadero y Campo Alegre del corregimiento El Palmar, con el fin de socializar y dar a conocer el proceso de desminado humanitario y de educación en el riesgo de minas antipersonal que la Organización viene llevando a cabo en el municipio de Leiva – Nariño.



La situación de seguridad de los sectores de El Palmar, El tablón, La Florida y La Villa es muy sensible debido a la fuerte presencia de cultivos de uso ilícito; por tal razón, el ingreso de los equipos de ENT a estos sectores se ha visto retrasada. Como estrategia de acercamiento se han establecido canales de comunicación con presidentes de juntas de acción comunal y líderes comunitarios de estos sectores, buscando generar lazos de confianza y espacios concertados que nos permitan dar a conocer nuestras actividades en ERM y desminado humanitario, consiguiendo que se desligue en la comunidad la percepción que tienen de que el desminado es la puerta para la erradicación de cultivos de uso ilícito.

Otra de las razones que afecta la productividad de los equipos en terreno se debe a las largas distancias que hay de una casa a otra, en donde las vías de acceso son escasas, haciendo que la mayoría de los desplazamientos de los equipos se realicen a pie.

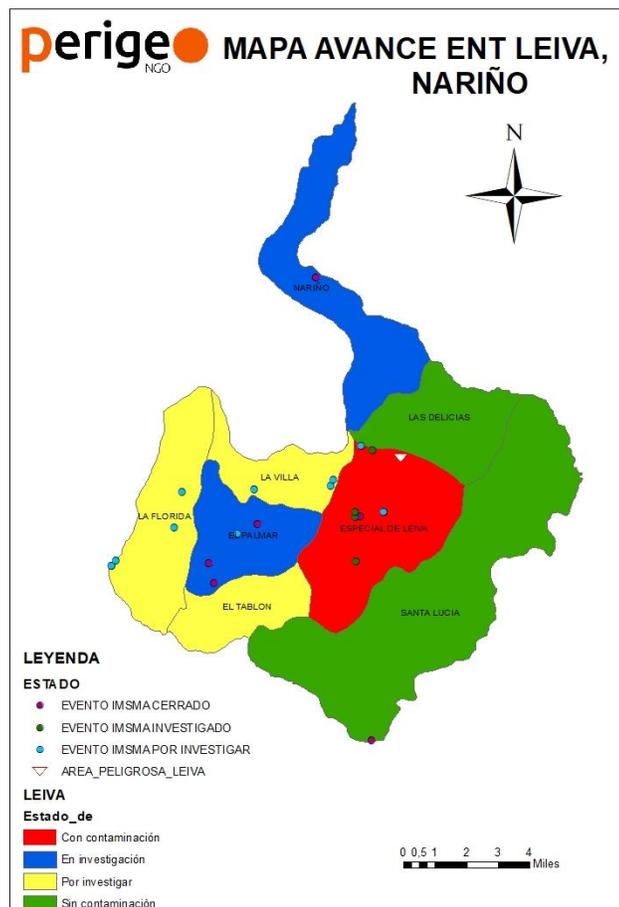



Al 31 de enero de 2019 se han realizado ochenta y cuatro (84) talleres de ERM a la población de los corregimientos de Nariño, Delicias, La Florida, Especial de Leiva, Palmar, Santa Lucia, La Villa y El Tablón, donde se han capacitado 1678 personas en comportamientos seguros discriminados como se muestra en las siguientes gráficas:

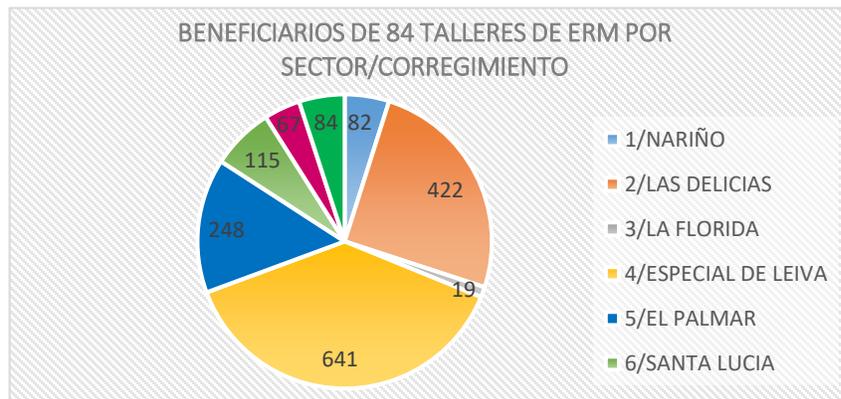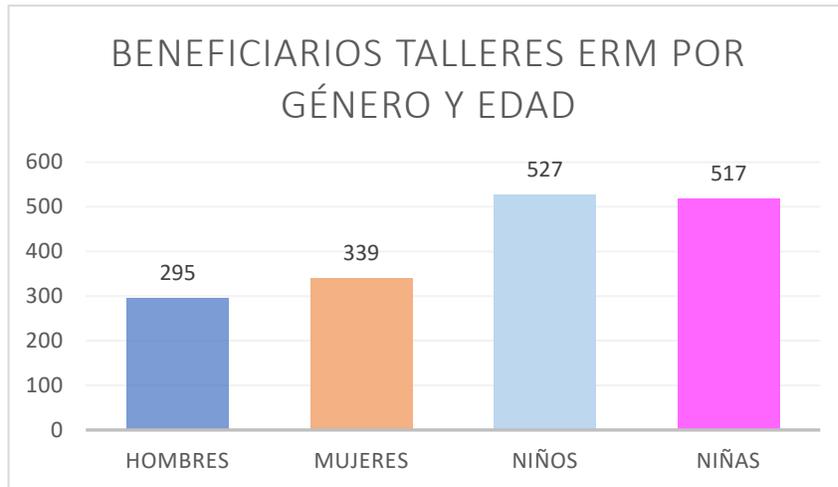

El personal de Perigeo NGO que integra los equipos de ERM y el responsable de los proyectos adelantaron el curso básico (21, 22 y 23 de mayo) y el curso avanzado (13, 14 y 15 de junio) de ERM en la ciudad de Bogotá, el curso de ERM en Desminado Humanitario (11, 12 y 13 de agosto) en Algeciras – Huila y el curso Básico (28, 29 y 30 de agosto) de ERM en la ciudad de Pasto - Nariño.

A fecha 31 de enero de 2019 se continua con las actividades de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM), Estudio No Técnicos (ENT) y de Despeje del área peligrosa identificada en el corregimiento Especial de Leiva correspondiente al sector No. 2 vereda la Garganta del municipio de Leiva – Nariño.





## ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:

| <b>Cuadro 2: Marco de resultados</b>  |  | <b>Título del proyecto: Desminado humanitario en el municipio de Leiva (Nariño)</b> |      |      |       |  |  |  |
|---|--|---|------|------|-------|--|--|--|
| <b>Efecto del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá</b>  | "Mejorada la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y reactivas" a través del fortalecimiento de las actividades de Desminado Humanitario y el apoyo al desarrollo socioeconómico. |   |      |      |       |  |  |  |
| <b>Indicadores del Resultado del Fondo:</b>   | <b>Áreas Geográficas</b>   | <b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b>  |      |      |       | <b>Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)</b> | <b>Medios de Verificación</b>  |  |
| El efecto # 3 del Fondo, "Mejorada la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y reactivas" bajo el ámbito de justicia y seguridad. Los proyectos de la convocatoria contribuirán a la implementación de la Estrategia de Respuesta Rápida para la estabilización en el posconflicto del Gobierno Colombiano. | Municipio de Leiva – Nariño y las veredas priorizadas en la orden de tareas: el Chorro, la Garganta, Ramos, El Cucho, Florida Alta, Media y Baja, Alto bonito, Puerto Nuevo, Chupadero o el Cedro.   |   | H    | M    | Niñas | Niños  | Planeado: corresponde al total de la población del municipio.<br>Alcanzado: No se pudo acceder en algunas veredas del municipio. | Informes oficiales al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, y La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia |
|   |  | Planeado  | 5676 | 6149 | 1005  | 1019   |  |  |
|   |  | Alcanzado   | 2305 | 2269 | 960   | 879  |  |  |
| <b>Sub-Resultado 1:</b>   | <i>Sub-resultado específico, si corresponde. Organización/es responsable/s del Resultado:</i>  |   |      |      |       |  |  |  |
| <b>Indicadores del Resultado del Fondo:</b>   | <b>Áreas Geográficas</b>   | <b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b>  |      |      |       | <b>Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)</b> | <b>Medios de Verificación</b>  |  |
| Número de beneficiarios (directos e indirectos) estimados y alcanzados cómo resultado de la intervención  | Municipio de Leiva – Nariño y las veredas priorizadas en la orden de tareas: el Chorro, la Garganta, Ramos, El Cucho, Florida Alta, Media y Baja,  |   | H    | M    | Niñas | Niños  | Planeado: corresponde al total de la población del municipio.<br>Alcanzado: No se pudo acceder en algunas veredas del municipio. | Informes oficiales al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, y La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia |
|   |  | Planeado  | 5676 | 6149 | 1005  | 1019   |  |  |
|   |  | Alcanzado   | 2305 | 2269 | 960   | 879  |  |  |





|  |  |  |   |   |       |  |   |  |
|--|--|--|---|---|-------|--|---|--|
|  | Alto bonito,<br>Puerto Nuevo.<br>Chupadero o el<br>Cedro.                                    |  |   |   |       |  |   |  |
| <b>Producto 1.1</b>  | <i>Entrenamiento, evaluación operacional y certificación de un equipo de despeje manual.</i> |  |   |   |       |  |   |  |
| <b>Indicadores de resultados inmediatos</b>  | <b>Áreas Geográficas</b>   | <b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b> |   |   |       | <b>Meta Planeada vs Alcanzada<br/>(Explicar las razones de la variación si aplica)</b> | <b>Medios de Verificación</b>   |  |
| Número de personas nuevas certificadas por la Autoridad Nacional para actividades de despeje (desagregado por género y edad) | Municipio de Leiva – Nariño.   |  | H | M | Niñas | Niños  | Planeado: 08 personas (04 Hombres y 04 mujeres, en un rango de edad de 18 años en adelante)<br>Alcanzado: 09 personas (06 Hombres y 03 mujeres, en un rango de edad de 18 años en adelante) | Informes oficiales al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, y La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia |
|  |  | Planeado                                     | 4 | 4 | 0     | 0  |   |  |
|  |  | Alcanzado                                    | 6 | 3 | 0     | 0  |   |  |
| Número de personas certificadas y contratadas localmente (desagregado por género y edad)                                     | Municipio de Leiva – Nariño.   |  | H | M | Niñas | Niños  | Planeado: 08 personas (04 Hombres y 04 mujeres, en un rango de edad de 18 años en adelante)<br>Alcanzado: 05 personas (03 Hombres y 02 mujeres, en un rango de edad de 18 años en adelante) | Informes oficiales al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, y La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia |
|  |  | Planeado                                     | 4 | 4 | 0     | 0  |   |  |
|  |  | Alcanzado                                    | 3 | 2 | 0     | 0  |   |  |
| <b>Producto 1.2</b>  | <i>Despliegue de las actividades de ENT con dos equipos de ENT.</i>                          |  |   |   |       |  |   |  |
| <b>Indicadores de resultados inmediatos</b>  | <b>Áreas Geográficas</b>   | <b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b> |   |   |       | <b>Meta Planeada vs Alcanzada<br/>(Explicar las razones de la variación si aplica)</b> | <b>Medios de Verificación</b>   |  |
|  | Municipio de Leiva – Nariño.   |  | H | M | Niñas | Niños  | Planeado: Dos equipos de ENT operativos 07 personas (04   | Informes oficiales al Fondo Multidonante de  |
|  |  | Planeado                                     | 4 | 3 | 0     | 0  |   |  |





|   |                              |   |   |   |       |       |   |   |
|---|------------------------------|---|---|---|-------|-------|---|---|
| Número de equipos desplegados para la realización de ENT (desagregado por género y edad)                            |                              | Alcanzado   | 3 | 5 | 0     | 0     | hombres y 03 mujeres, en un rango de edad de 18 años en adelante)<br>Alcanzado: Dos equipos de ENT operativos 08 personas (03 Hombres y 05 mujeres, en un rango de edad de 18 años en adelante) | las Naciones Unidas para el Posconflicto, y La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia  |
| Número de personas certificadas y contratadas localmente para la realización de ENT (desagregado por género y edad) | Municipio de Leiva – Nariño. |   | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 02 personas (02 mujeres, en un rango de edad de 18 años en adelante)<br>Alcanzado: 04 personas (01 Hombre y 03 mujeres, en un rango de edad de 18 años en adelante)                   | Informes oficiales al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, y La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia  |
|   |                              | Planeado  | 0 | 2 | 0     | 0     |   |   |
|   |                              | Alcanzado   | 1 | 3 | 0     | 0     |   |   |
| # de AP o APC identificadas en ENT / # de AP o APC aprobadas por la OEA   | Municipio de Leiva – Nariño. | Un (01) AP o APC identificada en ENT / Un (01) AP o APC aprobada por la OEA     |   |   |       |       | Planeado: # de AP o APC identificadas en ENT<br>Alcanzado: Un (01) AP o APC identificadas en ENT / aprobada por la OEA  | Reportes de aseguramiento y control de calidad del Componente Externo de Monitoreo de la OEA  |
| # de eventos IMSMA investigados / # total de eventos asignados en el expediente municipal                           | Municipio de Leiva – Nariño. | 11 eventos IMSMA investigados / 22 eventos asignados en el expediente municipal |   |   |       |       | Planeado: Investigar los 22 eventos asignados en el expediente municipal<br>Alcanzado: 11 eventos IMSMA investigados  | Informes oficiales al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, y La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia. |





|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| # de AP/APC señalizadas según estándar nacional # total de AP/APC identificadas en ENT                                | Municipio de Leiva – Nariño.   | Un (01) AP o APC identificada en ENT / Un (01) AP o APC señalizadas según estándar nacional.                   | Planeado: # de AP o APC identificadas en ENT<br>Alcanzado: Un (01) AP o APC identificadas en ENT y señalizada según estándar nacional | Informes oficiales al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, y La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia. |
| # de áreas canceladas / # total de áreas canceladas aprobadas por la OEA  | Municipio de Leiva – Nariño.   | Cero (0) áreas canceladas / Cero (0) áreas canceladas aprobadas por la OEA                                     | A la fecha de corte del presente informe no se han cancelado áreas.   | Reportes de aseguramiento y control de calidad del Componente Externo de Monitoreo de la OEA.   |
| <b>Producto 1.3</b>   | <i>Realización de las fases de ET y Despeje con un equipo de despeje manual.</i> |  |   |   |
| <b>Indicadores de resultados inmediatos</b>   | <b>Áreas Geográficas</b>   | <b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b>   | <b>Meta Planeada vs Alcanzada<br/>(Explicar las razones de la variación si aplica)</b>  | <b>Medios de Verificación</b>   |
| # de m2 despejados en AP/APC de impacto alto/medio por técnica de despeje manual / # total de m2 identificados en ENT | Municipio de Leiva – Nariño.   | 778 m2 despejados en AP/APC de impacto alto/medio por técnica de despeje manual / 2843 m2 identificados en ENT | Planeado: 2843 m2 identificados en ENT<br>Alcanzado: 778 m2 despejados en AP/APC de impacto alto/medio por técnica de despeje manual. | Informes y reportes de progreso de las operaciones de desminado humanitario establecidos por la Dirección Descontamina Colombia   |
| # de AP/APC entregadas como libre de Minas Antipersonal / # total de AP/APC despejadas y finalizadas                  | Municipio de Leiva – Nariño.   | Cero (0) AP/APC entregadas como libre de Minas Antipersonal / Cero (0) AP/APC despejadas y finalizadas         | A la fecha de corte del presente informe no se han entregado AP/APC como libre de Minas Antipersonal.                                 | Informes y reportes de progreso de las operaciones de desminado humanitario establecidos por la Dirección Descontamina Colombia   |





|   |  |   |   |   |       |  |   |  |
|---|--|---|---|---|-------|--|---|--|
| # de artefactos explosivos destruidos / # total de artefactos explosivos encontrados  | Municipio de Leiva – Nariño.                 | Cero (0) artefactos explosivos destruidos / Cero (0) total de artefactos explosivos encontrados | A la fecha de corte del presente informe no se han encontrado ni destruido artefactos explosivos. | Informes y reportes de progreso de las operaciones de desminado humanitario establecidos por la Dirección Descontamina Colombia |       |  |   |  |
| <b>Producto 1.4</b>   | <i>Desarrollo de las actividades de ERM.</i> |   |   |   |       |  |   |  |
| <b>Indicadores de resultados inmediatos</b>   | <b>Áreas Geográficas</b>                     | <b>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</b>  |   |   |       | <b>Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)</b> | <b>Medios de Verificación</b>   |  |
| Porcentaje de beneficiarios directos de ENT capacitados en comportamientos seguros del total de beneficiarios directos de ENT (desagregado por género y edad) | Municipio de Leiva – Nariño.                 |   | H   | M   | Niñas | Niños  | Planeado: el 100% de los hombres, mujeres, niños y niñas capacitados en comportamientos seguros del total de beneficiarios directos de ENT (desagregado por género y edad)<br>Alcanzado: A la fecha el porcentaje de beneficiarios directos capacitados en comportamientos seguros es el siguiente:<br>Mayores de 18 años:<br>Hombres: 5.2%<br>Mujeres: 5.5%<br>Menores de 18 años:<br>Niños: 52.4%<br>Niñas: 50.7% | Informes oficiales al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, y La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia |
|   |  | Planeado  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%   |   |  |
| Porcentaje de beneficiarios directos de ENT capacitados en  | Municipio de Leiva – Nariño.                 |   | H   | M   | Niñas | Niños  |   | Informes oficiales al Fondo Multidonante de  |
|   |  | Planeado  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%   |   |  |



|  |                              |   |     |     |     |     |   |  |
|--|------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|---|--|
| etapas de ET y despeje del número total de beneficiarios directos de ENT en áreas intervenidas |                              | Alcanzado                                   | 41% | 37% | 86% | 96% | Planeado: el 100% de los hombres, mujeres, niños y niñas capacitados en etapas de ET y despeje<br>Alcanzado: A la fecha el porcentaje de beneficiarios directos de ENT capacitados en etapas de ET y despeje es el siguiente:<br>Mayores de 18 años:<br>Hombres: 41%<br>Mujeres: 37%<br>Menores de 18 años:<br>Niños: 96%<br>Niñas: 86% | las Naciones Unidas para el Posconflicto, y La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia |
| Número de reuniones con autoridades territoriales según estándares                             | Municipio de Leiva – Nariño. | 15 reuniones con autoridades territoriales. |     |     |     |     | Planeado: Llegar a la totalidad de autoridades territoriales del municipio de Leiva.<br>Alcanzado: A la fecha del presente informe se han realizado 15 reuniones con autoridades territoriales.   | Actas de enlace comunitario y listados de asistencia establecidos por la Dirección Descontamina Colombia                           |
| Número de reuniones con autoridades comunitarias según estándares comunitarias                 | Municipio de Leiva – Nariño. | 72 reuniones con autoridades comunitarias.  |     |     |     |     | Planeado: Llegar a la totalidad de autoridades comunitarias de las veredas y sectores del municipio de Leiva.<br>Alcanzado: A la fecha del presente informe se han realizado 72 reuniones con autoridades comunitarias.   | Actas de enlace comunitario y listados de asistencia establecidos por la Dirección Descontamina Colombia                           |





## ii) Evaluación, Mejores Prácticas y lecciones aprendidas (obligatorio)

- A la fecha de 31 de enero de 2019 no se ha realizado evaluación final del proyecto ya que este finaliza en el día 28 de febrero de 2019.
- Uno de los retos fue el desarrollo de las actividades programadas en el proyecto, esto debido al retraso en el primer desembolso del MPTF el cual se realizó el 28 de marzo de 2018, iniciando actividades el 02 de abril de 2018. Adicionalmente, la situación de seguridad de los sectores de El Palmar, Nariño, El tablón, La Florida y La Villa es muy sensible debido a la fuerte presencia de cultivos de uso ilícito; por tal razón, el ingreso de los equipos de ENT y ERM a estos sectores se ha visto retrasada. Como estrategia de acercamiento se han establecido canales de comunicación con presidentes de juntas de acción comunal y líderes comunitarios de estos sectores, buscando generar lazos de confianza y espacios concertados que nos permitan dar a conocer nuestras actividades en ERM y desminado humanitario, consiguiendo que se desligue en la comunidad la percepción que tienen de que el desminado es la puerta para la erradicación de cultivos de uso ilícito.

Otra de las razones que afecta la productividad de los equipos en terreno se debe a las largas distancias que hay de una casa a otra, en donde las vías de acceso son escasas, ante esta situación los equipos han realizado sus desplazamientos a pie.

El entrenamiento y capacitación del personal que integra el equipo de despeje manual se retrasó, debido a que no se habían identificado Áreas Peligrosas – AP en ENT, esto evitó incurrir en gastos de salarios u honorarios innecesarios al proyecto de personal que integra el equipo de despeje.

Otro de los retos que se nos ha presentado y que afectó el avance y rendimiento de las operaciones de despeje, ha sido la renuncia del jefe de equipo en el mes de diciembre, razón por la cual nos obliga a buscar un nuevo jefe de equipo, entrenarlo y certificarlo por parte de la Autoridad Nacional. De igual forma, el área peligrosa en donde se está efectuando el despeje se encuentra altamente contaminada por metales, lo que nos ha llevado a emplear el método de excavación total, sumado a esto el terreno es bastante escarpado y agreste retrasando el rendimiento de las operaciones de despeje del área peligrosa.

- Como lección aprendida podemos afirmar que la comunicación e interacción permanente con la comunidad es base fundamental para la construcción de confianza y de esta forma es posible solucionar en conjunto las dificultades que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades de desminado, coadyuvando a la seguridad de los equipos en terreno. La inclusión de personal local en la organización ha favorecido el desarrollo de las actividades de desminado humanitario en el municipio y en especial la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones en procesos o programas sociales, aseguran la promoción a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las diferentes actividades que buscan garantizar la protección de las mujeres y niñas de todas las formas de violencia.

PERIGEO ha contratado y seguirá contratando a mujeres cabeza de hogar ya que considera que tiene una vulnerabilidad ante el resto la población femenina económicamente activa y al hacerlo consideramos que se ejerce responsabilidad social desde la protección de la unidad familiar.

## iii) Una historia específica (obligatorio)

- EIVER JOSÉ BAQUERO RAMOS, perteneció al Ejército Nacional de Colombia durante tres años (2006 - 2009), desempeñándose como soldado profesional en donde recibió capacitación en temas de explosivos, perteneciendo al Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) del Batallón de Contraguerrillas N° 10 en ese tiempo con sede en la ciudad de Montería. En el año 2008 durante una operación de desminado militar y control territorial en el Parque Nacional Nudo de Paramillo en el departamento de Córdoba, el 22 de septiembre a la 1:30 pm, su unidad militar avanzaba por las inmediaciones del parque en donde él activó una mina antipersonal, causándole la pérdida del miembro inferior derecho.



En el año 2017 se vinculó al Centro de Rehabilitación Inclusiva de las Fuerzas Armadas (CRI); este centro tuvo el apoyo del gobierno de Corea del Sur quien aportó el 50% para su construcción y funcionamiento, todo en agradecimiento al Gobierno de Colombia por su apoyo en la guerra de Corea. En el CRI se rehabilitan miembros de la fuerza pública heridos en combate, en especial por artefactos explosivos y minas antipersonal; estando en su proceso de rehabilitación las directivas del CRI autorizan el uso de sus instalaciones para una capacitación de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal, la cual fue convocada y organizada por la Organización Civil de Desminado Humanitario Perigeo NGO, esta capacitación fue dirigida por funcionarios de UNICEF y la Dirección Descontamina Colombia, siendo también invitado el beneficiario Eiver Baquero y otros compañeros. Después de un mes y medio el Sr Eiver Baquero fue postulado a una convocatoria donde la organización le notifica si estaba interesado en pertenecer al equipo de ERM que tiene como objetivo brindar talleres y capacitaciones a las comunidades vulnerables por la sospecha y presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar, Eiver Baquero después de asistir y superar los procesos de vinculación se le informa que ha sido escogido para hacer parte de la organización en el cargo de auxiliar del equipo de ERM, él recibe con alegría y mucha satisfacción esta noticia resaltando su importante labor en las operaciones de desminado humanitario y en especial en la educación en el riesgo de minas antipersonal, interactuando con la comunidad y brindándoles capacitación, educación y sensibilización, ayudando a fomentar una cultura de comportamientos seguros para reducir el riesgo que representa la presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar.

En este tiempo el trabajo social ha sido un éxito ya que admira y valora su labor humanitaria, manifestando su agrado y felicidad por aportar su granito de arena en la construcción de la paz y en el cumplimiento de las metas propuestas por la organización. Eiver Baquero seguirá aportando con su trabajo y empeño para ayudar a prevenir y reducir los accidentes con minas antipersonal y otros artefactos explosivos improvisados en las comunidades más afectadas por esta problemática.



La sonrisa de José después de leer todas las cartas de agradecimiento por parte de los niños de la Institución Educativa de la vereda Las Delicias, a los cuales les brindó un taller de ERM. "SONRISA DE MISIÓN CUMPLIDA"



- Contribuciones a la relación de colaboración entre el Operador del Desminado y la Comunidad<sup>5</sup>

Podríamos compartir que nuestra percepción acerca de la relación de la comunidad de la vereda La Garganta con el equipo profesional de Perigeo, cuando llegamos a la Leiva, era relativamente cercana. De hecho fueron ellos quienes facilitaron nuestro ingreso a la vereda, dado su claro conocimiento de la zona y aprovechando su relación con la comunidad construida a partir de sus visitas en el marco de la realización de estudios previos o estudios no técnicos que se adelantan en la vereda como parte del Desminado Humanitario en el Municipio.

La mayor transformación que observamos durante estos 5 meses en la relación de la comunidad con Perigeo, consistió en que a nuestra llegada se presentó en la comunidad una sensación de miedo generalizada que surgió después de la señalización de peligro que Perigeo puso al identificar una zona de riesgo. Muchas personas manifestaban que hacía más de dos meses habían puesto esa señal y nadie había vuelto y no sabían que pasaría. Entonces, contribuimos con un cambio significativo, informándole al líder del Equipo de Perigeo, esta situación de incertidumbre por parte de la comunidad y como respuesta miembros del equipo de Perigeo participaron posteriormente en el Diálogo Comunitario No 3. Durante este diálogo la comunidad junto con un grupo de 6 personas de Perigeo realizaron un acto simbólico en el que bendijeron la vida del equipo desminador para que tengan una protección espiritual que cuide sus vidas mientras continúan con el trabajo de desminado que está pendiente y bendijeron el terreno señalado como zona de peligro. Posteriormente el equipo de Perigeo se tomó el tiempo necesario para escuchar a la comunidad y explicarles de nuevo, cada una de las partes del proceso de Desminado Humanitario, de forma muy detallada y volvieron a contextualizar el valor preventivo del riesgo que tiene el hecho de dejar una zona señalizada con la cinta roja que tiene una calavera. Observamos que la comunidad se mostró atenta y curiosa con estas explicaciones y posteriormente muy agradecida porque aprendieron las implicaciones de la labor del Desminado Humanitario, que antes no sabían y les impedía cuidarse para evitar los riesgos. Al final manifestaron que recuperaron su tranquilidad al aclarar sus dudas acerca de los peligros y los cuidados que deben tener. La participación de Perigeo durante este Diálogo Comunitario permitió que la comunidad pudiera redimensionar el valor de la labor del Desminado Humanitario y comprender las múltiples acciones que realizan y el tiempo que toma. A partir de ese momento, miembros del equipo de Perigeo continuaron acompañando a la comunidad, participando en las Mingas de Sanación y en los Diálogos Comunitarios de cierre.

Al concluir esta validación, podríamos afirmar que fuimos testigos de la resignificación del impacto que puede tener la labor del Desminado Humanitario en la vida de la comunidad. Perigeo ahora está más presente en la vida de las personas de la vereda, los conocen, los esperan, y confían en ellos y ellas. La comunidad ahora conoce con mayor claridad el trabajo que este grupo de expertos realiza con los diferentes equipos técnicos que utilizan, ahora entienden el sentido de las carpas, de su presencia intermitente en la vereda etc. A partir de la participación de Perigeo en los Diálogos Comunitarios los habitantes de la vereda pudieron valorar el trabajo realizado meses atrás y el trabajo que van a realizar durante los siguientes cuatro meses. Ahora es claro para todas y todos que el equipo de Perigeo está encargado y comprometido con su labor para devolverles la tranquilidad y seguridad de transitar con confianza por sus caminos, disfrutar la belleza de sus paisajes y volver a cultivar sus tierras, en paz y en armonía con la Naturaleza. Por favor incluir testimonios de los beneficiarios, funcionarios de entidades que puedan dar cuenta del cambio en sus vidas a causa del proyecto o de sus opiniones generales sobre las actividades desarrolladas.

<sup>5</sup> Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas (VISIP), Estrategia de acompañamiento psicosocial comunitario en zonas afectadas por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explotar (MUSE) donde se implementan procesos de desaminado humanitario, Informe Local, María Carolina Nensthiel Orjuela – Consultora Nacional OIM y Luci Madroñero Andrade -Consultora Territorial OIM, enero 2019.

