



Titre du Projet : *Projet de réduction de la vulnérabilité des populations dans les cercles de Yélimané et de Nioro du Sahel Région de Kayes « WELETAARE ».*

Zones d'intervention : Communes de Diafounou Gory (Lee Hamet DIALLO, Lee Soninkés), Kremis (Senowaaly Diallo), Konsiga (Bediara), Cercle de Yélimané, et dans les communes de Diaye Coura (Mboya Kroumba), Gavinané (Diamera 2 et Diamera 3) Nioro Tougouné (Filfilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes

Domaine prioritaire du Plan Stratégique : le domaine de l'eau et le domaine de l'intensification de l'Agriculture et de l'élevage (sous-secteur élevage).

Produits du Plan Stratégique :

Produit 2.1. : Promotion de points d'eau modernes pour l'accès à l'eau potable des populations et leur cheptel.

Produit 4.2. : Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables (embouche ovine, caprine et transformation de la viande, maraîchage).

Nom du Soumissionnaire : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science A3 et la Culture (UNESCO)

Nom et titre du signataire : Edmond Moukala, Représentant, Chef de Bureau UNESCO Mali

Signature (Soumissionnaire) :

01/06/2021

Date/Mois/Année

The Diarra Lala Camara
Nom et titre du signataire du Fonds Climat Mali
Coordinatrice



03/06/2021

Date/Mois/Année



Période du programme : 01/01/ 2021 – 31/12/2023

Numéro du Programme : XXXXXXXX
Date de démarrage : 01/01/2021
Date de fin : 31/12/2023

Ressources totales requises

Ressources totales allouées : \$ 932 009

- Fonds Climat Mali : \$ 932 009
- Autres : 0

Description sommaire :

Les cercles de Yélimané et de Nioro du Sahel sont situés au Nord- Ouest de la région de Kayes. Ils sont considérés comme des zones d'une grande vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle selon le système d'alerte précoce (SAP) et des zones de convergence 2 selon l'AIC (fréquence combinée de sécheresse, inondation et érosion). La principale cause reste la dégradation du climat suite à l'insuffisance pluviométrique et à la mauvaise repartition de celle-ci, à la variation importante de la température, à l'évapotranspiration élevée.

L'action des déprédateurs (sautériaux, oiseaux granivores, chenilles etc.), le sous équipement des agriculteurs en charrue et charrette, intrant, la non-utilisation des semences améliorées, la méconnaissance des techniques de conservation de l'arachide et de niébé face aux attaques des insectes etc. constituent des contraintes pour l'accroissement de la production et de la productivité agricoles.

Enfin il convient de mentionner que dans cette zone ciblée par le projet, les femmes jouent un rôle prépondérant dans la survie de la famille. Mais comme on peut s'en douter ces femmes ne sont pas équipées ni pour la production, ni pour la transformation et n'ont aucune maîtrise du marché de leurs produits. Elles se déplacent sur de longues distances à la recherche de marchés pour vendre leurs produits de transformation ou d'artisanat ou les quelques kilogrammes d'arachide ou de niébé qu'elles ont récoltés sur leurs parcelles. Les femmes aussi perdent énormément de temps de travail à cause de la corvée quotidienne d'eau. Elles passent les deux tiers (2/3) de la nuit en saison sèche à la recherche de l'eau de boisson.

Ainsi, ce présent projet vise à réduire la vulnérabilité des populations des Communes de Diafounou Gory (Lee Hamet DIALLO, Lee Soninkés), Kremis (Senowaaly Diallo), Konsiga (Bediara), Cercle de Yélimané, et dans les communes de Diaye Coura (Mboya Kroumba), Gavinané (Diamera 2 et Diamera 3) Nioro Tougouné (Filfilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes face aux effets néfastes du changement climatique en apportant des solutions aux problèmes susmentionnés. Il contribuera à la création de meilleures conditions d'épanouissement socio-économique et culturelle des jeunes dans leurs propres milieux et à la lutte contre l'émigration clandestine.

Organisations / institutions participantes :

Nom de l'Organisation/Institution	Personne Contact et Adresse
Association pour l'Appui au Développement Global (ADG)	M. Abdoul Aziz Diallo, Bamako Hamdallaye ACI 2000 rue 331 porte 648 BP : 159 Tél. 66 78 43 52/91 01 57 41 Accord Cadre de Collaboration avec Le Gouvernement Du Mali N° 144/630 Du 17 Février 1992 E.mail : abdoulaziz_ml2@yahoo.fr



LETTRE DE SOUMISSION

Bamako, le 18/05/2021

À : Madame la Coordinatrice du Secrétariat Technique du Fonds Climat Mali,
Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AEDD)
Quartier du Fleuve – Rue 311 – Porte 328
BP 2357 – Bamako, Mali
Email : aedd@environnement.gov.ml

Madame,

Nous, soussignés, avons l'honneur de vous proposer nos services, à titre de soumissionnaire pour le *Projet de réduction de la vulnérabilité des populations dans les cercles de Yélimané et de Nioro du Sahel Région de Kayes « WELETAARE »*. Conformément à votre appel à proposition en date du 13/02/2020, nous vous soumettons par les présentes notre proposition, qui comprend :

- La présentation de notre Institution/Organisation
- La présentation du Programme
- Et les diverses annexes du Programme

Tout en espérant une suite positive à notre proposition, veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire : Edmond MOUKALIBI, représentant, Chef de Bureau Mali

Nom du soumissionnaire : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO)

Adresse : Hamdallaye ACI 2000 (derrière Hôtel Massaley) B.P.E 17 63 Bamako – Mali/ Tél : +223 20 23 34 92/93/ Fax : +223 20 23 34 94

Signatures des organisations et institutions participantes (y mettre cachet)

Nom de l'Organisation/Institution	Personne Contact et Adresse	Signatures et cachets
Association pour l'appui au Développement Global (ADG)	M. Abdoul Aziz Diallo, Hamdallaye ACI 2000 rue 331 porte 648 BP: 159 Tél. 66 78 43 52/91 01 57 41 Accord Cadre de Collaboration avec Le Gouvernement Du Mali N° 144/630 Du 17 Février 1992 E.mail : abdoulaziz_ml2@yahoo.fr	

PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION/INSTITUTION SOUMISSIONNAIRE :

Nom de l'Institution/organisation

Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture.

Nom, titre et Adresse de la Personne : Edmond MOUKALA, Représentant, Chef de Bureau Mali

Bureau de l'UNESCO à Bamako, Hamdallaye ACI 2000 (derrière Hôtel Massaley) B.P.E 17 63 Bamako – Mali/ Tél : +223 20 23 34 92/93/ Fax : +223 20 23 34 94

Brève présentation de l'institution /organisation

• Date de création

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies (ONU) créée le 16 novembre 1945. L'UNESCO est présent au Mali depuis 1998 et est actuellement dirigée par M. Edmond MOUKALA.

• Domaines d'intervention/types de prestations

La coopération politique et économique des gouvernements ne suffit pas à assurer l'adhésion durable et sincère des peuples. La paix doit être fondée sur le dialogue, la compréhension mutuelle ainsi que la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Dans cet esprit, l'UNESCO développe des outils éducatifs, culturels et scientifiques pour aider chaque individu à vivre en tant que citoyen du monde. L'UNESCO travaille pour que chaque enfant et chaque adulte ait accès à une éducation de qualité. L'UNESCO renforce les liens entre les Nations en promouvant le patrimoine culturel et l'égalité de toutes les cultures. L'UNESCO favorise les programmes et les politiques scientifiques qui sont des plateformes de développement et de coopération. L'UNESCO défend la liberté d'expression, un droit fondamental et une condition essentielle pour la démocratie et le développement. Servant de laboratoire d'idées, l'UNESCO aide les pays à adopter des normes internationales et gère des programmes qui favorisent la libre circulation des idées et le partage des connaissances. La vision fondatrice de l'UNESCO est née en réponse à une guerre mondiale marquée par des violences racistes et antisémites. 70 ans après et de nombreuses luttes de libération plus tard, le mandat de l'UNESCO est plus pertinent que jamais. La diversité culturelle est attaquée et de nouvelles formes d'intolérance, de rejet des faits scientifiques et de menaces à la liberté d'expression menacent la paix et les droits humains. Le devoir de l'UNESCO est de réaffirmer les missions humanistes de l'éducation, de la science et de la culture.

• Projets et programmes réalisés en lien avec le domaine prioritaire ciblé

L'UNESCO, à travers le Secteur Sciences Exactes et Naturelles intervient dans deux grands programmes : Le Programme sur l'Homme et la Biosphère (MAB) et le Programme Hydrologique International (PHI), et plus particulièrement dans la région via les actions suivantes : 1) Programme Régional UNESCO/MAB-PNUE/FEM sur le Renforcement des capacités scientifiques et techniques pour une gestion efficace et une utilisation durable de la diversité biologique dans les réserves de biosphère des zones arides et semi arides d'Afrique de l'Ouest ; 2) Projet d'amélioration du système traditionnel d'information des communautés de base pour un accès durable aux ressources naturelles (agro-sylvo-pastorales) ; 3) Projet de mise en place d'un suivi écologique participatif de la biodiversité de la réserve de biosphère de la boucle de Baoulé au Mali ; 4) Jeunesse et biodiversité au Mali : la responsabilité des jeunes dans la gestion de la biodiversité locale dans le village de Tienfala ; 5) Le projet « Niger-Loire : Gouvernance et Culture » s'inscrit dans les efforts de sauvegarde du fleuve Niger ; 6) Projet de la « Troisième école régionale d'énergie solaire pour les pays francophones d'Afrique » ; et 7) Projet de Renforcement de la Résilience du Système Éducatif comme alternative de Prévention et de Lutte contre les Changements Climatiques à Bandiagara, Bankass, Kati et Kita.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME:

1. Analyse de la situation:

▪ Zones d'intervention:

La région de Kayes avec une superficie de 120.760 Km², est située à l'Ouest du pays aux frontières avec la République du Sénégal, la République de Guinée - Conakry et la République Islamique de Mauritanie. La population de la région est estimée en 2020 à 2.896.978 habitants (source, Cadre Harmonisé. Manuel 2.0). La région est divisée administrativement en 7 cercles : Bafoulabé, Diéma, Kayes, Kéniéba, Kita, Nioro, Yélimané. En 2021 il convient de noter que la région Nioro du Sahel nouvellement créée est en phase d'opérationnalisation. Plusieurs fleuves et rivières traversent la région : le Baoulé, le Bafing et le Bakoy qui se rejoignent à Bafoulabé pour former le Sénégal. Dans la région se trouvent les chutes du Félou (à 17 km de Kayes), les chutes de Gouina (à 82 km au sud est de Kayes sur le fleuve Sénégal), le lac Magui et le lac Doro. À la frontière guinéenne, le climat est assez humide. En remontant vers le nord, on traverse une zone soudanienne puis on arrive à une zone sahélienne. La partie Nord de la région connaît des températures très élevées, faisant d'elle l'une des régions les plus chaudes du Mali.

Le projet sera mis en œuvre dans les cercles de Nioro du Sahel et de Yélimané dans la région de Kayes.

Le cadre physique : est constitué par le massif Sarakolé formé de schistes d'âge primaire sur lesquels sont venus se poser des épanchements doléritiques. Des collines gréseuses dominent le paysage. Dans la partie nord de la zone, le massif s'abaisse et est recouvert de formations sablonneuses quaternaires provenant de l'Erg de Wagadou. Le massif est partout entaillé par des cuvettes se présentant sous forme de bas-fonds ou de dépressions à écoulement endoréique où le drainage se fait vers les mares intérieures du Kaarta ou vers les fleuves Sénégal et Kolimbiné (partie sud de la zone). **Le Climat** est de type sahélien caractérisé par l'alternance d'une courte saison de pluies de juillet à octobre et d'une longue saison sèche de novembre à juin. La pluviométrie est comprise entre 350 et 550 mm de pluies par an. Les températures moyennes annuelles oscillent autour de 28° C et l'évapotranspiration moyenne annuelle varie de 2500 à 2750 mm. La recharge des nappes phréatiques peu profondes peut être problématique. Elle est fonction des pluies d'hivernage. **Les sols** sont pour la plupart particulièrement pauvres en azote et en phosphore, structurellement fragiles et ont une faible teneur en humus et une capacité de rétention d'eau réduite. **La végétation** est celle de la steppe à formations épineuses à prédominance d'acacia SPP, de balanites et de zizyphus zizuba. **La population** de la zone est estimée à environ 700 000 habitants constitués en majorité de Bambaras, Peul, Soninké, Diawambés, Maures vivant dans des villages et des hameaux. **L'agriculture** est comme indiquée plus haut est la principale activité. Elle est avant tout une activité d'autosuffisance et de subsistance en majeure partie pluviale et de type extensif. Les contraintes de cette agriculture sont diverses : insuffisance et irrégularité de la pluviométrie, pauvreté des sols aggravée par un déséquilibre écologique qui a entraîné la dégradation du couvert végétal, faiblesse de la productivité, cultures extensives itinérantes, maladies phytosanitaires et actions des prédateurs, exode rural des jeunes qui prive certaines familles de bras valides pour les travaux agricoles. **L'élevage** est très développé dans la zone. Il est sédentaire chez les Soninkés et les Bambaras et transhumant chez les peuls et les Maures.

1. **Nioro du Sahel** : Le cercle de Nioro du Sahel est une collectivité territoriale du Mali dans la région de Kayes. Il compte 16 communes : Baniré Koré, Diabigué, Diarra, Diaye Coura, Gavinané, Gogui, Guétéma, Gadiaba Kadiel, Koréra Koré, Nioro du Sahel, Nioro Tougouné Rangabé, Sandaré, Simbi, Troungoumbé, Yérééré et Youri.


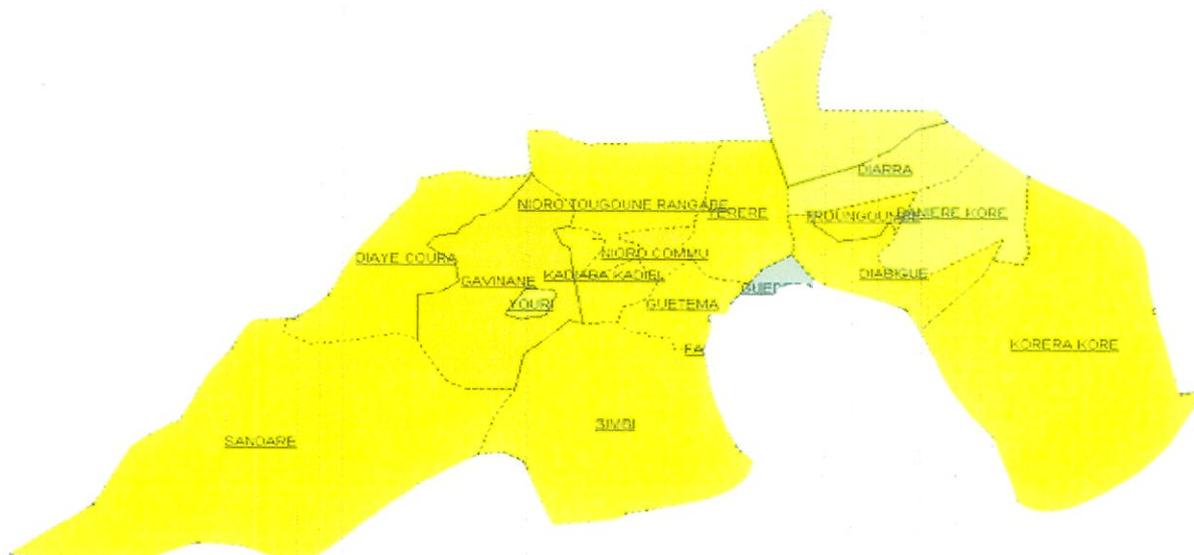


Figure 1. Carte du Cercle de Nioro du Sahel

2. **Yélimané** : Le cercle de Yélimané compte 12 communes dont 1 Urbaine : (Guidimé, Gory, Diongaga, Krémis, Fanga, Soumpou, Konsiga, Kirané, Marekafo, Tringa, Kaniaga) et une urbaine : Toya.

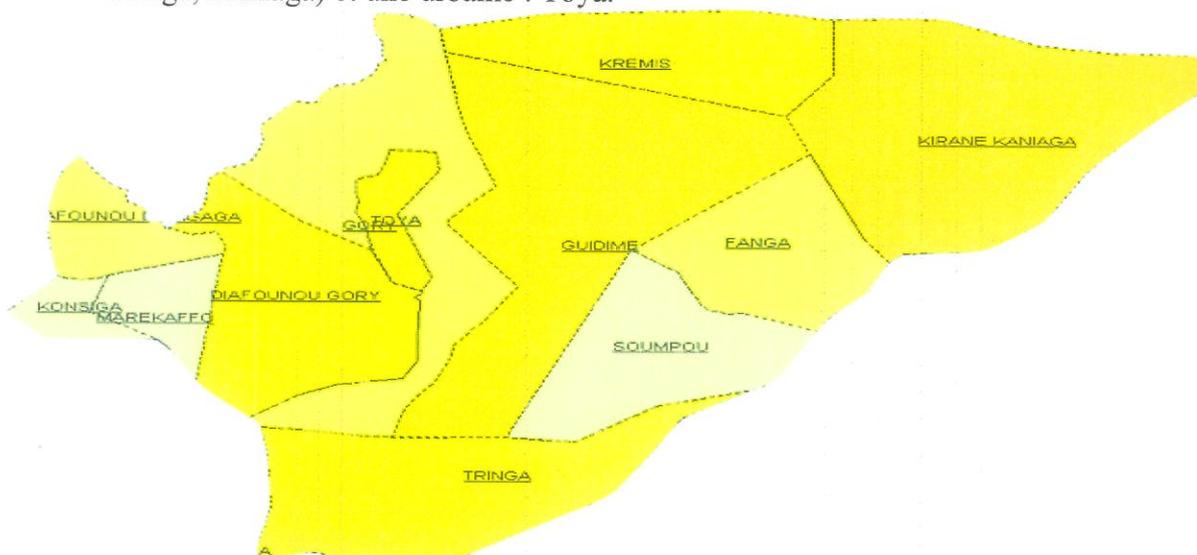

▪ **Problèmes à résoudre et défis à relever :**

Dans le cadre de l'agriculture, l'action des prédateurs (sautériaux, oiseaux granivores, chenilles etc.), le sous équipement des agriculteurs en charrue et charrette, intrant, la non utilisation des semences améliorées, la méconnaissance des techniques de conservation de l'arachide et de niébé face aux attaques des insectes etc. constituent des contraintes pour l'accroissement de la production et de la productivité agricoles. Le maraîchage est pratiqué de façon artisanale avec un faible rendement.

Les contraintes liées à l'élevage sont : l'insuffisance de pâturage, la mauvaise gestion des espaces, l'insuffisance de la couverture sanitaire animale.

Tous ces moyens de subsistance des populations sont impactés négativement par les changements climatiques compromettant l'existence des communautés.

Le grand éloignement des grandes villes et des grands axes routiers ont fait que les innovations économiques et sociales, ainsi que les changements de comportements se mettent difficilement en place malgré le courant des migrations temporaires vers les villes africaines et européennes.

Ainsi, le présent projet est initié pour apporter des solutions aux problèmes ci-dessus mentionnés.

▪ **Interventions en cours / prévus :**

▫ **Interventions en cours :**

Dans la zone d'intervention, les interventions en cours sont :

- Appui Conseil Aménagement et Equipement Rural, Appui à la Réglementation et au Contrôle, Appui Conseil, Education, Protection de l'Environnement, Santé Humaine (ADG - Services techniques de l'Etat) ;
- Santé, Education (ADG – UNICEF, ADG - MEDIK) ;
- Formation, alphabétisation, maraîchage, hydraulique, aménagement, structuration et redynamisation des organisations paysannes, hygiène- assainissement, etc. (ADG) ;
- Sécurité alimentaire (ADG-PAM-CSA) ;
- Protection Environnement (ADG – AEDD)
- Filets Sociaux (ADG-Jigisemejiri)

▫ **Interventions prévues dans le cadre du présent projet :**

Les futures actions seront axées sur :

- L'adaptation au changement climatique à travers :
 - L'adduction d'eau potable,
 - L'intensification de l'élevage (embouche de petits ruminants)
 - L'intensification de l'agriculture (réalisation mini fermes). Au vu des expériences passées, mise en place de systèmes de production durable et innovante en vue d'une large diffusion au niveau cercle.

▪ **Valeur ajoutée de la proposition :**

La valeur ajoutée de la proposition est surtout l'innovation des actions à mener et la mise à l'échelle de l'intervention. Le maraîchage mené de façon traditionnelle sera modernisé professionnalisé et diversifié avec des installations modernes.

2. Logique et cadre de résultats du Programme :

▫ **Objectifs et résultats attendus :**

- **Objectif global :** Contribuer à réduire la vulnérabilité des populations des Communes de Diafounou Gory (Lee Hamet DIALLO, Lee Soninkés), Kremis (Senowaaly Diallo), Konsiga (Bediara), Cercle de Yélmáné, et dans les communes de Diaye Coura (Mboya Kroumba), Gavinané (Diamera 2 et Diamera 3) Nioro Tougouné (Filfilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes

▪ **Objectifs spécifiques et résultats attendus :**

Objectif Spécifique 1 : Faciliter l'accès des populations à l'eau potable à travers la création de points d'eau modernes dans les Communes de Diafounou Gory (Lee Hamet DIALLO, Lee Soninkés), Kremis (Senowaaly Diallo), Konsiga (Bediara), Cercle de

Yélimané, et dans les communes de Diaye Coura (Mboya Kroumba), Gavinané (Diamera 2 et Diamera3) Nioro Tougouné (Filfilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes.

Résultat attendu 1.1 : Huit (8) villages ne disposent de points d'eau modernes pour l'alimentation de la population et du cheptel.

Objectif Spécifique 2 : Diversifier les sources de revenus des femmes et des jeunes afin de renforcer leur résilience socioéconomique ;

Résultat attendu 2.1 : Les femmes et les jeunes ont accès à diverses sources de revenus stables à travers les activités de maraîchage, de pisciculture, d'aviculture, d'apiculture et d'arboriculture dans des mini fermes modernes et la conduite d'activités innovantes d'élevage dans huit (8) villages des cercles de Nioro du Sahel et de Yélimané.

▪ **Produits et activités :**

Au Mali nous savons que les trois quarts de la population vivent en zone rurale. L'économie malienne est dépendante de la performance du secteur agricole qui est le premier secteur d'activité des femmes, présentes tout au long de la chaîne agricole. Néanmoins, dans la zone du projet comme partout ailleurs au Mali les inégalités persistent, notamment entre ce qui concerne l'accès à la terre, aux ressources productives (équipement agricole) et au crédit.

Le présent projet en contribuant à l'allègement des tâches domestiques, à la fourniture de parcelles sécurisées, à la formation et à une bonne organisation collective, à la mobilisation et à la participation consciente et voulue des femmes des sites concernées créera les conditions du changement social recherchés en vue d'une meilleure égalité de genre qui permettent de satisfaire les besoins pratiques et des intérêts stratégiques, qui peuvent être différents pour les hommes et pour les femmes.

Grâce à l'appui que fournira le projet aux femmes, elles vont améliorer la qualité de leur production et renforcer leur pouvoir de négociation avec les hommes de leur communauté, au sein de leur famille et dans leur environnement économique.

Objectif Spécifique 1 : Faciliter l'accès des populations à l'eau potable à travers la création de points d'eau modernes dans les Communes des populations des Communes de Diafounou Gory (Leyya Hamet DIALLO, Leyya Soninkés), Krémis (Senowaly Diallo), Konsiga (Bediara) dans le cercle de Yélimané et dans les communes de Diaye Coura (Mboya Kroumba), Gavinané (Diamera 2 et 3) et Nioro Tougouné (Filfilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes.

- **Résultat attendu 1.1:** Huit (8) villages ne disposent de points d'eau modernes pour l'alimentation de la population.
- **Produit 1.1.1: Promotion de points d'eau modernes pour l'accès des populations et leur cheptel à l'eau potable.**

- **Activité 1.1.1.1: Réalisation de huit (8) nouveaux forages dans 8 villages de trois (3) Communes de Yélimané et trois (3) communes de Nioro du Sahel.**

L'ONG ADG va recruter un bureau d'études spécialisé qui va réaliser les études géophysiques (qui mesurent la conductivité du sous-sol par sondages électriques) sur les sites concernés. Ces mesures permettent de reconnaître les localisations les plus favorables où trouver de l'eau et ainsi éviter des forages négatifs. Ces études hydrogéologiques permettront de situer deux ou trois emplacements possibles pour le futur forage. Le choix final sera fait en concertation entre les techniciens, ADG et le village. Alors les travaux de forages seront exécutés. Chaque forage sera doté d'un système de pompe solaire muni de panneaux et de

batteries et doté d'un château d'eau de 5000 m³. Afin de consolider l'ouvrage, chaque forage sera équipé d'une margelle en béton et le pourtour de la margelle sera recouvert avec de la latérite. Il sera aussi construit à proximité un canal d'évacuation, avec un puits perdu à son extrémité. Ceci permettra d'éviter la constitution d'un bourbier, parfois à l'origine de la contamination des nappes par infiltration des eaux usées dans le sol. Enfin il sera mis en place une aire de protection du forage pour éviter que les animaux ne passent trop près du forage et, par leurs déjections et piétinements, ne polluent l'aquifère auquel le forage s'alimente. En outre il sera installé 16 bornes fontaines à raison de bornes publiques par village

▫ **Activité 1.1.1.2: Organisation de 72 séances d'information et de sensibilisation à l'intention des habitants des 8 villages.**

Dans les villages cibles ADG réalisera 72 séances de sensibilisation à raison de deux séances par mois et par villages. L'objectif étant d'atteindre non seulement tous les usagers des réalisations mais aussi surtout 100% des jeunes hommes et des jeunes femmes conformément à la stratégie de la communication pour le développement C4D. En outre il sera organisé des rencontres communautaires en y associant tous les leaders communautaires et coutumiers pour informer sur les stratégies utilisées par les djihadistes et empêcher les jeunes de se joindre à eux et aux communautés de leur apporter un soutien même passif. ADG s'appuiera sur la capitalisation de sa longue expérience et de sa connaissance des hommes et du terrain.

▫ **Activité 1.1.1.3 : mise en place de comité de gestion de points d'eau**

Dès le début des activités, il sera mis en place un comité villageois de gestion du point d'eau constitué à majorité de femmes (50%) qui sera chargé du suivi des travaux et de l'élaboration du règlement de l'eau. Les femmes participeront aux prises de décisions, au contrôle des ressources et à l'entretien des forages. En outre dans chaque village deux (2) réparateurs villageois seront formés dont une femme hygiéniste qui organise les groupes de femmes qui doivent nettoyer le point d'eau à tour de rôle. Au total huit (8) points d'eau modernes seront créés dans les villages de Leyya Hamet DIALLO, Leyya Soninkés (commune de Diafounou Gory), village de Senowaly Diallo (commune de Krémis) village de Bediara (commune de Konsiga) dans le cercle de Yélimané et dans les villages de Mboya Kroumba (commune de Diaye Coura) villages de Diamera 1 et Diamera 2 (Commune de Gavinané) et village de Filfilodé (commune de Nioro Tougouné) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes.

Objectif Spécifique 2 : Diversifier les sources de revenus des femmes et des jeunes afin de renforcer leur résilience socioéconomique.

Résultat attendu 2.1 : Les femmes et les jeunes ont accès à diverses sources de revenus stables à travers le maraîchage dans des périmètres maraîchers modernes et la conduite d'activités innovantes d'élevage dans huit (8) villages.

▫ **Produit 2.1.1: Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables (les femmes et les jeunes).**

▫ **Activité 2.1.1.1: Aménagement de 8 mini fermes de 6 ha chacune dans 8 villages de trois (3) communes de Yélimané et de trois (3) communes de Nioro du Sahel.**

Pendant le processus d'identification des sites des mini fermes, des parcelles ont été identifiées dans les villages de Leyya Hamet DIALLO, Leyya Soninkés (commune de

Diafounou Gory), village de Senowaaly Diallo (commune de Krémis) village de Bediara (commune de Konsiga) dans le cercle de Yélimané et dans les villages de Mboya Kroumba (commune de Diaye Coura) villages de Diamera 2 et Diamera 3 (Commune de Gavinané) et village de Filfilodé (commune de Nioro Tougouné) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes avec l'appui des acteurs locaux. Dans le choix des villages et des parcelles, nous avons considéré un certain nombre de facteurs et d'atouts pour renforcer l'efficacité de l'action. Il s'agit du fait que:

- Les interventions sont basées sur les zones des moyens de subsistance, les pratiques d'utilisation des terres, les interactions sociales (par exemple, les agriculteurs, les éleveurs transhumants, les éleveurs sédentaires utilisent tous une même ressource) et répondent aux besoins immédiats pour des causes alimentaires et profondes de l'insécurité alimentaire ;
- La présence récurrente des jeunes armés et circulant à moto dans ces zones ;
- Les activités ont été identifiées par les communautés elles-mêmes par un processus participatif. Les communautés décident de ce dont elles ont besoin, et en élaborant un Plan Communautaire Participatif (PCP). La planification participative se fait dans toutes les communautés et implique les membres de la communauté, les agents des services techniques et d'autres partenaires.
- Les études de base, études complémentaires et des études de suivi sont faites, des indicateurs permettent d'évaluer le niveau de développement des communautés et des ménages,
- L'approche intégrée, est privilégiée, c'est-à-dire faire sur un même site diverses activités (telles que la lutte antiérosive, la collecte et la conservation de l'eau, le reboisement, le jardinage, la pisciculture, l'aviculture, l'apiculture et la formation en tenant compte du calendrier saisonnier,
- Enfin le projet travaillera à ce que tous les changements de pratiques qui seront induits par les aménagements (nouvelles variétés, techniques de gestion, divers apprentissages, insertion du bas-fond dans les stratégies paysannes locales et éventuellement changements itinéraires techniques etc.) soient maîtrisés par l'appui conseil. Les bénéficiaires qui sont actuellement très motivés doivent s'approprier dès maintenant l'entretien des ouvrages créés.

La stratégie de mise en œuvre de cette activité dans le court et moyen terme est définie comme suit pour optimiser les productions et les rendements :

Notons d'ores et déjà afin d'assurer une bonne réussite des activités et éviter tout problème foncier l'équipe de ADG dans la préparation du projet a visité tous les villages, discuter avec les autorités coutumières, les femmes, les jeunes et les services techniques présents pour expliquer le projet et identifier le site de chaque actif à créer.

L'ossature de l'activité au niveau du village sera **la ferme pilote au sein et autour de laquelle les activités seront réalisées** soit par les communautés elles-mêmes soit par des prestataires sous la supervision et l'encadrement de l'équipe ADG et des services techniques locaux

Chaque mini ferme sera exploitée par les femmes surtout les jeunes des villages cibles inactifs pendant une bonne partie de l'année, mais engagés et très motivés par cette possibilité d'améliorer leur situation. La ferme intégrera, par village :

- **Un périmètre de 3 ha doté de forage équipé d'une pompe solaire et d'un château d'eau de 5000 m³ et de six (6) bassins de stockage d'eau 6mx2mx1m** : les travaux du périmètre

vont consister sur le site attribué au nettoyage et à l'acquisition du grillage 25mx 1,5m, des cornières 50, des fils de fer galva., des tendeurs et des fils de fer d'attache. Pour les travaux d'études géophysiques et de forage des prestataires privés seront recrutés sur la base d'un appel d'offres restreint. Concernant les travaux d'aménagement ils seront effectués par les bénéficiaires encadrés par le personnel d'ADG et des services techniques locaux. Ces travaux d'aménagement consistent, après l'installation du forage, à la création des différentes parcelles notamment la **parcelle destinée au maraîchage (2ha)** sur laquelle des planches seront attribuées au Comité de Gestion Scolaire au profit de la cantine scolaire des écoles des villages cibles, l'aménagement des bassins de stockage d'eau 4mx2mx1m pour faciliter l'arrosage et de **six (6) étangs piscicoles** à raison de 2/ha de dimensions de de 800m² chacun pour l'élevage de tilapia par les groupes de jeunes organisés en GIE. La production de poisson permettra de diversifier l'alimentation de la population et d'augmenter les revenus économiques et la création d'emploi. Les étangs piscicoles recevront l'eau du château d'eau. Les cultures maraîchères et les productions halieutiques sont des sources importantes d'amélioration de la qualité nutritive des aliments. En outre, elles offrent une valeur ajoutée importante par l'amélioration des revenus des populations. Des pratiques durables seront privilégiées sur la ferme pilote, et des formations seront dispensées aux jeunes. Le périmètre maraîcher sera installé sera divisé en sous-parcelles pour chaque famille afin de mieux respecter les rotations selon les prévisions réalisées.

- Dans la zone contiguë au périmètre maraîcher il y aura **une parcelle de 2 ha destiné à l'arboricole (1,6)** clôturée avec du grillage et qui sera reboisée en essences économiques : moringa, henné, acacia senegal, le jujubier amélioré et le papayer solo. Le moringa, connu comme « arbre miracle », possède d'extraordinaires qualités nutritionnelles et des taux élevés de survie dans des climats extrêmes. La population locale connaît cet arbre sous le terme « nyébédaye », qui provient de l'expression anglaise « never die » (ne meurt jamais). Il est utilisé dans l'alimentation et la pharmacopée. La poudre de moringa, extraite des feuilles, contient plus de fer que les légumineuses, plus de vitamine A que les carottes et plus de potassium que les bananes, ainsi que de nombreux antioxydants et des protéines végétales. Quant à l'acacia senegal connu sous le nom de gommier est un arbuste de 4 à 6 m de hauteur adapté aux sols steppiques généralement pauvres en matières organiques et à une pluviométrie de 350 à 750 mm / an. Nous savons que dans cette zone la gomme arabique constituait avant la sécheresse persistante des dernières années, l'une des principales ressources de la zone qui était alors à la tête de la production et de la commercialisation nationales. Dans le cadre du présent projet les plants seront produits en pépinière. Les graines collectées par les populations, sont trempées puis semées dans des pots. Cette phase en pépinière dure de 4 à 5 mois environs. Ensuite les jeunes pousses sont plantées. A partir de 5 ans la gomme sera produite par saignée. Cette saignée consistera à détacher un morceau d'écorce sur une largeur de 30 cm et une longueur de 100 cm. Elle se fera de Décembre à Janvier. La récolte commencera alors trois semaines plus tard et se poursuivra jusqu'aux premières pluies. Notions que cette trace se cicatrisera avant la campagne suivante. Campagne au cours de laquelle la saignée se fait en sens opposé. Pendant toute cette période les résidus issus des tailles de forme sont utilisés pour l'alimentation des petits ruminants (agneaux et cabris). La gomme arabique récoltée (entre 5 et 7 tonnes) par saignée sera vendue

sur le marché régional et national. Les plants seront produits en pépinière par des pépiniéristes villageois formés. Dans cette parcelle il sera réalisé également quatre (4) bassins stockage d'eau reliés au forage pour l'approvisionnement en eau, et **une parcelle de 0,4 ha destinée à l'aviculture**. Dans la parcelle avicole il sera construit un bâtiment de 17 m x 10 m x 6 m. Ce bâtiment sera doté de 100 mangeoires, 100 abreuvoirs et un système d'éclairage nocturne (panneau solaire et des ampoules) et une maison de gardien. Il est prévu des rotations de 1000 poulets de chair par bande. Des opérations d'entretien et de nettoyage du poulailler seront effectuées après chaque cycle. Les aliments, les vaccins et tous les autres intrants seront assurés avec l'appui du projet. Des réunions de bilan périodique seront organisées par le comité de gestion du GIE et l'assistant technique en collaboration avec l'équipe du projet.

Toutes ces activités vont non seulement améliorer considérablement la situation alimentaire et nutritionnelle des communautés surtout des femmes en âge de procréer et des enfants de moins de 59 mois, mais aussi et surtout fournir des revenus substantiels aux bénéficiaires des jeunes femmes et jeunes hommes.

- **Activité 2.1.1.2 Formation de 400 maraîchers (240 femmes et 160 jeunes) de 8 groupements de producteurs/productrices de 8 villages de 3 communes de Yélimané et 3 communes de Niore du Sahel :**

La véritable appropriation du projet exige une bonne maîtrise de chaque volet de travail. Pour cela, un mécanisme de renforcement des capacités des acteurs sous forme de sessions de formation pratiques et théoriques seront organisées.

Dans le cadre du renforcement des capacités plusieurs modules de formation seront dispensés aux bénéficiaires des activités ci-dessus.

À la fin de la formation, les modules seront compilés et remis aux participants pour faciliter la diffusion au sein de leur organisation.

Une formation sur les techniques de reboisement et d'entretien des différentes essences économiques seront organisées.

- **Activité 2.1.1.3 : Dotation en petits ruminant de 400 éleveurs (240 femmes et 160 jeunes) de 8 groupements d'éleveurs de 8 villages de 3 communes de Yélimané et 2 communes de Niore du Sahel.**

Pour la mise en œuvre de ces activités d'Activités Génératrices de Revenus (AGR) il prévu d'appuyer 400 éleveurs (240 femmes et 160 jeunes). Nous savons que l'exportation du bétail génère des revenus importants pour les professionnels de la filière et des devises pour l'Etat. Les actions d'amélioration de la productivité et de la compétitivité (qualité et prix) du bétail et de la viande passent nécessairement par la promotion de l'embouche. Il s'agira dans le cadre du présent projet de permettre aux producteurs/productrices d'acquérir de bonnes pratiques d'embouche, en renforçant leurs compétences technicoéconomiques et managériales. Pour cette activité comme pour toutes les activités de ADG une étude sera menée pour évaluer les impacts environnements et proposer des solutions d'atténuation.

- **Activité 2.1.1.4 : Formation en techniques modernes d'embouche de 400 éleveurs (240 femmes et 160 jeunes) de 8 groupements d'éleveurs de 8 villages de 3 communes de Yélimané et 3 communes de Nioro du Sahel.**

Les bénéficiaires seront tous formés en techniques modernes d'embouche. Des sessions théoriques et pratiques seront organisées dans tous les villages. À la fin de la formation, les modules seront compilés et remis aux participants pour faciliter la diffusion au sein de leur organisation.

□ Efficacité des activités proposées:

L'efficacité des activités proposées se démontre à travers leur impact sur la satisfaction des besoins et la résolution des problèmes de l'insuffisance des ressources en eau et la faiblesse des systèmes de productions et de la faiblesse voire l'absence de revenus qui est la résultante de la rareté de l'emploi et de la faiblesse des rémunérations constatés auxquelles les populations surtout les couches vulnérables (les femmes et les jeunes) sont confrontées dans les 3 communes cibles de Yélimané et 3 communes de Nioro du Sahel. Aussi, elles permettront d'assurer une bonne nutrition des populations et renforcer la sécurité alimentaire dans les villages des communes concernées. Dans le choix et la mise en œuvre des activités, l'implication de la population et de tous les acteurs à la base est primordiale et les organes de gestion villageois créés soient opérationnels. Aussi, à cela il convient d'ajouter les expériences et compétences de l'ONG ADG dans le domaine du renforcement de la résilience des communautés face aux divers chocs et aux effets des changements climatiques depuis déjà plusieurs années.

□ Bénéficiaires et modalités de participation :

Les bénéficiaires du projet sont les populations vulnérables (hommes, femmes et jeunes) de 3 Communes du cercle de Yélimané et de 3 communes de Nioro du Sahel. Les bénéficiaires majoritairement des femmes, ont été impliquées depuis la conception du projet et participeront à la mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités par des efforts physiques à travers des comités de gestion mis en place à cet effet. Ces organes de gestion villageois constituent des structures pérennes et d'appropriation des acquis du projet par les communautés et continueront les activités quand le projet arrivera à terme. Par ailleurs, les Collectivités Territoriales et les autres décideurs au niveau local seront pleinement impliqués dans la mise en œuvre du projet, à travers des missions conjointes, des ateliers et autres activités d'information et de sensibilisation.

3. Pérennité, Complémentarité et Risques du Projet :

▫ Pérennité des interventions prévues:

Toutes les activités qui seront menées dans le cadre du présent projet visent la pérennité à travers l'appropriation des mesures par les acteurs locaux formés. Le projet mettra un accent particulier sur le transfert des connaissances, le renforcement des capacités de gestion des acteurs locaux et sur la mobilisation des ressources endogènes des communes et des communautés, justement dans l'optique de réduire leur dépendance des sources financières externes et de renforcer leur autonomie. Aussi les organes de gestion villageois mis en place constituent des structures pérennes et d'appropriation des acquis du projet par les communautés et continueront les activités quand le projet arrivera à terme.

W

Quant à la durabilité des ouvrages réalisés (les équipements d'adduction d'eau et des mini-fermes villageoises) une cotisation sera instaurée pour tous les usagers de ces ouvrages en vue d'assurer leur maintenance et entretien réguliers.

Les activités du projet sont issues du PDESC et du PSA des six (6) communes concernées par le projet dans les Cercles de Yélimané et de Nioro du Sahel et s'alignent parfaitement sur la politique et stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, ceux-ci amènent les autorités communales à plus d'investigation pour le suivi et la mobilisation des ressources afin de renforcer les acquis du projet. L'implication effective des autorités, des services techniques déconcentrés de l'Etat, et des populations dans tout le processus du projet est un élément clé de la pérennité des interventions prévues.

▪ **Stratégie de mise à l'échelle :**

La réplique des acquis du projet auprès d'autres bénéficiaires et dans d'autres localités sera effectuée sur la base de leur capitalisation à travers des rapports, des fiches techniques, des prospectus, des bulletins, des prises de photos et de réalisation de film sur CD-Rom ou sur Clé USB et leur diffusion à travers divers canaux de communication (cadres de concertation, ateliers, émissions radiophoniques, etc.). Un chargé de communication a été recruté dans le cadre du projet. En outre pour réussir cette capitalisation des ateliers seront tenus. Aussi, la collaboration entre les services de l'encadrement et l'ONG ADG facilitera la vulgarisation des acquis du projet à une échelle plus grande.

▪ **Complémentarités avec les projets/programmes existant et potentialités catalytiques des financements :**

Des synergies d'actions, le projet renforcera les acquis du PGRNCC (un projet déjà exécuté dans la zone par l'AEDD, sur financement Banque mondiale) à travers des activités Génératrices de Revenus (AGR). Aussi, une synergie sera établie d'autres acteurs au développement œuvrant dans les Cercles de Yélimané et de Nioro du Sahel.

Dans le cadre de la mobilisation d'autres financements, d'autres partenaires seront approchés pour renforcer les activités entreprises en faveur des couches vulnérables.

▪ **Risques du Projet:**

Les risques sont:

- Catastrophes naturelles,
- Insécurité / conflits.

Les risques (non adhésion, crises sociales, politiques, environnementales) seront gérés par l'information et la sensibilisation des acteurs et l'adaptation des activités au contexte et, si besoin en est et en consultation préalable avec tous les acteurs du projet.

4. Modalités de mise en œuvre :

L'ensemble du processus sera piloté, administré et supervisé par l'UNESCO qui est le répondant institutionnel devant le fonds climat Mali, responsable de la gestion technique et financière du projet. L'UNESCO sera chargée du suivi, l'orientation et la gestion financière du programme et désignera une équipe de gestion du projet en son sein. Elle effectuera des missions de supervision, afin de : i) s'assurer de la bonne mise œuvre des activités planifiées ; ii) faire des suggestions /recommandations en vue de corriger les imperfections , iii) s'assurer de la bonne visibilité/communication des actions du Projet.

D'une part, un accord de financement sera conclu entre l'UNESCO et le Fonds Climat Mali ; d'autre part, une convention de gestion du fonds et de mise en œuvre des activités du projet sera conclue entre l'UNESCO et l'ONG ADG définissant les rôles et les responsabilités de chaque structure.

W

Par ailleurs l'Association pour l'appui au Développement Global (ADG), qui est bien familiarisée avec les spécificités de la zone d'intervention et bien ancrée en milieu rural mènera, en partenariat avec les services techniques, les conseils communaux et les légitimités villageoises, la planification/programmation des activités, le développement des stratégies et outils. ADG assurera la mise en œuvre des activités terrain du projet. L'ADG mettra à la disposition du projet ses agents qui répondent aux profils recherchés, mènera des concertations étroites avec les partenaires et acteurs locaux concernés et représentera le Projet au niveau régional et local. Elle mènera la formation des organisations paysannes. Le Président de l'ADG, le superviseur régional ADG à Kayes en relation avec l'UNESCO coordonneront les activités inscrites au Projet. Ils apporteront toute l'assistance technique requise aux équipes terrain à travers des missions d'appui régulières.

Les déplacements du Président ADG, de l'UNESCO et du superviseur d'ADG dans le cadre du projet seront pris en charge.

Equipe projet ADG : Une équipe projet composée d'un coordinateur chargé de Projet, un chargé de Communication et des animateurs assurera la mise en œuvre des activités. Un animateur sera affecté à chaque commune. L'équipe sera appuyée dans ses tâches par des personnes ressources et des consultants. **Le Coordinateur** s'occupera de la gestion d'ensemble des activités terrain et de la production des Rapports et assurera en relation avec le chargé de projet du partenaire et de la direction d'ADG le suivi des indicateurs du projet afin de pouvoir mesurer l'impact du projet. Il fournit aux animateurs/animatrices les conseils et orientations nécessaires pour la mise en œuvre des plans de travail périodiques. Il organise les rencontres périodiques avec les comités communaux et villageois pour préparer la planification des activités dans la Commune. **Le Chargé de communication** sera chargé d'élaborer et mettre en œuvre un Plan de communication afin de relayer auprès de l'ensemble des collaborateurs les stratégies, innovations et autres informations concernant le projet, afin de promouvoir l'image, les valeurs et les impacts du projet en étroite collaboration avec les partenaires et la Direction de ADG. Ils définissent ensemble les grands axes de communication en parallèle, il s'occupe de l'élaboration et ou de la diffusion des supports (affiches, plaquettes, brochures etc) et de la mise à jour de l'intranet régulièrement. **Les animateurs/animatrices** seront chargés de la mise en œuvre quotidienne des activités dans les Communes et les villages : animation, formation, structuration et mobilisation des communautés à travers un encadrement de proximité. Ils collaborent directement avec les responsables communaux et villageois et s'assurent du respect des calendriers d'exécution des activités dans les villages. Ils rendent compte à travers l'élaboration et la transmission des rapports d'activités mensuels au Coordinateur.

Le projet utilisera à temps partiel (25%) le Comptable de ADG pour la gestion financière du projet. Un chauffeur sera recruté à temps plein.

Le Projet sera doté d'un nouveau véhicule tout-terrain (de préférence un pick-up) et de 6 motos ainsi que quatre (4) ordinateurs portables et une photocopieuse avec fonction de scanner

- **Formation / Mise à niveau de l'équipe :** Au démarrage du projet un atelier de formation et de mise à niveau de 5 jours sera organisé à Nioro. Cette formation permettra à l'équipe d'acquérir toutes les compétences pour accomplir leur mission d'accompagnement et d'encadrement des bénéficiaires. Elle s'appropriera de toutes les notions de changement climatique et sur les objectifs, les résultats, les activités, les cibles et la stratégie

d'intervention du projet. Le personnel d'appui et les représentants des villages (5 par village) participeront à cette session de formation, ainsi que l'UNESCO.

▪ **Responsabilité d'ADG et transparence:**

L'ONG ADG est responsable de la mise en œuvre des activités du projet. Elle justifie les fonds mis à sa disposition conformément aux modalités du partenaire. L'UNESCO effectuera des suivis de la mise en œuvre des activités sur terrain.

Plan de suivi évaluation et de communication :

▪ **La Communication :**

Un plan de communication sera élaboré pour la bonne diffusion des informations. Ce plan contiendra des thèmes, des messages, des périodicités de diffusion, les canaux et supports de diffusion et les personnes responsables. Les principaux canaux de diffusion sont les médias, l'Internet, les campagnes d'information-sensibilisation et la participation aux ateliers.

▪ **Le suivi et l'évaluation :**

La Direction de l'ONG ADG effectuera le suivi de la mise en œuvre des activités suivant un plan de suivi établi à cet effet. Le suivi de la Direction de l'ONG sera mensuel. Pour ce faire le Président de ADG responsable national du projet pour ADG aura la tâche de modérer une planification opérationnelle dès le début du projet. Le PO élaboré sera présenté aux principaux acteurs et partenaires dans les deux cercles pour concertation et harmonisation des interventions (à cette occasion, le Projet pourra être lancé officiellement). Ensuite, les plans d'actions périodiques seront établis. Le système de S&E qui sera mis en place sera léger, non coûteux et participatif dans la mesure où à plusieurs occasions, les groupes cibles pourront donner leurs avis sur l'avancement du projet et l'atteinte des résultats et impacts (collecte de données qualitatives lors des auto-évaluations annuelles assistées). Le système de S&E permettra au projet de mesurer l'avancement des principales réalisations, l'évolution des résultats définis et le niveau d'atteinte des effets et impacts escomptés et, par conséquent, de prendre - si nécessaire - des mesures correctives à temps.

La Direction de l'ONG ADG effectuera le suivi de la mise en œuvre des activités suivant un plan de suivi établi à cet effet. Le suivi de la Direction de l'ONG sera mensuel. L'UNESCO effectuera des missions de suivi périodiques des activités sur terrain par semestre et par an.

L'évaluation sera assurée par l'UNESCO et le Fonds Climat Mali.

Il sera réalisé des visites conjointes (ONG ADG-UNESCO) et des visites conjointes (Fonds Climat – ONG ADG – UNESCO) selon un calendrier préétabli par les trois (3) structures.

▪ **Plan de travail :**

Chaque année, l'ONG ADG élaborera un plan de travail annuel qui sera soumis à l'UNESCO pour approbation. Après cette Approbation le plan sera décliné en plans mensuels et hebdomadaires de l'équipe.

▪ **Plan de suivi évaluation et de communication :**

Type d'activité de S&E	Partie responsable	Calendrier
Elaboration et signature contrat.	UNESCO – ADG	Premier mois du projet
Formation / mise à niveau de l'équipe projet.	ADG	Premier mois du projet
Lancement du projet	ADG	Premier mois du projet
Elaboration plan de travail annuel	ADG	Premier mois du projet.

		Annuellement.
Suivi des activités du projet.	ADG – UNESCO – Fonds climat Mali	Du début à la fin du projet
Rapportage	Coordinateur, animateurs, UNESCO	Mensuel, trimestriel, Semestriel.
Evaluation à mi-parcours	Fonds Climat, UNESCO, ADG, Consultants.	A partir du 18 ^{ème} mois après le démarrage du projet.
Évaluation finale	Fonds Climat, UNESCO, ADG, Consultants.	Fin du projet
Rapport de fin de projet	ADG/UNESCO	Fin du projet
Audit	UNESCO - Fonds climat.	A la fin du Projet
Visite des réalisations	UNESCO, ADG.	Semestriellement
Visites des réalisations	Fonds Climat, UNESCO, ADG	Annuellement
Ateliers de partage des résultats.	Fonds Climat, UNESCO, ADG.	Fin du projet

▪ **Rapportage:**

Les rapports d'activités et financiers seront produits par l'équipe en collaboration avec l'UNESCO et envoyés au Secrétariat du Fonds Climat

Chaque **trimestre un rapport narratif et financier** sera produit pour rendre compte du niveau d'exécution des activités. Il sera produit **03 rapports annuels** durant la période de mise en œuvre du projet. Chaque rapport fera ressortir les indicateurs de mesure de performance de la période concernée. En fin de projet, **une évaluation finale**, convenue d'accord partie, sera effectuée afin d'apprécier le niveau d'atteinte des objectifs/résultats du projet et de mesurer son impact sur les groupes cibles et leur environnement. Cela permettra de capitaliser les expériences acquises ainsi que les leçons qu'on aurait apprises dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet.

Annexes 1 :

Budget consolidé :

Budget par Catégories et Codes Économiques :

BUDGET DU PROGRAMME				
CATEGORIES HARMONISEES	MONTANT TOTAL (FCFA)	MONTANT TOTAL (US\$)	Org. Part. des N.U. ONG ADG	% du Budget
1. Frais liés aux effectifs et autres frais de personnel	88 110 000	160 346	-	17%
2. Fournitures, produits de base et matériaux	907 920	1 652	-	0,18%
3. Équipements, véhicules et mobilier, amortissement compris	25 000 000	45 496	-	5%
4. Services contractuels	338 849 846	616 651	-	66%
5. Voyages	8 700 000	15 833	-	2%
6. Contreparties des transferts et subventions	-	-	-	0,00%
7. Frais généraux de fonctionnement et autres frais directs	17 067 000	31 059	-	3%
Coûts totaux Org. Part. Des N.U	478 634 766	871 037	-	93%
8. Coûts d'appui indirects	33 504 434	60 973	-	7%
TOTAL Org. Part. Des N.U	512 139 200	932 009	-	100,00%
Code Économique / Mali (Trésor)	MONTANT TOTAL (FCFA)	MONTANT TOTAL (US\$)	Ministère / EN 1	
TOTAL Ministères / EN			0	
TOTAL GENERAL DU PROGRAMME	512 139 200	932 009		

Annexe 2

Dans le cadre de cette requête soumise pour financement au Fonds Climat Mali, chacune des Organisations Participantes des Nations-Unies, notamment l'UNESCO, dispose d'un fondement juridique certifiant les relations entre celles-ci et le Gouvernement de la République du Mali.

N°	Nom de l'Organisation	Nature du Fondement Juridique	Numéro du Fondement Juridique	Date d'Obtention du Fondement Juridique
1	Association pour l'appui au Développement Global (ADG)	Accord-cadre de collaboration avec le Gouvernement du Mali	Accord cadre N° 144/630	17 Février 1992

En cas de Protocole de Coopération, chacune des Organisations Parties Prenantes de l'UNESCO s'engagent à soumettre à cette Agence des Nations-Unies, une copie de son fondement juridique pour examen et approbation. Ainsi, sur la base de cet exercice, les différentes Organisations citées ci-dessus formaliseront le reste des protocoles de collaboration en vue de la matérialisation de cette initiative liée à cette requête du Fonds Climat au Mali.



Cadre de résultats du Projet

Titre du Projet : *Projet de réduction de la vulnérabilité des populations dans les cercles de Yélimané et de Nioro du Sahel Région de Kayes*

Objectifs spécifiques du Projet

Objectif Spécifique 1 : Faciliter l'accès des populations à l'eau potable à travers la création de points d'eau modernes dans les Communes de Dialfounou Gory (Leyya Hamet DIALLO, Leyya Soninkés), Krennis (Senowaaly Diallo), Konsiga (Bediara), Cercle de Yélimané, et dans les communes de Diaye Couira (Mboya Kroumba, Gavirané (Diamera 2 et Diamera 3) Nioro Tougouré (Fiflilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes.		Effet attendu				
Effet attendu		Mobilisation valorisation et protection des ressources en eau afin de permettre l'alimentation des populations et de leur cheptel.				
Indicateurs d'Effet	Zone Géographique	Situations de référence	Cibles finales	Moyens de vérification	Org. Responsable	Conditions Critiques
Nombre de personnes ayant accès à l'eau potable.	Huit (8) villages des Communes de Dialfounou Gory (Leyya Hamet DIALLO, Leyya Soninkés), Krennis (Senowaaly Diallo), Konsiga (Bediara), Cercle de Yélimané, et dans les communes de Diaye Couira (Mboya Kroumba, Gavirané (Diamera 2 et Diamera 3) Nioro Tougouré (Fiflilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes.	-	1500	Rapport d'activités Rapport d'évaluation.	ADG UNESCO	Stabilité sociale
Produit Attendu 1	Promotion de points d'eau modernes pour l'accès à l'eau potable des populations et leur cheptel					
Indicateurs de Résultats immédiats	Zone Géographique	Situations de référence	Cibles finales	Moyens de vérification	Org. Responsable	Conditions Critiques
Nombre de points d'eau modernes créés et fonctionnels (forages) pour l'adduction d'eau potable.	Huit (8) villages des Communes dans les Communes de Dialfounou Gory (Leyya Hamet DIALLO, Leyya Soninkés), Krennis (Senowaaly Diallo), Konsiga (Bediara), Cercle de Yélimané, et dans les communes de Diaye Couira (Mboya Kroumba, Gavirané (Diamera 2 et Diamera 3) Nioro Tougouré (Fiflilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes.	-	8 points d'eau modernes	Rapport d'activités. Rapport d'évaluation. Rapport final.	ADG UNESCO	Stabilité sociale
Nombre de sessions de sensibilisation sur l'assainissement et la gestion des points d'eau.	Huit (8) villages des Communes dans les Communes de Dialfounou Gory (Leyya Hamet DIALLO, Leyya Soninkés), Krennis (Senowaaly Diallo), Konsiga (Bediara), Cercle de Yélimané, et dans les communes de Diaye Couira (Mboya Kroumba, Gavirané (Diamera 2 et Diamera 3) Nioro Tougouré (Fiflilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes.	-	72	Rapport d'activités. Rapport d'évaluation. Rapport final.	ADG UNESCO	Stabilité sociale

Nombre de comité de gestion villageois de gestion de points d'eau	Huit (8) villages des Communes dans les Communes de Diakounou Gory (Leyya Hamet DIALLO, Leyya Soninkés), Krémis (Senowaly Diallo), Konsiga (Bediara), Cercle de Yélimané, et dans les communes de Diaye Coura (Mboya Kroumba), Gavirané (Diamera 2 et Diamera 3) Nioro Tougouré (Fifilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes	-	8	Rapport d'activités	ADG UNESCO	Stabilité sociale
---	---	---	---	---------------------	---------------	-------------------

Objectif Spécifique 2 : Diversifier les sources de revenus des femmes et des jeunes afin de renforcer leur résilience socioéconomique.

Effet attendu	Zone Géographique	Situations de référence	Cibles finales	Moyens de vérification	Org. Responsable	Conditions Critiques
<ul style="list-style-type: none"> Amélioration de la nutrition dans les ménages résultant en une meilleure vitalité. Hausse des revenus à travers la diversification des activités ex : maraîchage, pisciculture, aviculture, apiculture, arboriculture, élevage, transformation des produits d'élevage, etc. améliorant les filets de sécurité pour les ménages vulnérables. Opportunités d'emploi à travers les activités du projet. Réduction du niveau de pauvreté des ménages Fourniture à la jeunesse des alternatives face aux menaces terroristes. 	Huit (8) villages des Communes dans les Communes de Diakounou Gory (Leyya Hamet DIALLO, Leyya Soninkés), Krémis (Senowaly Diallo), Konsiga (Bediara) Cercle de Yélimané, et dans les communes de Diaye Coura (Mboya Kroumba), Gavirané (Diamera 2 et Diamera 3) Nioro Tougouré (Fifilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes	-	400 ménages.	Rapport d'activités. Rapport d'évaluation.	ADG UNESCO	Stabilité sociale
<p>Nombre de ménages ayant augmenté leurs revenus grâce aux périmètres maraichers créés.</p>	Huit (8) villages des Communes dans les Communes de Diakounou Gory (Leyya Hamet DIALLO, Leyya Soninkés), Krémis (Senowaly Diallo), Konsiga (Bediara). Cercle de Yélimané, et dans les communes de Diaye Coura (Mboya Kroumba), Gavirané (Diamera 2 et Diamera 3) Nioro Tougouré (Fifilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes	-	400 ménages	Rapport d'activités. Rapport d'évaluation.	ADG UNESCO	Stabilité sociale
<p>Produit Attendu 1</p>	Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables (des femmes et les jeunes).					
Indicateurs de Résultats immédiats	Zone Géographique	Situations de référence	Cibles finales	Moyens de vérification	Org. Responsable	Conditions Critiques
Nombre de mini fermes créées	Huit (8) villages des Communes dans les Communes de Diakounou Gory (Leyya Hamet DIALLO, Leyya Soninkés),	-	8	Rapport d'activités. Rapport d'évaluation.	ADG UNESCO	Stabilité sociale

Nombre de maraîchers formés							
Nombre de maraîchers formés							
Nombre de éleveurs dotés en petits ruminants							
Nombre de éleveurs dotés en petits ruminants							
Nombre de groupements de jeunes dotés en petits ruminants							
Nombre d'éleveurs formés en techniques							

modernes d'embouche	Communes de Diakounou Gory (Leyya Hamet ELISSO, Leyya Sonhikés), Krémis (Serrvally Diallo), Konsiga (Bediara), Cercle de Yélimané et dans les communes de Diaye Couira (Mboya Kroumbou), Jevrané (Diamera 2 et Diamera 3) Niéro Tougouré (FiliFlode) cercle de Niéro du Sahel Région de Kayes.)			Rapport d'évaluation:	UNESCO	
---------------------	---	--	--	-----------------------	--------	--

10

Plan de Travail et Budget

Plan de travail relatif à : *Projet de réduction de la vulnérabilité des populations dans les cercles de Yélimané et de Nioro du Sahel Région de Kayes.*
 Durée du PC/P-Projet : 36 mois

Objectif Spécifique 1 : Faciliter l'accès des populations à l'eau potable à travers la création de points d'eau modernes dans les Communes de Diakourou Gory (Lee Hamet DIALLO, Lee Seminkes), Kertiris (Senowaaly Diallo), Konsiga (Bediara) Cercle de Yélimané, et dans les communes de Diaye Coura (Mboya Kroumba), Gavirané (Diamera 2 et Diamera 3) Nioro Tougoumé (Fiflilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes.

Produits attendus du PC/P-Projet	Activités clés	Calendrier (par activité)												Zone Géographique	Organisation Participante responsable	Budget prévu (par produit/activité) FCFA		
		T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4					
Produit 1.1.1 : Promotion de points d'eau modernes pour l'accès des populations à l'eau potable des populations et leur cheptel.																		
Résultat attendu 1.1 : huit (8) villages ne disposent de points d'eau modernes pour l'alimentation de la population.	Activité 1.1.1.1: Réalisation de huit (8) nouveaux forages dans 8 villages de 3 Communes de Yélimané et 3 communes de Nioro du Sahel				X	X										Huit (8) villages des Communes dans les Communes de Diakourou Gory (Lee Hamet DIALLO, Lee Seminkes), Kertiris (Senowaaly Diallo), Konsiga (Bediara), Cercle de Yélimané, et dans les communes de Diaye Coura (Mboya Kroumba), Gavirané (Diamera 2 et 3) Nioro Tougoumé (Fiflilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes	ADG UNESCO	83 600 000
	Activité 1.1.1.2: Organisation de 72 sessions de sensibilisation à l'alimentation de 960 personnes des usagers des 8 villages	X			X	X												
	Activité 1.1.3 : mise en place de comité de gestion de points d'eau					X												375 000
Sous – total Objectif 1																		
89 831 000																		

Objectif Spécifique 2 : Diversifier les sources de revenus des femmes et des jeunes afin de renforcer leur résilience socioéconomique

Produits attendus du PC/Projet	Activités clés	Calendrier (par activité)												Zone Géographique	Organisation Participante responsable	Budget prévu (par produit/ activité)		
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
Produit 2.1.1 : Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables (les femmes et les jeunes).																		
Résultat attendu 2.1 : Les femmes et les jeunes ont accès à diverses sources de revenus stables à travers le maraîchage dans des périmètres maraîchers modernes et la conduite d'activités innovantes d'élevage dans huit (8) villages.	Activité 2.1.1.1 : Aménagement de 3 mini fermes de 6 ha dans 8 villages de 3 communes de Yélimané et 3 communes de Niéro.	X	X	X	X											Huit (8) villages des Communes dans les Communes de Dacounou Gory (Leya Hamé, DIALLO, Leya Sarinkés, Kreris (Seno'waly Diallo), Konsiga (Bediara), Cercle de Yélimané, et dans les communes de Diaye Couira (Mbeya Kroumba), Gavirané (Diamara 2 et 3) Niéro, Tougouré (F. Ilfidé), cercle de Niéro du Sahel Région de Kayes	AD3 UNESCO	142 528 000
	Activité 2.1.1.2 : Formation de 400 exploitants (240 femmes et 160 jeunes) de 8 groupements maraîchers de 8 villages de 3 communes de Yélimané et 3 communes de Niéro du Sahel.	X	X	X	X													2 450 000
	Activité 2.1.1.3 : Dotation en ruminant de 400 éleveurs (240 femmes et 160 jeunes) de 8 groupements d'éleveurs de 8 villages de 3 communes de Yélimané et 3 communes de Niéro du Sahel.	X	X	X	X												95 785 800	
	Activité 2.1.1.4 : Formation en techniques modernes d'embarche de 400 éleveurs (240 femmes et 160 jeunes) de 8 groupements d'éleveurs de 8 villages de 3 communes de Yélimané et 3 communes de Niéro du Sahel.	X	X	X	X												2 450 000	
Sous – total Objectif 2																		
Sous-total Produits																		
243 213 800																		

Coordination & Suivi – Evaluation

Capitalisation		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Huit (8) villages des Communes dans les Communes de Diafounou Gory (Leyya Hamet DIALLO, Leyya Soninkés), Kérés (Senowaaly Diallo), Kousiga (Bediara), Cercle de Yelmamé, et dans les communes de Diaye Coutra (Mboya Kroumba), Gavarararé (Diamera 2 et Diamera 3) Nioto Tougouné (Fifilodé) cercle de Nioto du Sahel Région de Kayes		3 000 000																			
Suivi-évaluation		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9 706 966																				
Sous – total Activités transversales																																							12 706 966	
Fonctionnement	Charges du personnel		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		84 150 000																				
	Moyens logistiques		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		42 400 000																				
	Charges du bureau		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		7 625 000																				
	Frais de gestion organisation des nations unies (7%)																			33 504 434																				
Sous Total fonctionnement																																							133 093 000	
TOTAL GLOBAL																																								512 139 200

BUDGET GLOBAL - ONG ADG (Taux de conversion 1 USD= 500 FCFA)

I. Budget activités ONG

Libellé	Unités	Quantité	Prix Unitaire	BUDGET EN F CFA		BUDGET EN DOLLARS US
				Budget demandé	Budget total	
I.1. Mise en oeuvre des Activités/Produits :						
Résultat attendu I.1 : Huit (8) villages disposent de points d'eau modernes pour l'alimentation de la population.						
Produit I.1.1 : Promotion de points d'eau modernes pour l'accès des populations à l'eau potable.						
Activité I.1.1.1 : Réalisation de huit (8) nouveaux forages dans 6 villages de 3 Communes de Yélimané et 2 communes de Niéro du Sahel.						
Réalisation d'étude pour la situation du site d'implantation	Etude	8	500 000	4 000 000	4 000 000	8 000,00
Réalisation de forages décrit 5 m3 d'eau / heure au minimum (1 productif et 1 négatif).	Forage	8	6 000 000	48 000 000	48 000 000	96 000,00
Equipements (château métallique, cuves de 10 m ³ , panneaux solaires et accessoires)	Equipement	8	3 000 000	24 000 000	24 000 000	48 000,00
Bornes fontaines	Bornes	15	400 000	6 000 000	6 000 000	12 000,00
Sous-total Réalisation nouveaux forages				82 000 000	82 000 000	164 000,00
Activité I.1.1.2 : Organisation de 72 sessions de sensibilisation à l'intention de 960 personnes des usagers des 8 villages des 3 communes de Yélimané et 2 communes de Niéro du Sahel.						
Places assises	Place	960	100	96 000	96 000	192,00
Rafraichissement (Boissons et Eau)	Rafraichissement	960	500	480 000	480 000	960,00
Frais de déplacement	Déplacement	960	5 000	4 800 000	4 800 000	9 600,00
Location sale	Location	32	15 000	480 000	480 000	960,00
Sous-total Sensibilisation				5 856 000	5 856 000	11 712,00

Activité 1.1.1.3 : Mis en place un comité villageois de gestion du point						
Organisation d'assemblée Villageoise pour mettre en place les comité de gestion de point d'eau	Comité	15	25 000	375 000	375 000	750,00
Sous-total Comité de gestion				375 000	375 000	750,00
SOLS TOTAL 1 : forages + sensibilisation-Comités				38 231 000	88 231 000	176 462,00
Résultat attendu 2.1 : Les femmes et les jeunes ont accès à diverses sources de revenus stables à travers le maraîchage dans des périmètres maraîchers modernes et la conduite d'activités innovantes d'élevage dans six (6) villages.						
Produit 2.1.1 : Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables (les femmes et les jeunes).						
Activité 2.1.1.1 : Aménagement de 8 mini ferme de 6 ha dans 8 villages						
Grillage (clôture) : 48 rouleaux x 8 périmètres	Rouleau	384	27 500	10 560 000	10 560 000	2 120,00
Cornière N°50 de 6 m : 270 barres x 8 périmètres	Barre	2160	11 000	23 760 000	23 760 000	4 7520,00
Grosses Cornières (IPN) : 35 cornières x 8 périmètres	Cornière	288	20 000	5 760 000	5 760 000	1 520,00
Fils de fer recuits / Fils d'attache : 12 rouleaux x 3 périmètres	Rouleau	96	3 000	288 000	288 000	576,00
Fils de fer galvanisés : 96 rouleaux x 8 périmètres	Rouleau	768	7 500	5 760 000	5 760 000	1 520,00
Crochets : 120 crochets x 8 périmètres	Crochet	960	500	480 000	480 000	960,00
Forage avec équipement solaire et bassins de stockage d'eau	Forage	8	6 000 000	48 000 000	48 000 000	96 000,00
Porte : 1 porte x 8 périmètres	Porte	8	80 000	640 000	640 000	280,00
Réalisation 16 élanges piscicoles	Unité	16	500 000	8 000 000	8 000 000	16 000,00
Achat 9600 alevins	alevins	9 600	300	2 880 000	2 880 000	5 760,00
Achat aliment poissons	Kg	4000	700	2 800 000	2 800 000	5 500,00
Construction de poulaillers	Unité	8	2 500 000	20 000 000	20 000 000	40 000,00
Achat de poussins	Unité	8000	200	1 600 000	1 600 000	3 200,00

Achat aliment volaille et autres accessoires (abreuvoirs, mangeoires et lampes, vaccins et vitamines)	Unité	8	1 000 000	8 000 000	8 000 000	16 000,00
Achat de plants essences économiques	Unité	8	500 000	4 000 000	4 000 000	8 000,00
SOUS TOTAL 2 Aménagement périmètres						
Activité 2.1.1.2 Formation de 400 maraîchers (240 femmes et 160 jeunes) de 8 groupements de producteurs/productrices de 8 villages de 3 communes de Yélimané et 2 communes de Nioro du Sahel:						
Places assises	Place	400	1 000 000	40 000	40 000	30,00
Rafraichissement (Boissons et Eau)	Rafraichissement	400	500	200 000	200 000	400,00
Frais de déplacement	Déplacement	400	5 000	2 000 000	2 000 000	4 000,00
Location salle	Location	14	15 000	210 000	210 000	420,00
SOUS-TOTAL Formation						
SOUS-TOTAL Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables (les femmes et les jeunes).						
Activité 2.1.1.3 : Dotation en petits ruminants de 400 éleveurs (240 femmes et 160 jeunes) de 8 groupements d'éleveurs de 8 villages de 3 communes de Yélimané et 2 communes de Nioro du Sahel.						
I. Embouche Collective de bovins par 35 bénéficiaires (21 jeunes et 14 femmes) par village soit au total : 280 bénéficiaires pour ce volet.						
I.1 Infrastructures						
Clôture et Hangar	Nombre	8	3 000 000	24 000 000	24 000 000	48 000,00
Magasin de stockage	Nombre	8	500 000	4 000 000	4 000 000	8 000,00
SOUS-TOTAL Infrastructures						
I.2 Equipements						
Brouette	Nombre	32	35 000	1 120 000	1 120 000	2 240,00
Pelle	Nombre	20	2 500	50 000	50 000	100,00
Râteau	Nombre	20	2 000	40 000	40 000	80,00
Abreuvoir	Nombre	20	20 000	400 000	400 000	800,00
Margeoire	Nombre	20	20 000	400 000	400 000	800,00
Charrue	Nombre	8	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000,00

Ancres	Nombre	16	40 000	640 000	640 000	1 280,00
SOUS-TOTAL Equipements				3 650 000	3 650 000	7 300,00
I.3 Matières premières et intrants						
Bovin	Nombre	136	150 000	20 400 000	20 400 000	40 800,00
Aliment concentrés (Tourteau)	Kg	21760	200	4 352 000	4 352 000	8 704,00
Aliments grossiers (paille)	Voyages	680	7 500	5 100 000	5 100 000	10 200,00
Sel	Kg	136	2 000	272 000	272 000	544,00
SOUS-TOTAL Matières premières et intrants				30 124 000	30 124 000	60 248,00
I.4 Prestation et Soins						
Vaccin Clostrivax	Flacon	8	3 000	24 000	24 000	48,00
Vaccin Pastobov	Flacon	8	3 000	24 000	24 000	48,00
Déparasitant interne (alabendazole 2500 mg)	Nombre	272	400	108 800	108 800	2 175,00
Stresse vianm sacret buvable	Sachet	136	4 000	544 000	544 000	1 088,00
Déparasitant externe (ivermectin facon de 50ml)	Flacon	8	4 000	32 000	32 000	64,00
Antibiotique (Oxetracycline) 0%	Flacon	8	1 500	12 000	12 000	24,00
Suivi technique des infrastructures:	Nombre	32	10 000	320 000	320 000	640,00
Suivi sanitaire	Nombre	24	10 000	240 000	240 000	480,00
SOUS-TOTAL Prestation et soins				1 304 800	1 304 800	2 609,50
TOTAL Embouche Bovine				63 078 800	63 078 800	126 157,50
II. Embouche Collective d'ovins par 15 bénéficiaires (7 jeunes et 8 femmes) par village soit au total : 120 bénéficiaires pour ce volet.						
III.1 Infrastructures						
Cloître et Hangar	Nombre	8	1000	8 000 000	8 000 000	16 000,00
Magasin de stockage	Nombre	8	500 000	4 000 000	4 000 000	8 000,00

		SOUS-TOTAL Infrastructures		12 000 000	12 630 000	24 000,00
II.2 Equipements						
Brouette	Nombre	24	35 000	840 000	840 000	1 680,00
Pelle	Nombre	40	2 500	1 000 000	1 000 000	2 000,00
Râteau	Nombre	40	2 000	80 000	80 000	1 600,00
Abreuvoir	Nombre	72	7 500	540 000	540 000	1 080,00
Mangeoire	Nombre	72	7 500	540 000	540 000	1 080,00
Charrettes	Nombre	8	125 000	1 000 000	1 000 000	2 000,00
		SOUS-TOTAL Equipements		3 100 000	3 100 000	6 200,00
II.3 Matières premières et intrants						
Ovins	Nombre	320	35 000	11 200 000	11 200 000	22 400,00
Aliment concentrés (Tourteau)	Kg	14 400	200	2 880 000	2 880 000	5 760,00
Aliments grossiers (paille)	Voyages	440	7500	3 300 000	3 300 000	6 500,00
Sel	Kg	400	125	50 000	50 000	100,00
		SOUS-TOTAL Matières premières et intrants		17 430 000	17 430 000	34 860,00
II.4 Prestation et Soins						
Vaccination (pastovirin)	Flacon 25 doses	2	1 500	3 000	3 000	6,00
Vaccination (ovipeste)	Flacon 50 doses	1	6 046	6 046	6 046	12,09
Traitement déparasitant (Albendazole et Trizole)	Comprimé	80	400	32 000	32 000	54,00
Apport vitamine (Lobivite)	Comprimé	40	400	16 000	16 000	32,00
Appui conseil suivi sanitaire	Nombre	6	10 000	60 000	60 000	120,00
Suivi technique des infrastructures	Nombre	3	10 000	30 000	30 000	60,00
Frais de gardiennage (1)	Mois	3	10 000	30 000	30 000	50,00
		SOUS-TOTAL Prestation et soins		177 046	177 046	354,09

TOTAL Embouche ovine				32 707 046	32 707 046	65 414,09
Activité 2.1.1.4 : Formation en techniques modernes d'embouche de 400 éleveurs (240 femmes et 160 jeunes) de 8 groupements d'éleveurs de 8 villages de 3 communes de Yélimané et 2 communes de Niéro du Sahel.						
Places assises	Place	400	1 000	40 000	40 000	80,00
Rafraichissement (Boissons et Eau)	Rafraichissement	400	500	200 000	200 000	400,00
Frais de déplacement	Déplacement	400	5 000	2 000 000	2 000 000	4 000,00
Location salle	Location	14	15 000	210 000	210 000	420,00
SOUS-TOTAL Formation				2 450 000	2 450 000	4 900,00
SOUS-TOTAL Dotation en petits ruminant de 400 éleveurs				98 235 846	98 235 846	196 471,69
Suivi-Evaluation :						
Suivi mensuel (ADG) 2 personnel et 1 chauffeur	Mission	36	200 000	7 200 000	7 200 000	14 400,00
Evaluation finale (ADG/UNESCO)	Evaluation	1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000,00
Sous-total Suivi – évaluation				8 700 000	13 800 000	17 400,00
Capitalisation des acquis						
Organisation d'un atelier de capitalisation des acquis	Atelier	1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000,00
Sous-total Capitalisation des acquis				2 000 000	2 000 000	4 000,00
TOTAL ACTIVITES				341 934 846	341 934 846	683 869,69
II. Fonctionnement						
II.1. Charges d1 personnel :						
Salaire Chargé Projet ADG : 1 pers x 36 mois x 350 000 FCFA 100% de son temps	Mensuel	36	350 000	12 600 000	12 500 000	25 200,00
Salaire Chargé de projet UNESCO (1 pers x 36 mois x 350 000 FCFA 100% de son temps	Mensuel	36	350 000	12 600 000	12 500 000	25 200,00
Salaire animateurs (6 pers x 35 mois x 235 000 FCFA) 100% de son temps	Mensuel	216	235 000	50 760 000	50 750 000	101 520,00

Salairé chargé de Communication (1 pers x 35 mois x 200 000 FCFA) 100% de son temps	Mensuel	36	200 000	7 200 000	7 200 000	14 400,00
Salairé Comptable (1 pers x 36 mois x 150 000 FCFA) 25% de son temps	Mensuel	36	37 500	1 350 000	1 350 000	2 700,00
Salairé Chauffeur (1 pers x 36 mois x 100 000 FCFA)	Mensuel	36	100 000	3 600 000	3 500 000	7 200,00
SOUS-TOTAL 1 : Salairé personnel				88 110 000	88 110 000	176 220,00
II.2. Moyen logistiqué :						
Achat véhicule 4x4 et accessoires	Véhicule	1	25 000 000	25 000 000	25 000 000	50 000,00
Vignette	Vignette	3	35 000	105 000	105 000	210,00
Assurance	Assurance	3	60 000	180 000	180 000	360,00
Carburant (Véhicule)	Carburant	36	172 000	6 192 000	6 192 000	12 384,00
Achat moto	Moto	6	715 000	4 290 000	4 290 000	8 580,00
Vignette	Vignette	15	6 000	90 000	90 000	180,00
Assurance motos	Assurance	15	40 000	600 000	600 000	1 200,00
Achat carburant motos	Mois	180	25 000	4 500 000	4 500 000	9 000,00
SOUS-TOTAL 2 : Moyen logistiqué				40 957 000	42 400 000	81 914,00

(Signature)

II.3. Charge Bureau :						
Photocopieuse	Photocopieuse	1	325 000	325 000	325 000	550,00
Ordinateur Portable	Portable	4	250 000	1 000 000	1 000 000	2 200,00
Location siege	Mois	36	1 000 000	3 600 000	3 600 000	7 200,00
Communication (telephone)	Mois	36	25 000	900 000	900 000	1 800,00
Eau et électricité	Mois	36	25 000	900 000	900 000	1 800,00
Matériels et fournitures de Bureau	Mois	36	25 220	907 920	907 920	1 815,84
SOUS-TOTAL 3 : charge Bureau			7 632 920	7 632 920	7 632 920	15 255,84
TOTAL fonctionnement			136 699 920	136 699 920	136 699 920	248 771,46
TOTAL ACTIVITES+FONCTIONNEMENT			478 634 766	478 634 766	478 634 766	957 269,53
Frais de gestion (organisation des nations unies (7%))			33 504 434	33 504 434	33 504 434	67 008,87
TOTAL GENERAL DEMANDE AU PARTENAIRE			512 139 200	512 139 200	512 139 200	1 024 278,40

(Handwritten mark)

LES PROJETS SIMILAIRES de l'ONG ADG

<p>Nom du Projet : Promotion des Meilleures Pratiques agricoles, nutritionnelles et sanitaires dans les cercles de Nioro et de Diéma » (PPMP) République du Mali 2008 – 2012</p>	<p>Montant financement : Union Européenne : 1.099.960,00 Euro soit 721 526 461 FCFA</p>
<p>Pays : Mali cercles de Diéma Nioro du Sahel Région de Kayes</p>	<p>Durée de la mission : 01 février 2008 à janvier 2012</p>
<p>L'objectif global : contribuer de façon durable à l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes ou allaitantes et la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables dans la région sahélienne de Kayes »</p> <p>L'objectif spécifique à atteindre au bout des 4 ans est le renforcement de la capacité d'auto assistance alimentaire et nutritionnelle des groupes cibles et acteurs locaux dans les cercles de Nioro et Diéma.</p> <p>Les principales activités sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Renforcer les capacités, équiper et suivre de manière rapprochée les <u>relais communautaires</u> pour la prévention et le traitement de la malnutrition, en collaboration avec les agents de santé des CCom et CSRef ; b) Mobiliser les communautés villageoises pour la constitution d'un <u>Fonds Communautaire de Nutrition (FCN)</u> en vue de pérenniser les activités des relais ; c) Diffuser les messages nutritionnels et sanitaires par les stations des <u>radios locales</u> ; d) Vulgariser les <u>pratiques physiques et biologiques de conservation et de récupération des sols</u> (des terres arable), former des paysans aménagistes ; e) Démontrer, multiplier et diffuser des <u>semences améliorées</u> de variétés précoces de sorgho, de niébé et d'arachide ; f) Appuyer le <u>maraîchage</u> par la réalisation des micro-infrastructures et des formations ; g) Appuyer la <u>production laitière</u> d'animaux domestiques (fermes modèles) ; h) Professionnaliser les comités des <u>banques de céréales</u> (BC) ciblés ; i) <u>Conseiller les communes</u> dans la concrétisation de leurs projets communaux d'appui à la sécurité alimentaire et faciliter la recherche de financements externes ; j) Rédiger et diffuser des <u>publications semestrielles</u> et organiser une <u>foire régionale</u>. 	<p>Nombre d'employés/mois fournis par les consultants associés : 20 Agents</p> <p>Nature des services fournis par ADG</p> <p>1. Des pratiques préconisées pour la prévention et le traitement de la malnutrition des enfants, des femmes enceintes ou allaitantes sont vulgarisées et appliquées au niveau communautaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mener une enquête nutritionnelle de base : le taux de malnutrition aigue des enfants (émaciation ou rapport poids taille) sera détecté et les informations sur les pratiques nutritionnelles des populations et sur le fonctionnement des relais communautaires seront étudiées. L'enquête servira non seulement de référentiel de base pour le S&E mais permettra au Programme de mieux cibler les villages d'intervention. A la fin du PPMP, la même enquête nutritionnelle sera reconduite dans les mêmes localités pour mesurer l'évolution des indicateurs d'impacts. - Etablir des conventions entre les communautés et le projet. Il s'agit d'un « contrat de partenariat pluriannuel » qui décrit les contributions (dégressives) du côté du Programme et les contributions (progressives) du côté des communautés. - Inventorier, former et équiper les relais communautaires en matériel de cuisine pour animer des séances de démonstration culinaires nutritionnelles, en matériel pour les sessions d'éducation nutritionnelle, en Bandelettes de Shakir pour le dépistage des cas de malnutrition aiguë. - Programmer et suivre intensivement les relais. Chacun des 500 relais s'occupera des 35 ménages (environ 250 habitants) de leurs localités et travaillera, de manière bénévole, un jour fixe par semaine. - Promouvoir le suivi des enfants malnutris à domicile. - Soutenir la constitution des FCN. Le Programme propose que chaque communauté constitue et approvisionne un Fonds Communautaire de Nutrition en vue de soutenir et de pérenniser les activités des relais communautaires <p>2. Un vaste programme d'éducation nutritionnelle et sanitaire est diffusé en utilisant les différents médias de masse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Communication de masse, complémentaires à ceux des radios locales de la prévention et du traitement communautaire de la malnutrition. <p>3. La production agricole et animale est intensifiée et diversifiée par la vulgarisation et l'adoption de techniques appropriées</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vulgariser les pratiques mécaniques – physiques de la conservation et la récupération des sols en vue de protéger et d'accroître la fertilité des champs existants - Vulgariser les pratiques biologiques de protection / fertilisation des sols. - Former les paysans aménagistes sur l'ensemble des techniques de confection des outils (niveau à eau, équerre) et des mesures mécaniques et biologiques de conservation et de récupération des eaux et des sols. Les paysans aménagistes formés permettront, à leur tour, d'encadrer un plus grand nombre de producteurs et de suivre la réalisation individuelle des mesures préconisées. Ils renforceront le système d'encadrement rural et multiplieront les techniques d'aménagement des terres arables. - Introduire, multiplier et diffuser les semences améliorées pour l'intensification de la production agricole hivernale. - Vulgariser les pratiques simples de la protection des cultures et des végétaux.


	<p>- Promouvoir les activités maraîchères et de contre-saison.</p> <p>- Promotion de l'embouche bovine pour prolonger non seulement la période de production laitière mais aussi la quantité du lait produit par animal par la constitution des bases fourragères, l'organisation de l'approvisionnement en aliment de bétail (tourteaux de coton) et le perfectionnement des enclos / étables pour les animaux de ménage.</p> <p>4. La capacité de gestion des structures communautaires et communales qui œuvrent pour l'amélioration de la SA dans leurs localités est renforcée</p> <p>- Renforcer/professionnaliser les banques céréalières (BC) communautaires par la mise en place des outils de gestion et des petits équipements des BC (balances, palettes, grillages de protection contre les oiseaux et les souris)</p> <p>- Appuyer / professionnaliser les organisations paysannes par des formations en gestion.</p> <p>- Appui-conseil aux communes dans la concrétisation des plans de Sécurité Alimentaire et des PDSEC.</p> <p>- Rédiger les publications semestrielles.</p> <p>- Organiser une foire régionale au début de la quatrième année</p>
<p>Nom du Projet : Renforcement des moyens, des conditions d'existence et de coexistence des communautés pastorales du Sahel Occidental</p>	<p>Montant du financement : ONG britannique Acord Sahel 1 et Fondation cardinal LEGER du CANADA 60 millions de Francs CFA</p>
<p>Pays : Mali cercle de Nioro du Sahel - Région de Kayes</p>	<p>Durée de la mission 01 janvier 2008 à Décembre 2012</p>
<p>L'objectif global : le programme vise l'amélioration et la viabilisation aux niveaux communal local et régional des moyens d'existence et de coexistence des communautés pastorales du Sahel Occidental ainsi qu'une meilleure implication de leurs conditions institutionnelles dans la gestion conjointe et pacifique des ressources naturelles et dans le débat politique, à travers leurs organisations.</p> <p>Les objectifs spécifiques du projet sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Renforcement des <u>organisations</u> pastorales d'un point de vue organisationnel, institutionnel et fonctionnel pour représenter légitimement les pasteurs auprès des instances de décision communale et locale ; ↳ Développement des capacités d'analyse et d'influence des organisations pastorales et de femmes à travers leur mise en <u>réseau</u>, et le soutien des initiatives d'inclusion des communautés pastorales pouvant permettre leur participation au processus de prise de décisions dans le cadre de la décentralisation et de la démocratisation, de la gestion conjointe des ressources locales, de la prévention et de la résolution des conflits. ↳ Réaliser l'accès des éleveurs et des familles d'éleveurs <u>aux services</u> sociaux de base et au foyers pastoral. ↳ Améliorer les conditions alimentaires et nutritionnelles des femmes et des enfants d'éleveurs du Sahel Occidental par <u>l'introduction et la vulgarisation des techniques innovatrices en vue de la prolongation de la période de production laitière</u> et l'accroissement de la quantité du lait produit par animal. ↳ Améliorer et sécuriser des conditions d'accès aux pâturages et aux sites d'abreuvement des animaux; <p>Nom du Projet : Mise en œuvre des opérations des Mesures d'Accompagnement Nutritionnel dans 24 Communes des Districts Sanitaires de Nioro du Sahel et de Diéma pour le Programme National de Filets Sociaux « Jigisémjiri »</p>	<p>Nombre d'employés/mois fournis par les consultants associés : 13 Agents</p> <p>Nature des services fournis par ADG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation d'une étude sur les organisations pastorales du cercle de Nioro. - Renforcement des capacités organisationnelles, institutionnelles et opérationnelles de 100 organisations pastorales et de femmes <p>Ces organisations sont mises en réseaux et leur légitimité est reconnue par les pasteurs, les agriculteurs, les responsables administratifs et politiques locaux, et les autres acteurs du monde rural de la région. Ces organisations sont en mesure d'œuvrer en faveur des communautés pastorales défavorisées. Le soutien à ces organisations pastorales dans les deux cercles par le projet, contribuera à l'amélioration des conditions de vie de 6 000 pasteurs et de leurs familles soit 30 000 bénéficiaires.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formation et équipement des responsables des soixante (60) associations de femmes en techniques de fabrication et de conservation du « fromage peulh » et du beurre de vache; Mise en place de deux cadres de concertation (1 à Nioro et 1 à Diéma) regroupant des associations opérationnelles locales. Ces cadres se réunissent pour débattre périodiquement des stratégies de sécurisation de la transhumance des animaux au niveau de chaque cercle. - Appui de 50 % communes cercles Nioro Diéma pour l'inscription et budgétisation des projets concrets d'appui à l'élevage <p>Sécurisation des moyens d'existence des pasteurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des rencontres communales et élaboration des conventions locales pour la matérialisation et réhabilitation des pistes de parcours de transhumance au niveau communal, local et régional et l'accès aux ressources naturelles (pâturages, pistes de transhumance, mares d'abreuvement, puits pastoraux, gîtes d'étape et autres ouvrages communautaires) ; - Réalisation de six (6) puits pastoraux, de trois (3) parcs de vaccination, de deux (2) rampes d'embarquement du bétail dans le cercle de Nioro du Sahel <p>Montant financement : Banque Mondiale 500.000 \$ US</p>

Pays : Mali Lieu : 12 Communes du Cercle de Diéma et 12 Communes du Cercle de Nioro du Sahel - Région de Kayes	Durée de la mission (36 mois) Septembre 2015 – Août 2018
Nom du Client: Programme National de Filets Sociaux « Jigisémejiri »	Nombre total d'employés/mois ayant participé à la Mission : 22 Agents
Adresse : Hamdallaye ACI 2000 Tel 20221615 Abdoulaye SAMOURA, Spécialiste en Charge des Mesures d'Accompagnement et Paquet Nutritionnel Préventif Email : asamoura@jigisemejiri.org	Valeur approximative des services offerts par ADG : 500.000 \$ US
Date de démarrage (mois/année) : Septembre 2015 Date d'achèvement (mois/année) Août 2018 Noms des consultants associés/partenaires éventuels : - Direction Régionale de la Santé de Kayes - Direction Régionale du Développement Social de Kayes - Centre de Santé de Référence de Diéma, - Centre de Santé de Référence de Nioro du Sahel - Centre de Santé Communautaire de ?? aires de santé - Services du Développement Social de Diéma, - Service du Développement Social de Nioro du Sahel - Service du Développement Social de Diéma	Nombre d'employés/mois fournis par les consultants associés : 22 Agents Équipe de Gestion : 01 Président Coordinateur 02 Superviseurs Nutritionnistes 01 Responsable du Suivi Evaluation 14 Animateurs de zone
<p>Objectifs du programme : vise à (i) répondre aux besoins immédiats et permanents des ménages en pauvreté chronique et en vulnérabilité, et à (ii) créer des opportunités pour leur avenir en appuyant les stratégies de développement humain telles que l'investissement dans la santé infantile et l'adoption de pratiques modèles en matière de nutrition et d'hygiène.</p> <p>L'objectif de développement est de contribuer à l'amélioration des résultats en matière de capital humain (santé, nutrition, hygiène et économie familiale) des enfants, ceci afin de réduire la probabilité de leur maintien dans la pauvreté dans l'avenir (réduire la transmission intergénérationnelle de la pauvreté), à travers la combinaison des transferts monétaires (TM) et de mesures d'accompagnement (MA).</p> <p>Plus spécifiquement il s'agira dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dans le domaine de la santé/nutrition : <ul style="list-style-type: none"> • Augmenter de 30% le taux des femmes des zones d'intervention qui connaissent et pratiquent les avantages des bonnes pratiques en matière de nutrition et de 20%, le nombre de femmes mères qui utilisent les services de nutrition ; • S'assurer qu'au moins, 60% des mères des zones d'intervention sont sensibilisées sur les avantages et les calendriers de la vaccination des enfants ; • S'assurer que, plus de 90% des cibles (femmes enceintes, femmes allaitantes, enfants de 06-59 mois) ont bénéficié de la dotation régulière en paquets nutritionnels préventifs. ✓ Dans le domaine de l'éducation : <ul style="list-style-type: none"> • Augmenter de plus de 25%, le nombre de chefs de ménages qui connaissent et appliquent au moins la moitié des 08 droits des enfants ; • S'assurer qu'au moins 80% des ménages des zones cibles sont sensibilisés sur les avantages de l'accès et la réussite scolaire des jeunes enfants en milieu rural. ✓ Dans le domaine de la protection sociale : <ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que, plus de 90% des ménages bénéficiaires des transferts monétaires sont mieux sensibilisés des avantages de l'économie familiale ; • S'assurer que 50% des ménages des zones cibles sont sensibilisés sur les petits investissements productifs. <p>Dans le cadre de la mise en œuvre du programme ADG a été chargée de préparer et de conduire les opérations de mesures d'accompagnement et de paquet nutritionnel préventif : Aussi les actions suivantes ont été menées :</p> <p><u>Étape 1</u> : Mobilisation de l'équipe ADG et renforcement de capacités du personnel</p> <p><u>Étape 2</u> : Organisation de séances publiques de lancement du projet dans les 24 Communes des cercles de Nioro du Sahel et de Diéma ;</p> <p><u>Étape 3</u> : Mobilisation sociale (campagne d'information et de sensibilisation des communautés bénéficiaires) dans les 180 villages de Nioro et les 166 villages de Diéma des 24 communes cibles);</p> <p>Résultat obtenus au niveau des 24 communes des cercles de Nioro du Sahel et de Diéma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Les femmes des zones d'intervention connaissent et pratiquent les avantages des bonnes pratiques en matière de nutrition et 20% en plus des femmes mères utilisent les services de nutrition ; 2. Au moins, 60% des mères des zones d'intervention sont sensibilisées sur les avantages et les calendriers de la vaccination des enfants ; 3. Plus de 90% des cibles (femmes enceintes, femmes allaitantes, enfants de 06- 59 mois) sont recensés de façon exhaustive et leurs besoins évalués et ces cibles bénéficient de la dotation régulière en Paquets Nutritionnels Préventifs (PNP) , 4. Augmenter de plus de 25%, le nombre de chefs de ménages qui connaissent et appliquent au moins la moitié des 08 droits des enfants à travers des activités de Sensibilisations de proximité (animations publiques mensuelles, des causeries éducatives, des visites à domicile, diffusion II-C, de boîtes à images, d'affiches, d'affichettes, de brochures, d'autocollants, etc. à travers toute la zone de couverture du projet) ; 5. Plus de 90% des ménages bénéficiaires des transferts monétaires sont mieux sensibilisés des avantages de l'économie familiale. 6. 50% des ménages des zones cibles sont sensibilisés sur les petits investissements productifs à travers l'identification des secteurs porteurs et activités à fortes potentialités de revenus, l'élaboration des plaquettes et fiches techniques présentant la synthèse de ces activités génératrices de revenus et le développement des manuels de formation sur le développement de ces activités. 	
Nom du Projet : Cash inconditionnel d'appui à la lutte contre l'insécurité alimentaire des ménages suite à la campagne agricole 2012-2013 dans les cercles Diéma, Nioro du Sahel - Région de Kayes	Montant du Financement : PAM. 196.000 SUS

	Durée de la mission : Février-Décembre 2013
	Nombre total d'employés/mois ayant participé à la Mission : 18 Agents
Noms des partenaires: <ul style="list-style-type: none"> - Direction Régionale du Développement Social de Kayes - Administration locale et Elus communaux des 31 communes de Diéma, Nioro du Sahel - Les chefs des villages, les représentants des jeunes et des femmes - Services du Développement Social de Diéma, Nioro du Sahel 	Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées : Coordinateur, Chef d'équipe. Superviseur et animateurs
<p>Description du projet : Objectifs du Projet : Renforcer les capacités de résilience des ménages pauvres affectées par la crise alimentaire de 2012 2013 dans la Région de Kayes.</p> <p>L'intervention concerne un Projet de Cash inconditionnel d'appui à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans 31 Communes listées en difficultés économiques des Cercles de Nioro et de Diéma.</p> <p>La mise en œuvre s'est déroulée en différentes phases dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciblage : à travers l'information et la sensibilisation sur les critères de ciblage la mise en place et la formation des comités villageois de ciblage, appui aux ciblages et productions de liste de bénéficiaires validés et - Paiement des transferts : le paiement est fait par les services financiers de l'ONG et suivi par les comités locaux, - Le suivi post distribution de l'utilisation des transferts/ 	



Autres expériences majeures en relation avec le projet
Le renforcement des capacités (l'information, la sensibilisation, l'organisation et la formation)

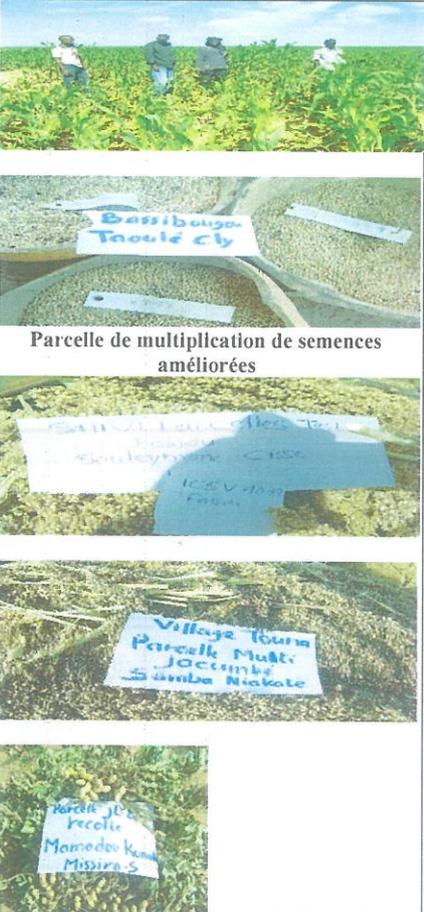titre du projet	année	montant	
Projet OSRO/RAF/006/SWE (E): « Appui aux populations vulnérables des communes rurales de Simby, Diarrah et Diaye Coura du cercle de Nioro du Sahel dans la région de Kayes »	2011	134 525 000 FCFA	
Projet de vulgarisation pratiques mécaniques – physiques conservation et récupération des sols et vulgarisation pratiques biologiques de protection / fertilisation des sols, des milliers de mètres linéaires de cordons pierreux, diguettes, digues filtrantes réalisés et des centaines d'ha de terres de cultures récupérés dans les cercles de Nioro et Kayes	2011 - 2012	15 000 000 FCFA	
Projet d'appui aux groupements de femmes maraîchères en semences et en petits matériels dans 5 communes de Kayes, 4 de Diéma et 6 de Nioro Diffusion de <u>semences améliorées</u> de variétés précoces de sorgho, de niébé et d'arachide	2013	86 000 000 FCFA	 <p align="center">Parcelle de multiplication de semences améliorées</p>



			
Projet Mobilisation communautaire des groupements de femmes pour leur implication dans les cantines scolaires ; sensibilisation et information pour l'envoi des filles à l'école dans les cercles de Kayes, Nioro, Diéma.	2013	15 000 000 FCFA	
Projet information, sensibilisation des communautés, CGS, et Collectivités pour la contribution aux fonctionnements des cantines scolaires dans les cercles de Kayes, Nioro, Diéma.	2013	15 000 000 FCFA	
Projet information, sensibilisation communautés et création des comités de gestion pour certains actifs majeurs (mares, étangs piscicoles, périmètres maraîchers) cercles de Kayes, Nioro, Diéma.	2013	13 000 000 FCFA	
Projet Cash inconditionnel à travers l'information et la sensibilisation sur les critères de ciblage, la mise en place et la formation des comités villageois de ciblage, appui aux cibrages et productions de liste de bénéficiaires validés et suivi de la distribution et post distribution de fonds dans les 31 communes à difficultés économiques des cercles de Nioro et Diéma.		48 000 000 FCFA	
Projet d'assistance des communautés à réhabiliter et à créer des moyens de subsistance. Food for Works dans les cercles de Kayes, Nioro et Diéma.		24 000 000 FCFA	
Projet de résilience dans les 5 communes Kayes, 4 communes de Diéma et 6 communes de Nioro du Sahel. Région de Kayes au profit de 37 740 bénéficiaires qui ont reçu 311 355 000 FCFA et 827,420 MT	2014	165 000 000 FCFA	
Diverses formations sur toutes les activités du projet dans les communes de Kayes, Séro Diamano, Koussané, Karakoro, Koussané, Djelebou et Sahel dans le cercle de Kayes, Nioro, Guétéma, Yétiéré, Gadiaba Kadiel, Diarral Diaye Coua et Gavinané dans le cercle de Nioro du Sahel et Diéma, Gomitradougou, Fassoudebé, Dioumara et Groumera			

Handwritten signature or mark in blue ink.

<p>Assistance d'urgence aux populations vulnérables affectées par le déficit pluviométrique dans les cercles de Nioro du Sahel, Diéma et Yélimané</p> <p>En partenariat avec le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) les activités menées ont concerné :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Information/sensibilisation des communautés ; -Le ciblage des ménages bénéficiaires et la restitution des résultats du ciblage ; -Distribution de 2110 Tonnes à 117 215 bénéficiaires dans les cercles cibles -Production de rapports. -Formation 250 paysans en Techniques de maraichage, de fabrication compost, de Transformation/conservation des légumes et fruits et en gestion d'un étang piscicole -Formation de 150 éleveurs en Gestion des espaces Pastoraux, et en production des fourrages. 	2014	21 500 000 FCFA	
---	------	-----------------	--

La promotion des filières végétales, animales et aquacoles (production, Conservation, transformation et commercialisation)

<p>Projet de réalisation des pare-feux pour sécuriser les maigres pâturages et prolonger leur durée d'exploitation dans les cercles de Nioro, Diéma et Kayes</p>	2011 - 2012	Vivres contre travail	
<p>Projet de 25 hectares de périmètres maraichers de femmes réhabilités et équipés de puits et de petits matériels et intrants (semences) dotés de dizaines de fosses compost pour améliorer la fertilité du sol dans les cercles de Nioro, Diéma et Kayes.</p>	2011 - 2012	170 000 000 FCFA	
<p>Projet réalisation étangs piscicoles, cordons pierreux, diguettes, salles de classes, réfectoires, magasins de stockage, parcs vaccinations ; réhabilitation micro-barrages, périmètres maraichers, pistes rurales marcs, reboisement, clôture CSCOMs, creusement et surcreusement puits maraichers, villageois et pastoraux dans les cercles dans les cercles de Nioro, Diéma, Bafoulabé et Kayes</p>	2013	Vivres contre travail	
<p>Projet réhabilitation périmètres maraichers, puits maraichers, infrastructures villageoises, magasins de stockage cordons pierreux dans les cercles de Nioro, Diéma et Kayes.</p>	2013	66 000 000 FCFA	



<p>Confection des cordons pierreux et digues filtrantes pour la récupération des centaines d'hectares de terres de cultures dans les cercles de Nioro, Diéma et Kayes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réhabilitation de 5 micro-barrages pour l'exploitation de 12 hectares de périmètres maraichers - confection fosses pour compostage pour améliorer la fertilité du sol afin d'accroître la productivité. 	2013	98 000 000 FCFA	 <p>Formation de paysans sur les techniques de DRS/CES</p>
<p>Reboisement autour des mares associés à des périmètres Fassoudebé à Diéma, Karakoro et Sahel, Kayes.</p>	2013	75 000 000 FCFA	
<p>Projet Création de 15 périmètres maraichers et réhabilitation de 18 périmètres pour les groupements de femmes dans les cercles de Nioro, Diéma, Kayes.</p>	2013	124 000 000 FCFA	
<p>Projet introduction de race améliorée de boucs « bouc guera » dans les 32 communes de Nioro et Diéma.</p>	2013	18 000 000 FCFA	
<p>Projet de création de 8 étangs piscicoles dans les 5 communes de Nioro et Diéma</p>	2013	21 000 000 FCFA	
<p>Projet de creusement ou surcreusement de 3 mares multifonctionnelles à Kayes, 5 mares à Nioro et 2 mares à Diéma : abreuvement des animaux, arrosage Périmètres Maraichers.</p>	2013	Vivres contre travail	 
<p>Réhabilitation de 12 puits maraichers et 8 puits pastoraux et création de 5 puits pastoraux dans les cercles de Kayes, Nioro, Diéma.</p>	2013	54 000 000 FCFA	



<p>PROJET RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DANS LE CERCLE DE NIORO « VIVRES POUR LA CREATION D'ACTIFS» :</p>	2015	215.489.920 FCFA	
<p>Cash transfert : 98 514 000 f Cfa et DAG : 511 tonnes de vivres en faveur de 2526 bénéficiaires dont 1762 hommes et 764 femmes</p>			
<p>Les activités menées ont concerné :</p>			
<p>1) Aménagement et gestion de 20 km d'espaces pastoraux par la réalisation de Pare-feux organisation rencontres villageoises, balisage des pistes de transhumance et des accès aux sites d'abreuvement du cheptel dans les communes de Simby, Yérééré, Troungoumbé, Diaye Coura et Gadiaba Kadiel ;</p>			
<p>2) Appui à l'embouche ovine en faveur des femmes</p>			
<p>3) Aménagement de 0,5 ha mares et confection de hangars améliorés pour la conservation du fourrage, dans la commune de Simby ;</p>			
<p>4) Réalisation de 7.5 ha de Jardins potagers Africains, création de 80 ha de zones de mise en défens et Réhabilitation de 8 kms de pistes rurales dans la commune de Koréra Koré et de Gavinané ;</p>	2015		
<p>5) Réalisation de 25 ha de cordons pierreux, 1400 ml de diguettes isohypse, demi-lune, digues filtrantes Diaye Coura et Gavinané ;</p>	2015		
<p>6) Réalisation d'un Radier Submersible de 300 m à Diaye Tougouné ;</p>	2015		
<p>7) Réalisation de 6 ha de périmètres maraichers équipés de forage et de système de pompage solaire à Gavinané et Farandallah ;</p>	2015		
<p>8) Construction d'un barrage de retenue des eaux à Gavinané à talus en pente constitué de déversoir d'une longueur de 70m avec un profil trapézoïdal et de type seuil épais. L'ouvrage est calé à la cote 342,25m au-dessus du niveau de la mer. Les ouvrages de raccordement au nombre de deux (02), l'un jouxte le déversoir et l'autre l'ouvrage régulateur. Les différentes jonctions sont assurées par un mur bajoyer en maçonnerie de moellons dosée à 300 kg/m³ ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Travaux de protection des ouvrages et des berges et empoissonnement du plan d'eau du lac du barrage ; • Reboisement de 11 ha de Gommier. • 	2015		

Les activités de défense et restauration des sols, la protection et gestion des ressources naturelles

Titre du projet	année	montant	
Projet OSRO/RAF/006/SWE (E): « Appui aux populations vulnérables des communes rurales de Simby, Diarrah et Diaye-Coura du cercle de Nioro du Sahel dans la région de Kayes »	2011	134 525 000 FCFA	
Projet de reboisement de 20 hectares et création de 40 ha de zones de mise en défens avec diverses essences forestières composés principalement d'acacia Sénégal, d'acacia scorpoïde, d'acacia SPP, de dalbergia et Moringa olifera sécurisés avec des grillages dans les cercles de Nioro, Diéma et Kayes	2010 - 2011	30 000 000 FCFA	
Projet de vulgarisation pratiques mécaniques – physiques conservation et récupération des sols et vulgarisation pratiques biologiques de protection / fertilisation des sols. des milliers de mètres linéaires de cordons pierreux, diguettes, digues filtrantes réalisés et des centaines d'ha de terres de cultures récupérés dans les cercles de Nioro et Kayes. Reboisement autour des mares associés à des périmètres Fassoudebé à Diéma ; Karakoro et Sahel, Kayes ; Réhabilitation de 5 micro-barrages pour l'exploitation de 12 hectares de périmètres maraîchers	2011 - 2012	15 000 000 FCFA	 
Projet de réalisation des pare-feux pour sécuriser les maigres pâturages et prolonger leur durée d'exploitation dans les cercles de Nioro, Diéma et Kayes	2011 - 2012	Vivres contre travail	
Projets - Confection des cordons pierreux et digues filtrantes pour la récupération des centaines d'hectares de terres de cultures dans les cercles de Nioro, Diéma et Kayes. - Réhabilitation de 3 micro-barrages pour l'exploitation de 10 hectares de périmètres maraîchers - confection fosses pour compostage pour améliorer la fertilité du sol afin d'accroître la productivité.	2013	98 000 000 FCFA	 Formation de paysans sur les techniques de DRS/CES

L'amélioration de l'accès aux marchés et aux financements



Réalisation de pistes rurales avec des ponts traditionnels pour l'accès aux zones de productions et aux marchés dans les cercles de Nioro et Diéma.	2013	Vivres contre travail
Réalisation de pistes rurales avec des ponts traditionnels pour l'accès aux zones de productions et aux marchés dans les cercles de Nioro et Diéma.	2015	175 000 000F CFA
Réalisation de pistes rurales avec des radiers pour l'accès aux zones de productions et aux marchés entre Nioro et la commune de Gadiaba Kadiel dans le cercle de Nioro		



9

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'ASSAINISSEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

*Agence de l'Environnement et du
Développement Durable (AEDD)*



Projet de Gestion des Ressources Naturelles
Et Changements Climatiques (PGRNCC)

ATTESTATION DE BONNE FIN D'EXECUTION

Je soussigné, le Directeur Général de l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AEDD), Coordinateur du Projet de Gestion des Ressources Naturelles et Changements Climatiques (PGRNCC), atteste que l'Association pour le développement global a effectué les travaux de récupération de 35 ha de terres dégradées dans le village de DEDJI/GADIABA BOMBOYABE communales de GADIABA KADIEL Lot n°2 conformément aux termes du marché n°1432 DRMP 2018 pour le compte du PGRN CC.

En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Bamako, le 11 MARS 2019

Le Coordinateur


Bouréma CAMARA
Chevalier de l'Ordre National



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
SECRETARIAT GÉNÉRAL

**PROGRAMME DE FILETS SOCIAUX AU MALI
«JIGISEMEJIRI»**

ATTESTATION DE SERVICES FAITS

Je soussigné Mahmoud Ali SAKO, Coordinateur National du Programme de filets sociaux « JIGISEMEJIRI », atteste par la présente que l'ONG ADG (Association pour le Développement Global), organisations de la société civile nationale et consultant du Programme de Filets Sociaux Jigisemejiri pour la mise en œuvre des opérations de mesures d'accompagnement aux transferts monétaires – MA, des opérations du Paquet Nutritionnel Préventif – PNP, des activités génératrices de revenu - AGR et des travaux publics à haute intensité de mains d'œuvre - HIMO dans le Cercle de Nioro sur la période 2015 à 2018.

Il s'agit de :

- *La mise en œuvre du contrat N°00377/DGMP/DSP2015 pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et du paquet nutritionnel préventif dans le Cercle de Nioro ;*
- *La mise en œuvre du contrat N°00526/DGMP/DSP2017 pour la mise en œuvre des opérations des activités génératrices de revenu – AGR, des travaux publics à hautes intensités de mains d'œuvre – HIMO dans le Cercle de Nioro.*

L'ONG ADG a exécuté les prestations avec succès et à notre satisfaction. En conséquence, je lui délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Bamako, le 19 Juillet 2019



Programme de Filets Sociaux au Mali, Hamdallaye ACI 2000, Rue 329, Porte 120, Bamako - Mali
Téléphone : (223) 20 22 16 15 - (223) 20 22 16 17 / (223) 44 90 23 15 / (223) 44 90 23 16
Email : jigisemejiri@jigisemejiri.org

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'ASSAINISSEMENT ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

*Agence de l'Environnement et du
Développement Durable (AEDD)*



Projet de Gestion des Ressources Naturelles
et Changements Climatiques (PGRNCC)


ATTESTATION DE BONNE FIN D'EXECUTION

Je soussigné, le Directeur Général de l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AEDD), Coordinateur du Projet de Gestion des Ressources Naturelles et Changements Climatiques (PGRNCC), atteste que l'Association pour l'appui au développement global a effectué les travaux et conformément au contrat N°0556/DGMP/DSP/2016 du 23/05/2016 renouvelé par le contrat N°0212/DRMP/DB/2017 du 25/07/2017 pour le compte du PGRN CC.

En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Bamako, le 11 MARS 2019

Le Coordinateur



Boureima CAMARA
Chevalier de l'ordre National

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'ASSAINISSEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

*Agence de l'Environnement et du
Développement Durable (AEDD)*




Projet de Gestion des Ressources Naturelles
et Changements Climatiques (PGRNCC)


ATTESTATION DE BONNE FIN D'EXECUTION

Je soussigné, le Directeur Général de l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AEDD), Coordinateur du Projet de Gestion des Ressources Naturelles et Changements Climatiques (PGRNCC), atteste que l'Association pour le développement global a effectué les travaux de récupération de 26 ha de terres dégradées dans le village de HAUDIA-MAKANA RANGABE-DARA Lot n°6 conformément aux termes du marché n°1437 DRMP 2018 pour le compte du PGRN CC.

En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Bamako, le 11 MARS 2019
Le Coordinateur


Bouraima CAMARA
Chevalier de l'Ordre National



DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'ASSAINISSEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

*Agence de l'Environnement et du
Développement Durable (AEDD)*



Projet de Gestion des Ressources Naturelles
et Changements Climatiques (PGRNCC)

ATTESTATION DE BONNE FIN D'EXECUTION

Je soussigné, le Directeur Général de l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AFDD), Coordinateur du Projet de Gestion des Ressources Naturelles et Changements Climatiques (PGRNCC), atteste que l'Association pour le développement global a effectué les travaux de récupération de 57 ha de terres dégradées dans le village de GADIABA-KADIEL communales de GADIABA KADIEL Lot n°1 conformément aux termes du marché n°1431 DRMP 2018 pour le compte du PGRN CC.

En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Bamako, le 11 MARS 2019

Le Coordinateur


Bourahima CAMARA
Chargé de l'Ordre National
Agence de l'Environnement et du Développement Durable

Budget :

Budget par Catégories et Codes Économiques :

BUDGET DU PROGRAMME				
CATEGORIES HARMONISEES	MONIANT TOTAL (FCFA)	MONIANT TOTAL (US\$)	Org. Part. des N.U. ONG ADG	% du Budget
1. Frais liés aux effectifs et autres frais de personnel	88 110 000	160 346	-	17%
2. Fournitures, produits de base et matériaux	907 970	1 652	-	0,18%
3. Équipements, véhicules et mobilier, amortissement compris	25 000 000	45 496	-	5%
4. Services contractuels	338 849 846	616 651	-	66%
5. Voyages	8 700 000	15 833	-	2%
6. Contreparties des transferts et subventions	-	-	-	0,00%
7. Frais généraux de fonctionnement et autres frais directs	17 067 000	31 059	-	3%
Coûts totaux Org. Part. Des N.U	478 634 766	871 037	-	93%
8. Coûts d'appui indirects	33 504 434	60 973	-	7%
TOTAL Org. Part. Des N.U	512 139 200	932 009	-	100,00%
Code Économique / Mali (Trésor)	MONTANT TOTAL (FCFA)	MONTANT TOTAL (US\$)	Ministère / EN 1	
TOTAL Ministères / EN			0	
TOTAL GENERAL DU PROGRAMME	512 139 200	932 009		

BUDGET GLOBAL - ONG ADG (Taux de conversion 1 USD= 500 FCFA)

I. Budget activités ONG

Libellé	Unités	Quantité	Prix Unitaire	BUDGET EN F CFA		BUDGET EN DOLLARS US
				Budget demandé	Budget total	
I.1. Mise en œuvre des Activités/Produits :						
Résultat attendu 1.1 : Huit (8) villages disposent de points d'eau modernes pour l'alimentation de la population.						
Produit 1.1.1 : Promotion de points d'eau modernes pour l'accès des populations à l'eau potable.						
Activité 1.1.1.1 : Réalisation de huit (8) nouveaux forages dans 6 villages de 3 Communes de Yélimané et 2 communes de Niore du Sahel.						
Réalisation d'étude pour la situation du site d'implantation	Etude	8	500 000	4 000 000	4 000 000	8 000,00
Réalisation de forages débit 5 m ³ d'eau / heure au minimum (1 productif et 1 négatif).	Forage	8	6 000 000	48 000 000	48 000 000	96 000,00
Equipements (château métallique, cuves de 10 m ³ , panneaux solaires et accessoires)	Equipement	8	3 000 000	24 000 000	24 000 000	48 000,00
Bornes fontaines	Bornes	16	375 000	6 000 000	6 000 000	12 000,00
Sous-total Réalisation nouveaux forages				82 000 000	82 000 000	164 000,00
Activité 1.1.1.2 : Organisation de 72 sessions de sensibilisation à l'intention de 960 personnes des usagers des 8 villages des 3 communes de Yélimané et 2 communes de Niore du Sahel.						
Places assises	Place	960	100	96 000	96 000	192,00
Rafraîchissement (Boissons et Eau)	Rafraîchissement	960	500	480 000	480 000	960,00
Frais de déplacement	Déplacement	960	5 000	4 800 000	4 800 000	9 600,00
Location salle	Location	32	15 000	480 000	480 000	960,00
Sous-total Sensibilisation				5 856 000	5 856 000	11 712,00
Activité 1.1.1.3 : Mis en place un comité villageois de gestion du point						
Organisation d'assemblée Villageoise pour mettre en place les comité de gestion de point d'eau	Comité	15	25 000	375 000	375 000	750,00
Sous-total Comité de gestion				375 000	375 000	750,00
SOUS TOTAL 1 : forages + sensibilisation+Comités				88 231 000	88 231 000	176 462,00
Résultat attendu 2.1 : Les femmes et les jeunes ont accès à diverses sources de revenus stables à travers le maraîchage dans des périmètres maraîchers modernes et la conduite d'activités innovantes d'élevage dans six (8) villages.						
Produit 2.1.1 : Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables (les femmes et les jeunes).						
Activité 2.1.1.1 : Aménagement de 8 mini ferme de 6 ha dans 8 villages						
Grillage (clôture) : 48 rouleaux x 8 périmètres	Rouleau	384	27 500	10 560 000	10 560 000	21 120,00
Cornière N°50 de 6 m : 270 barres x 8 périmètres	Barre	2160	11 000	23 760 000	23 760 000	47 520,00
Grosses Cornières (IPN) : 36 cornières x 8 périmètres	Cornière	288	20 000	5 760 000	5 760 000	11 520,00
Fils de fer recuits / Fils d'attache : 12 rouleaux x 8 périmètres	Rouleau	96	3 000	288 000	288 000	576,00
Fils de fer galvanisés : 96 rouleaux x 8 périmètres	Rouleau	768	7 500	5 760 000	5 760 000	11 520,00
Crochets : 120 crochets x 8 périmètres	Crochet	960	500	480 000	480 000	960,00
Forage avec équipement solaire et bassins de stockage d'eau	Forage	8	6 000 000	48 000 000	48 000 000	96 000,00
Porte : 1 porte x 8 périmètres	Porte	8	80 000	640 000	640 000	1 280,00
Réalisation 16 étangs piscicoles	Unité	16	500 000	8 000 000	8 000 000	16 000,00
Achat 9600 alevins	alevins	9 600	300	2 880 000	2 880 000	5 760,00

Achat aliment poissons	Kg	4000	700	2 800 000	2 800 000	5 600,00
Construction de poulaillers	Unité	8	2 500 000	20 000 000	20 000 000	40 000,00
Achat de poussins	Unité	8000	200	1 600 000	1 600 000	3 200,00
Achat aliment volaille et autres accessoires (abreuvoirs, mangeoires et lampes, vaccins et vitamines)	Unité	8	1 000 000	8 000 000	8 000 000	16 000,00
Achat de plants essences économiques	Unité	8	500 000	4 000 000	4 000 000	8 000,00
SOUS TOTAL 2 Aménagement périmètres				142 528 000	142 528 000	285 056,00
Activité 2.1.1.2 Formation de 400 maraichers (240 femmes et 160 jeunes) de 8 groupements de producteurs/productrices de 8 villages de 3 communes de Yélimané et 2 communes de Niore du Sahel:						
Places assises	Place	400	100	40 000	40 000	80,00
Rafraîchissement (Boissons et Eau)	Rafraîchissement	400	500	200 000	200 000	400,00
Frais de déplacement	Déplacement	400	5 000	2 000 000	2 000 000	4 000,00
Location salle	Location	14	15 000	210 000	210 000	420,00
SOUS-TOTAL Formation				2 240 000	2 240 000	4 480,00
SOUS-TOTAL Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables (les femmes et les jeunes).				144 768 000	144 768 000	263 454,05
Activité 2.1.1.3 : Dotation en petits ruminant de 400 éleveurs (240 femmes et 160 jeunes) de 8 groupements d'éleveurs de 8 villages de 3 communes de Yélimané et 2 communes de Niore du Sahel.						
I. Embouche Collective de bovins par 35 bénéficiaires (21 jeunes et 14 femmes) par village soit au total : 280 bénéficiaires pour ce volet.						
I.1 Infrastructures						
Clôture et Hangar	Nombre	8	3 000 000	24 000 000	24 000 000	48 000,00
Magasin de stockage	Nombre	8	500 000	4 000 000	4 000 000	8 000,00
SOUS-TOTAL Infrastructures				28 000 000	28 000 000	56 000,00
I.2 Equipements						
Brouette	Nombre	32	35 000	1 120 000	1 120 000	2 240,00
Pelle	Nombre	20	2 500	50 000	50 000	100,00
Râteau	Nombre	20	2 000	40 000	40 000	80,00
Abreuvoir	Nombre	20	20 000	400 000	400 000	800,00
Mangeoire	Nombre	20	20 000	400 000	400 000	800,00
Charrette	Nombre	8	125 000	1 000 000	1 000 000	2 000,00
Anes	Nombre	16	40 000	640 000	640 000	1 280,00
SOUS-TOTAL Equipements				3 650 000	3 650 000	7 300,00
I.3 Matières premières et intrants						
Bovin	Nombre	136	150 000	20 400 000	20 400 000	40 800,00
Aliment concentrés (Tourteau)	Kg	21760	200	4 352 000	4 352 000	8 704,00
Aliments grossiers (paille)	Voyages	680	7 500	5 100 000	5 100 000	10 200,00
Sel	Kg	136	2 000	272 000	272 000	544,00
SOUS-TOTAL Matières premières et intrants				30 124 000	30 124 000	60 248,00
I.4 Prestation et Soins						
Vaccin Clostrivax	Flacon	8	3 000	24 000	24 000	48,00
Vaccin Pastobov	Flacon	8	3 000	24 000	24 000	48,00
Déparasitant interne (albendazole 2500 mg)	Nombre	272	400	108 800	108 800	217,60
Stresse vitam sachet buvable	Sachet	136	4 000	544 000	544 000	1 088,00
Déparasitant externe (ivermectin flacon de 50ml)	Flacon	8	4 000	32 000	32 000	64,00
Antibiotique (Oxitetracline) 10%	Flacon	8	1 500	12 000	12 000	24,00
Suivi technique des infrastructures.	Nombre	32	10 000	320 000	320 000	640,00
Suivi sanitaire	Nombre	24	10 000	240 000	240 000	480,00
SOUS-TOTAL Prestation et soins				1 304 800	1 304 800	2 609,60

TOTAL Embouche Bovine				63 078 800	63 078 800	126 157,60
II. Embouche Collective d'ovins par 15 bénéficiaires (7 jeunes et 8 femmes) par village soit au total : 120 bénéficiaires pour ce volet.						
II.1 Infrastructures						
Clôture et Hangar	Nombre	8	1 000 000	8 000 000	8 000 000	16 000,00
Magasin de stockage	Nombre	8	500 000	4 000 000	4 000 000	8 000,00
SOUS-TOTAL Infrastructures				12 000 000	12 000 000	24 000,00
II.2 Equipements						
Brouette	Nombre	24	35 000	840 000	840 000	1 680,00
Pelle	Nombre	40	2 500	100 000	100 000	200,00
Râteau	Nombre	40	2 000	80 000	80 000	160,00
Abreuvoir	Nombre	72	7 500	540 000	540 000	1 080,00
Mangeoire	Nombre	72	7 500	540 000	540 000	1 080,00
Charettes	Nombre	8	125 000	1 000 000	1 000 000	2 000,00
SOUS-TOTAL Equipements				3 100 000	3 100 000	6 200,00
II.3 Matières premières et intrants						
Ovins	Nombre	320	35 000	11 200 000	11 200 000	22 400,00
Aliment concentrés (Tourteau)	Kg	14 400	200	2 880 000	2 880 000	5 760,00
Aliments grossiers (paille)	Voyages	440	7500	3 300 000	3 300 000	6 600,00
Sel	Kg	400	12,5	50 000	50 000	100,00
SOUS-TOTAL Matières premières et intrants				17 430 000	17 430 000	34 860,00
II.4 Prestation et Soins						
Vaccination (pastovin)	Flacon 25 doses	2	1 500	3 000	3 000	6,00
Vaccination (ovi peste)	Flacon 50 doses	1	6 046	6 046	6 046	12,09
Traitement déparasitant (Albendazole et Trizole)	Comprimé	80	400	32 000	32 000	64,00
Apport vitamine (Lobivite)	Comprimé	40	400	16 000	16 000	32,00
Appui conseil suivi sanitaire	Nombre	6	10 000	60 000	60 000	120,00
Suivi technique des infrastructures	Nombre	3	10 000	30 000	30 000	60,00
Frais de gardiennage (1)	Mois	3	10 000	30 000	30 000	60,00
SOUS-TOTAL Prestation et soins				177 046	177 046	354,09
TOTAL Embouche ovine				32 707 046	32 707 046	65 414,09
Activité 2.1.1.4 : Formation en techniques modernes d'embouche de 400 éleveurs (240 femmes et 160 jeunes) de 8 groupements d'éleveurs de 8 villages de 3 communes de Yélimané et 2 communes de Nioro du Sahel.						
Places assises	Place	400	100	40 000	40 000	80,00
Rafraîchissement (Boissons et Eau)	Rafraîchissement	400	500	200 000	200 000	400,00
Frais de déplacement	Déplacement	400	5 000	2 000 000	2 000 000	4 000,00
Location salle	Location	14	15 000	210 000	210 000	420,00
SOUS-TOTAL Formation				2 450 000	2 450 000	4 900,00
SOUS-TOTAL Dotation en petits ruminant de 400 éleveurs				98 235 846	98 235 846	196 471,69
Suivi-Evaluation :						
Suivi mensuel ADG 2 personnels et 1 chauffeur	Mission	36	200 000	7 200 000	7 200 000	14 400,00
Evaluation finale (ADG/UNESCO)	Evaluation	1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000,00
Sous-total Suivi - évaluation				8 700 000	13 800 000	17 400,00
Capitalisation des acquis						
Organisation d'un atelier de capitalisation des acquis	Atelier	1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000,00
Sous-total Capitalisation des acquis				2 000 000	2 000 000	4 000,00
TOTAL ACTIVITES				341 934 846	341 934 846	683 869,69
II. Fonctionnement						

U

II.1. Charges du personnel :						
Salaire Chargé Projet ADG (1 pers x 36 mois x 350 000 FCFA 100% de son temps)	Mensuel	36	350 000	12 600 000	12 600 000	25 200,00
Salaire Chargé de projet UNESCO (1 pers x 36 mois x 350 000 FCFA 100% de son temps)	Mensuel	36	350 000	12 600 000	12 600 000	25 200,00
Salaire animateurs (6 pers x 36 mois x 235 000 FCFA) 100% de son temps	Mensuel	216	235 000	50 760 000	50 760 000	101 520,00
Salaire chargé de Communication (1 pers x 36 mois x 200 000 FCFA) 100% de son temps	Mensuel	36	200 000	7 200 000	7 200 000	14 400,00
Salaire Comptable (1 pers x 36 mois x 150 000 FCFA) 25% de son temps	Mensuel	36	37 500	1 350 000	1 350 000	2 700,00
Salaire Chauffeur (1 pers x 36 mois x 100 000 FCFA)	Mensuel	36	100 000	3 600 000	3 600 000	7 200,00
SOUS-TOTAL 1 : Salaire personnel				88 110 000	88 110 000	176 220,00
II.2. Moyen logistique :						
Achat véhicule 4x4 et accessoires	Véhicule	1	25 000 000	25 000 000	25 000 000	50 000,00
Vignette	Vignette	3	35 000	105 000	105 000	210,00
Assurance	Assurance	3	60 000	180 000	180 000	360,00
Carburant (Véhicule)	Carburant	36	172 000	6 192 000	6 192 000	12 384,00
Achat moto	Moto	6	715 000	4 290 000	4 290 000	8 580,00
Vignette	Vignette	15	6 000	90 000	90 000	180,00
Assurance motos	Assurance	15	40 000	600 000	600 000	1 200,00
Achat carburant motos	Mois	180	25 000	4 500 000	4 500 000	9 000,00
SOUS-TOTAL 2 : Moyen logistique				40 957 000	42 400 000	81 914,00
II.3. Charge Bureau :						
Photocopieuse	Photocopieuse	1	325 000	325 000	325 000	650,00
Ordinateur Portable	Portable	4	250 000	1 000 000	1 000 000	2000,00
Location siège	Mois	36	100 000	3 600 000	3 600 000	7200,00
Communication (téléphone)	Mois	36	25 000	900 000	900 000	1800,00
Eau et électricité	Mois	36	25 000	900 000	900 000	1800,00
Matériels et fournitures de Bureau	Mois	36	25 220	907 920	907 920	1815,84
SOUS-TOTAL 3 : charge Bureau				7 632 920	7 632 920	15 265,84
TOTAL fonctionnement				136 699 920	136 699 920	248 771,46
TOTAL ACTIVITES+FONCTIONNEMENT				478 634 766	478 634 766	957 269,53
Frais de gestion organisation des nations unies (7%)				33 504 434	33 504 434	67 008,87
TOTAL GENERAL DEMANDE AU PARTENAIRE				512 139 200	512 139 200	1 024 278,40

